

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@gmail.com>
Sent: Thu, 25 Apr 2024 07:51:51 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@utrecht.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e>; "5.1.2.e" <5.1.2.e>
Subject: Fwd: Herstelverklaring Voorstraat85 bis Utrecht
Attachments: IMG_0203.jpg

Subject: Herstelverklaring Voorstraat85 bis Utrecht

Geachte belanghebbenden,

Hierbij het herstelrapport naar aanleiding van de scope 10 keuring op 18-4 2024 ter garantie van de brandveiligheid van de elektrische installatie.

BULAGE 1 - HERSTELVERKLARING

Indien er punten ter herstel waren en deze inmiddels zijn hersteld dan kan deze herstelverklaring door de installateur worden ingevuld en ondertekend. Indien uw verzekeraar of tussenpersoon dit verzoekt kunt u de getekende herstelverklaring samen met een kopie van het inspectierapport opsturen.

Tevens dient deze herstelverklaring en bewijsmateriaal van het herstel opgestuurd te worden naar ons als inspectiebedrijf. Het bewijsmateriaal kan bestaan uit: foto's, meetwaarden, documentatie etc.
De beoordeling van het bewijsmateriaal of een herinspectie van de constateringen kan tot uiterlijk 1 jaar na inspectie.

Ondergetekende (de installateur) verklaart dat:

Alle constateringen geclassificeerd, als 1, 2 en 3 gebreken, zoals vastgelegd in het inspectierapport, voldoende zijn hersteld conform de geldende NEN 1010 installatievoorschriften.

Classificatie 4 (n.v.t.) : vereist aandacht

Installatie:

Rapportnummer OF-04046
Inspectiedatum 18-4-2024
(Bedrijfs)naam Voorstraat 85 bis Utrecht
Adres Voorstraat 85 bis
Postcode 3512 AL Plaats Utrecht
Telefoonnr.
Mobiel

Installateur

(Bedrijfs)naam R. EPSkamp
Adres Het Vooruitzicht 41
Postcode 3823 HV Plaats Amersfoort
Telefoonnr. 06 26 62 28 29
Naam Rob Epskamp Functie Dik / Elektricien

Wo 24/4 2024

Datum

Handtekening



Punt 1: Nieuwe lamp geplaatst.



Punt 2 : losse schakelaar verwijderd



punt 3 nieuwe aardlek geïnstalleerd



punt 4 een en ander geïsoleerd.



punt 5 Hersteld



punt 6 nieuwe hoofdschakelaar geïnstalleerd



Kamer 14 stopcontact en stekker geplaatst




Kamer 5 : aardedraad vanuit kamer 4 doorgetrokken naar kamer 5 plus trekontlasting.



punt 10 : lasdozen nagekeken en waar nodig dicht gemaakt.



Punt 11 Plafond teruggeplaatst.

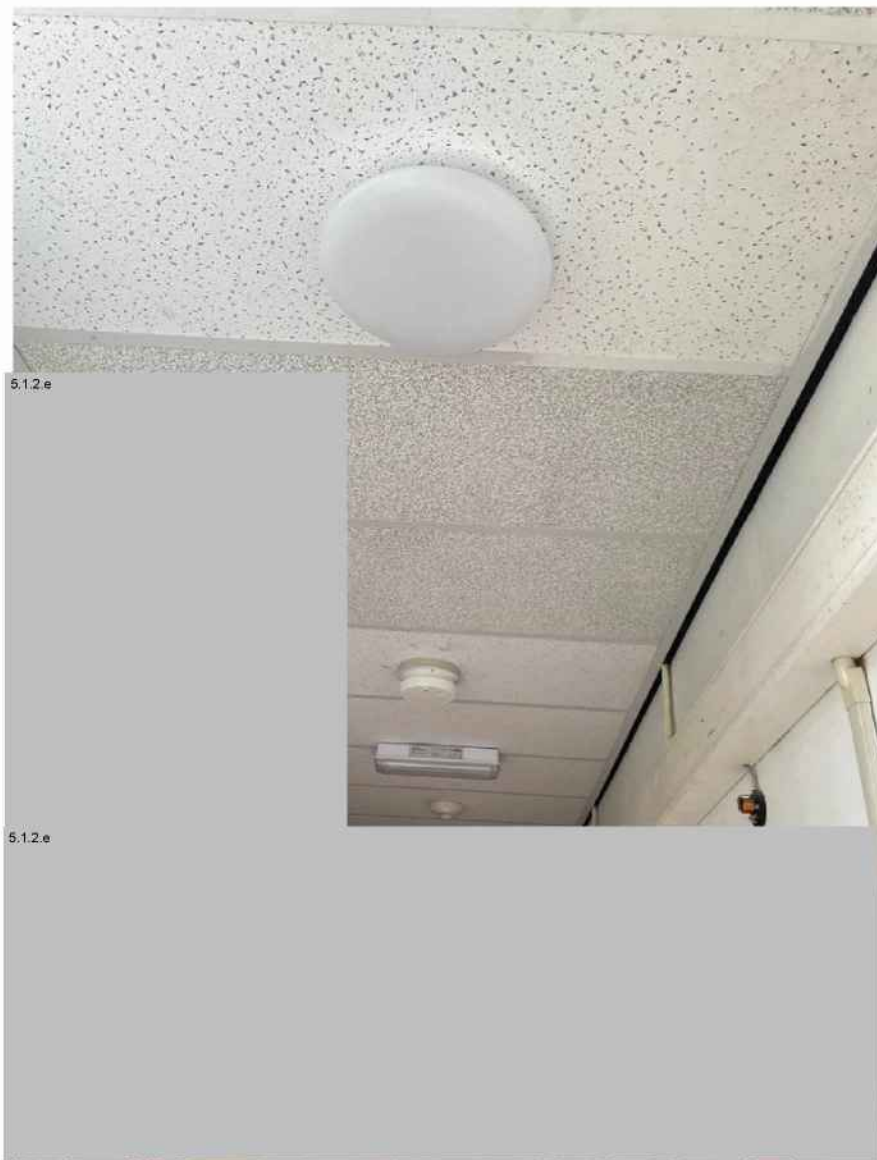

punt 12 noodverlichting aangebracht .



punt 13 losse lamp vastgezet op plaatmateriaal.



5.1.2 e



Punt 14 alle armaturen zijn gecontroleerd en vernieuwd

--
Hartelijke groet,

5.1.2 e

5.1.2 e
