

Stadswerken
IBU Stadsingenieurs
Postadres Postbus 5.1.2E 5.1.2E Utrecht
Telefoon 5.1.2E Fax 5.1.2E
www.utrecht.nl

DENYS BV
T.a.v. de heer ir. 5.1.2E
Industrieweg 124
TE 9032 WONDELGEM
BELGIE

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk inschrijfstaat
Uw brief van 23-07-2010

Datum 7 oktober 2010
Ons kenmerk SW10.082275-bfh
Onderwerp Opdrachtverstrekking t.b.v. bestek
53 SW 10.
Projectnummer 402.20221.030.090.101
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw prijsaanbieding uit uw inschrijfstaat, definitief d.d. 23-07-2010, de werkzaamheden op voor bestek 53 SW 10 met betrekking tot het project 'Restauratie kluisuren - rak 6 en 7' te Utrecht.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 762.120,-- exclusief 19% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Uw contactpersoon is de heer 5.1.2E (5.1.2E) telefonisch bereikbaar op 5.1.2E en de heer 5.1.2E (5.1.2E), telefonisch bereikbaar op 5.1.2E beide werkzaam bij IBU Stadsingenieurs. **De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie moet binnen 7 werkdagen na datum van de opdracht, met begeleidend schrijven, door ons zijn ontvangen.**

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E Stadswerken, IBU Stadsingenieurs
- projectnummer: 402.20221.030.090.101
- opdrachtnummer: 4500121492
- kenmerk van deze brief: SW10.082275-bfh

En deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiële Dienstverlening
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Wij verzoeken u ons de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

Ir. D.J. Bekker,
Hoofd IBU Stadsingenieurs



Vergaderverslag

Bijeenkomst	Verificatieoverleg project Kluismuren	Verslag door	5.1,2E
Projectnummer	402.20221	Datum verslag	11 oktober 2010
Datum	7 oktober 2010	Verzonden aan	Aanwezigen
Tijdstip	14.45–16.15 uur		
Plaats	Ravellaan 96, Utrecht		

Deelnemers

5.1,2E	5.1,2E	5.1,2E	@denys.com
5.1,2E	5.1,2E	@denys.com	
5.1,2E	5.1,2E	@denys.com	
5.1,2E	5.1,2E	@denys.com	
5.1,2E	5.1,2E	@denys.com	
5.1,2E	5.1,2E	@utrecht.nl	
5.1,2E	5.1,2E	@utrecht.nl	
5.1,2E	5.1,2E	@utrecht.nl	
5.1,2E	5.1,2E	@utrecht.nl	

Verslag

1. Opening

5.1,2E opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Dit verificatiegesprek is bedoeld om na te gaan of de inschrijver het bestek juist geïnterpreteerd heeft, verder zal ingegaan worden op punten die opheldering behoeven.

2. Planning

- 27 mei 2011 project gereed. Denys geeft aan deze datum als haalbaar te beschouwen. Mocht zich een vergelijkbaar strenge winter voordoen als in 2010, voorziet Denys mogelijk problemen. De gemeente Utrecht vraagt Denys van tevoren de risico's, die een dergelijke winter met zich meebrengt, in kaart te brengen.
 - Er mag pas na 1 januari 2011 met het bovengrondse straatwerk gestart worden, dit houdt verband met de feestdagen en de daarmee samenhangende drukte in de winkels. Deze startdatum geldt ook voor het boorwerk, met de andere werkzaamheden kan vóór deze datum worden gestart.
 - Denys vraagt naar de startdatum: de UAV-regeling is van toepassing; dat houdt in dat 5 werkdagen na de opdracht gestart mag worden met het werk.
- De gemeente heeft begin november als de start uitvoering in gedachten.

3. Omgeving

- Voor de binnenstad geldt een milieuzone. Denys geeft aan zich hiervan bewust te zijn. Denys geeft aan dat ze met nieuw materiaal werken.
- Er geldt op de grachten een aslastbeperking van 2 ton, op de overstekende bruggen is deze 8 ton. Het gaat hier om een bijzonder gevoelige omgeving. De Stadhuisbrug is volgens Denys een geschikt werkterrein, dat voldoende ruimte biedt voor de opslag van materialen en de keet. Er zijn op de brug twee in te richten werkterreinen, waarvan de tussenruimte open moet blijven, er moet verkeersbeweging kunnen plaatsvinden. Het leggen van kabels van het ene naar het andere werkterrein is toegestaan mits er een constructie wordt toegepast waardoor het verkeer vrij gang heeft. De gemeente vraagt om een voorstel van de in te richten terreinen en de constructie daartussen.
- Aanrijdroutes: een kelderloze route is de route strak langs het stadhuis aan de Vismarktzijde. De Minrebroederstraat en het Oudkerkhof zijn grotendeels niet onderkelderd. Dat is een goede locatie om de kraan neer te zetten. Dit zijn ook zaken die in de planning onder het kopje *Projecttransport* opgenomen dienen te worden.
- De gemeente zal streng controleren op de oplevering van het werkterrein. Denys zal samen met 5.1,2E een vooropname doen om discussies aan het eind te voorkomen.
- Beunbakken gevuld met grond moeten op dezelfde plek blijven waar de grond is uitgenomen. Het gaat om een tijdelijke uitname van grond die niet gekeurd is. Het varen met de grond is niet

toegestaan. Er bestaan beunbakken van 60 kuub. Mogelijke verhuurbedrijven van dergelijke beunbakken: Van Oostrum BV uit Westbroek of Van Hees uit Utrecht.

- Bij Rak 6 dient één kant aan de zijde van de Bezembrug vrijgehouden te worden om voldoende ruimte te laten voor het keren van de rondvaartboten.
- De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de bestrating. Het gaat om dure stenen, de gemeente adviseert zodoende om deze veilig op te bergen, wellicht in een beunbak.
- Iedereen in de omgeving is geïnformeerd. De keldereigenaren zijn verplicht ruimte vrij te maken. In de planning dient opgenomen te worden wanneer de bezoeken/werkzaamheden in de kelders zullen plaatsvinden, dan kunnen omwonenden daar rekening mee houden.

4. Omgevingshinder

- De randvoorwaarden betreffende boren en bouwverkeer zijn bij de aannemer bekend. Er dient een geluidsplan opgesteld te worden, voor trillingen geldt dit niet, maar daar dient in de uitvoering wel rekening mee gehouden te worden. Denys merkt op dat er pittige eisen m.b.t. het geluid worden gesteld. Er geldt een gemiddelde van 65 decibel. Het is vooral van belang, dat de winkels in de buurt zo weinig mogelijk last ondervinden. De gemeente raadt aan, niet al te vroeg aan de slag te gaan i.v.m. geluidsoverlast, dat is voor het draagvlak ook beter, als de omgeving merkt dat er rekening met hen gehouden wordt, zullen zij het werk positiever benaderen. Veel protest vanuit de omgeving kan het werk vertragen.
- Denys geeft aan, dat bij de boringen geen trillingen veroorzaakt worden. In een uitzonderlijke situatie zal ander materieel toegepast worden, dat zal dan van tevoren met de gemeente worden afgestemd.
- De bereikbaarheid van de winkels in de omgeving moet gegarandeerd zijn.
- Als doorvaardbare ruimte dient een breedte van 6 meter aangehouden te worden. Mocht dit op een bepaald moment niet lukken, dan moet dit vooraf met de havenmeester afgestemd worden. (Havenmeester 5.1.2E 5.1.2E)
- De gemeente wijst op het parkeerbeheer en raadt aan op tijd ontheffingen aan te vragen. Binnen het werkterein mag er niet automatisch gratis geparkeerd worden.

5. Kabels en leidingen

Er liggen kabel en leidingen op de kelderplafonds, dit zijn er niet veel. De aannemer is hiervoor coördinator en is zich bewust van de plicht klicmeldingen te moeten aanvragen.

6. Techniek

- Stenen die uit het water vrijkomen, of die op de bodem gevonden worden, moeten hergebruikt worden, het gaat hier veelal om stenen uit de 14e of 15e eeuw.
- Een aantal kelders is in gebruik, er moeten voorzieningen getroffen worden tegen opspatting.
- Er mag niets op het riool gespoeld worden. Denys zal het slib wegzuigen met een vacuümwagen. Als ruim van tevoren in de planning duidelijk wordt opgenomen wanneer er ruimte door de vacuümwagen geblokkeerd zal worden, dan kan de gemeente hierop inspelen en dit afstemmen met Bureau Bereikbaarheid, dat is van groot belang in het geval van calamiteiten.

7. VISI

VISI is het communicatieprogramma dat de gemeente gebruikt om zaken vast te leggen. Denys werkt niet met dit programma, maar zal een licentie aanschaffen.

De gemeente verzorgt een VISI-cursus, zodra de opdracht is verstrekt volgt een uitnodiging voor 1 a 2 personen.

8. Social return

De gemeente heeft een regeling ingesteld, die werkzoekenden de kans biedt te re-integreren. De aannemer is verplicht contact op te nemen met het Matchbureau om te kijken of een werkzoekende een baan of een leerwerkstage aangeboden kan worden. In de praktijk lukt dit niet altijd, in dat geval dient een bewijs van contact met het Matchbureau aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.

9. Identificatieplicht

Het is de plicht van de aannemer om te zorgen, dat iedereen op het werk voldoet aan de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Dit geldt ook voor onderaannemers. Denys dient te zorgen dat deze gegevens op verzoek direct toonbaar zijn.

10. Overige

- Het verzoek van de gemeente is, dat de contactpersonen bij Denys Nederlandse telefoons gebruiken. Denys zal t.z.t. de Nederlandse telefoonnummers doorgeven.
- Denys kan de gevraagde natuursteen zonder problemen leveren, deze steen hebben ze op voorraad.
- Een blow-out blijft een risico, er is hier in het bestek wel een stelpost over opgenomen.
- 's Morgens tussen 7-9 en 's avonds tussen 17-18 uur worden de sluizen opengezet voor vers water waardoor er stroming ontstaat, de stroming is niet zo sterk dat die veel invloed op het werk zal hebben.
- De Nederlandse tak van Denys is in het bezit van een ERB certificaat.
- Denys heeft geen besteksadministratie. De gemeente werkt met de besteksadministratie KPD of Bakker en Spees. Denys moet de besteksadministratie nog regelen..

Akkoord Denys:

Akkoord gemeente Utrecht:

5.1.2E

5.1.2E

Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen
Ben van Hees
Heycopstraat 4
3521 EN UTRECHT

5.1.2E	Behandeld door	5.1.2E	Datum	8 november 2011
	Doorkiesnummer	5.1.2E @utrecht.nl	Ons kenmerk	SW11.100965.va
	E-mail	5.1.2E	Onderwerp	Opdracht reconstructie lage walmuren Rak 15 westzijde
	Bijlage(n)		Projectnummer	402.10390.020.090.001
	Uw kenmerk	Bestek 40 SW 11	Verzonden	14 NOV. 2011
	Uw brief van	Inschrijvingsbiljet 6 september 2011		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer Van Hees,

Hierbij dragen wij u, conform uw prijsaanbieding behorend bij inschrijvingsbiljet van 6 september 2011 van het bestek 40 SW 11, de werkzaamheden op voor project 'reconstructie lage walmuren Rak 15 westzijde' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van de gemeente Utrecht 2003 van toepassing (zie: [www.utrecht.nl/Economie en bedrijf/Aanbesteden/Concerninkoop/De gemeente als klant/Algemene Voorwaarden](http://www.utrecht.nl/Economie%20en%20bedrijf/Aanbesteden/Concerninkoop/De%20gemeente%20als%20klant/Algemene%20Voorwaarden)).

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 587.000,00 exclusief 19% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon zijn aangewezen 5.1.2E, 5.1.2E en/of 5.1.2E 5.1.2E, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E en/of 5.1.2E 5.1.2E

De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie moet binnen 7 werkdagen na datum van de opdracht, met begeleidend schrijven, door ons zijn ontvangen.

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E Stadswerken, IBU Stadsingenieurs
- projectnummer: 402.10390.020.090.001
- opdrachtnummer: 57.0000.4191
- kenmerk van deze brief: SW11.100965.va

En deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiële Dienstverlening
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Wij verzoeken u ons de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

G.C.F. de Wit,
Directeur Stadswerken

B.V. Aannemersbedrijf B. van Hees en zonen
De heer B.G. van Hees
Heycopstraat 4
3521 EN UTRECHT


Behandeld door Mevrouw 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail concerninkoop@utrecht.nl
Bijlage(n) Proces verbaal
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 6 september 2011
Ons kenmerk 11.078209
Onderwerp Aanbesteding Reconstructie lage
walmuur rak 15, 40 SW 11
Verzonden 6 september 2011
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E,

Hierbij bericht ik u dat uw onderneming in aanmerking komt voor gunning van de opdracht volgend uit de aanbesteding 'Reconstructie lage walmuur rak 15', kenmerk 40 SW 11 van de gemeente Utrecht.

Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van het gunningscriterium prijs. Gebleken is dat uw onderneming de inschrijving met de laagste prijs heeft gedaan.

De gemeente Utrecht is derhalve voornemens deze opdracht aan uw onderneming te gunnen, onder voorwaarde dat de verificatiebespreking voor beide partijen een goed resultaat oplevert en de afgewezen inschrijvers niet in rechte tegen dit voorgenomen besluit opkomen. De afgewezen inschrijvers zijn hiertoe tot en met 21 september 2011 in de gelegenheid gesteld.

De opdrachtgever zal binnenkort met u contact opnemen om verdere afspraken te maken.

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen 5.1.2E van Concerninkoop. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 030 – 5.1.2E

Met vriendelijke groet,

6. 5.1.2E
L. Hoogstraten,
Waarnemend Hoofd Concerninkoop



Gemeente Utrecht

PROCES-VERBAAL VAN AANBESTEDING
(openbare aanbesteding)

Op dinsdag 16 september 2011 om 11.00 uur, te Utrecht is door mij
.....
overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de opdracht van

Reconstructie lage walmuur rak 15, 40 SW 11

Bij de gehouden openbare aanbesteding zijn ingekomen 3 inschrijvingen, waarvan de onderstaande staat is opgemaakt.

Opgemaakt te Utrecht, 16 september 2011

Handtekening: (voorzitter aanbestedingscommissie)

Opgesteld door: Paraaf:

Lid
aanbestedingscommissie: Paraaf:

Volg nr.	Inschrijver (naam + adresgegevens)	Inschrijfsommen Excl. BTW	Bijzonderheden
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Par
.....



Kantoor: Heycopstraat 4
3521 EN Utrecht
Tel.: 030 - 2937946
Fax: 030 - 2946445

Bankrelatie: Deutsche Bank Nederland
Rek. nr.: 5.1.1C

Gemeente Utrecht

T.a.v. ing. 5.1.2E

Postbus 8375

3503 RJ **UTRECHT**

184

5.1.2E

Betreft: Lage walmuren Rak 15 westzijde 40SW11 verificatie

Utrecht, 2 november '11

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het schrijven met kenmerk SW11.085876-mb van 26 oktober 2011; welke wij in goede orde ontvingen op vrijdag 29 oktober 2011. Tevens ontvingen wij hedenmorgen het schrijven van 27 oktober 2011 met kenmerk SW11.086030-mb.

Voor het bestek en alle stukken daartoe behorende lezen wij de 40SW11 en dat is prima zo. De heer 5.1.2E en Van Hees sr. deelde in de verificatie bespreking mede dat in deze kwetsbare omgeving met klein materieel moet worden gewerkt zoals de genoemde Fuchs 112M, de silent piler UP GP-F 150 en de kleine pontons. Al het andere materiaal dient daaraan ondergeschikt of aangepast te worden gemaakt. Dit werd ook beaamd. Ook werd medegedeeld dat hiervoor door Van Hees reeds berekeningen zijn gemaakt. Bij de aanvang van uitvoeringsdatum van 1 november 2011 zag de heer Van Hees sr. geen probleem met de gestelde opleveringsdatum. In het kort is bovenstaande in de tweede verificatie bespreking ook aangehaald. Met bovenstaande completeren wij de verslagen. In essentie wil Van Hees duidelijk maken dat dit het enige en juiste kleine materieel is, met alles wat daaraan ondergeschikt is voor een goede realisatie van het project.

Inzake de besteksposten berichten wij dat in het kader van onduidelijkheid op 2 september 2011 na ontvangst van de inlichtingen met concerninkoop hebben gebeld. Daar op verzoek van inkoop per mail op 2 september 2011 onze vragen hebben gesteld. Van deze mail is een bevestiging ontvangen. Daar echter geen reactie op ontvangen zijn de posten 813010 en 814010; de posten waar geen bedrag voor staat beoogd deze gratis uit te voeren. Weliswaar zijn er bepaalde kosten maar besloten uit commerciële redenen deze voor eigen rekening te nemen omdat er te weinig info is om deze af te prijzen. Door eenieder dient voor 813010 én 814010 te worden gelezen:

Eenheid:EUR, Hoeveelheid resultaatsverplichting:1 Niet verrekenbaar,Prijs per eenheid: 0,00

Stelpost 950050 wordt in bestek en nota niet genoemd. Wij meenden daarom dat de aanwezigheid van de stelpost in de inschrijfstaat een abuis betrof en hebben deze om die reden niet in onze staat opgenomen. In de verificatiebespreking heeft U aangegeven dat de stelpost betrekking zou moeten hebben op aankoop straatwerk. Van Hees verklaart zich hierbij bereid om eventuele aankopen, die U ten laste van deze stelpost wenst te leggen, ook als een aankoop op stelpost te behandelen en te factureren.

Wij willen U voorstellen om de inschrijfstaat op dit punt niet aan te passen. Dit geeft U als opdrachtgever het voordeel dat Van Hees een eventuele onderschrijving van de stelpost niet als minderwerk kan opnemen in het saldo van meer- en minderwerk, als bedoeld in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 1989. Het alsnog opvoeren van het bedrag van de stelpost in de staart achten wij minder geschikt omdat het aanpassen van de inschrijfstaat volgens paragraaf 01.01.04 van de standaard RAW-Bepalingen 2005 alleen is toegestaan bij kennelijk onredelijke verrekenprijzen. Stelposten en niet-verrekenbare posten zijn niet als verrekenprijs aan te merken.

Onbedoeld is het een langer schrijven geworden dan dat de bedoeling was. Van onze kant willen wij duidelijkheid en in goede samenwerking dit project gaan realiseren. Middels deze brief en de staat denken wij deze zo duidelijk mogelijk te hebben weergegeven als onderdeel van de verificatie. Mocht het alsnog anders dienen te geschieden dan gaarne op korte termijn afstemming.

Wij verzoeken U vriendelijk een overleg met ons in te plannen om de werkzaamheden voorspoedig en voortvarend ten uitvoer te laten komen. Met name de werkplannen en materialen dienen op korte termijn te worden overeengekomen om de start niet in de weg te staan.

Erop vertrouwend U hiermede voldoende te hebben ingelicht, tekenen wij

Met vriendelijke groet,

5.1.2E

B.G. van Hees

Bijlagen:

- 1 email van Van Hees dd 2 november 2011
- 2 email van gemeente Utrecht dd 2 november 2011
- 3 vergaderverslag 1 verificatie 30 september 2011*
- 4 vergaderverslag 2 verificatie 21 oktober 2011*
- 5 brief 26 oktober 2011 gemeente Utrecht
- 6 brief 27 oktober 2011 gemeente Utrecht
- 7 inschrijfstaat 2 november 2011

Van: 5.1.2E
Verzonden: vrijdag 2 september 2011 12:27
Aan: ibubtc@utrecht.nl
Onderwerp: 40 SW 11 Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde te Utrecht; inschrijfstaat
Urgentie: Hoog

Geachte heer / mevrouw,

Zoals telefonisch besproken met Concerninkoop stuur ik u hierbij een email met enkele vragen / opmerkingen over de bij de nota van inlichtingen verstrekte inschrijfstaat.

- Post 212110 Toepassen sleufbekisting: eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting niet ingevuld
- Post 812050 Opstellen bouwveiligheidsplan: deze post is toegevoegd in de inschrijfstaat en wordt niet bestek of nota genoemd, daarentegen heeft post 812060 dezelfde omschrijving en is wel toegevoegd in de nota
- Post 813010 Opstellen monitoringsplan geluidhinder: eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting niet ingevuld
- Post 814010 Opstellen bemalingsplan bouwkuip: eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting niet ingevuld
- Post 950050 Stelpost: deze post wordt niet in bestek of nota genoemd

Graag vernemen we zo spoedig mogelijk hoe hiermee om te gaan.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2E

5.1.2E

5.1.2E

BV Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen UTRECHT

Heycopstraat 4, 3521 EN, Utrecht

T +31(0)30 2937946 | F +31(0)30 2946445

E wtoornstra@vanheesgroep.nl | I www.vanheesutrecht.nl

B. van HEES en Zonen Utrecht is een werkmaatschappij van de VAN HEES GROEP.

De inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kan informatie bevatten die voorbehouden is aan de beoogde ontvanger en/of vertrouwelijk is. Deze e-mail en de bijlagen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger van deze e-mail. Als u deze e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te waarschuwen en deze e-mail te verwijderen.

The content of this e-mail and any attachments may include information which is intended solely for the intended recipient and/or which is privileged or confidential in nature. This e-mail and its attachments may not be disclosed to, used by, or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete this e-mail.

Van: IBU-BTC (tbv Nota van Inlichtingen) [ibubtc@utrecht.nl]
Verzonden: vrijdag 2 september 2011 12:27
Aan: 5.1.2E
Onderwerp: Ontvangstbevestiging IBU-Stadsingenieurs [NIET BEANTWOORDEN]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij dat uw e-mail in goede orde is ontvangen.

Uw vragen worden in behandeling genomen volgens de in deze aanbesteding geldende procedure.

Dit bericht wordt automatisch gegenereerd en kan derhalve niet beantwoord worden.

Met vriendelijke groeten,

Gemeente Utrecht
Stadswerken
IBU-Stadsingenieurs

Proclaimer

Vergaderverslag

Bijeenkomst	Verificatieoverleg Firma Van Hees	Verslag door	5.1.2E
Projectnummer	402.10390	Datum verslag	3 oktober 2011
Datum	30 september 2011	Nummer verslag	1
Tijdstip	10.00 – 11.30	Verzonden aan	aanwezigen
Plaats	Ravellaan 96, gebouw 1 kamer 403	Vervolg	–

Deelnemers

5.1.2E (PM), 5.1.2E (PM-toezicht), 5.1.2E (PM – toezicht) en 5.1.2E (BTC): IBU
5.1.2E 5.1.2E : Firma Van Hees

Afwezig

Verslag

1. Opening

5.1.2E opent de vergadering.

Voorstel ronde:

Firma van Hees:

Ben van Hees: directeur

5.1.2E

Gemeente Utrecht/IBU:

5.1.2E

2. Inschrijvingseisen

Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, zijn de onderstaande eisen en gegevens opgevraagd om technische en organisatorische bekwaamheden aan te tonen.

0.04 Inschrijving

4 d. Elk twee afgeronde en opgeleverde projecten m.b.t. :

– Aanbrengen van damwanden d.m.v. statisch drukken in een binnenstedelijke omgeving waarbij gebruik is gemaakt van klein materieel. Geconstateerd wordt dat 1 opgegeven referentie (Damwand Doorslag Nieuwegein) voldoet aan de gestelde eis. Er is geen tweede referentie opgegeven. Wel is een verklaring van Gebr. De Koning toegevoegd. De gemeente ging ervan uit dat bedoeld werd dat Gebr. De Koning de onderaannemer van Fa Van Hees zou worden. Desgevraagd geeft Ben van Hees aan dat de fa Van Hees zelf een drukmachine heeft aangeschaft en deze wil inzetten waarbij de begeleiding vanuit de fa Van Hees door de heer 5.1.2E als deskundige op het gebied van statisch drukken verzorgd zal worden en dat Gebr. De Koning geen onderaannemer zal zijn. Wel geeft Ben van Hees aan dat hij het liefst met zijn eigen machinist op de drukinstallatie zit maar als de opdrachtgever dat wil de machinist van Gebr. De Koning op de drukinstallatie van firma van Hees plaats kan nemen. 5.1.2E 5.1.2E 5.1.2E legt uit dat de opdrachtgever niet vraagt of een machinist van Gebr. De Koning op een drukinstallatie plaatsneemt, maar dat gevraagd wordt om 2 uitgevoerde werken met statisch drukken door fa Van Hees of een door fa Van Hees in te schakelen onderaannemer. Geconstateerd wordt dat er m.b.t. statisch drukken 1 referentie overhandigd is en verdere geen referenties bekend zijn bij de opdrachtgever

Na het verificatieoverleg is contact geweest met de betreffende projectleider van de gemeente Nieuwegein over het aanbrengen van de damwand bij de Doorslag. De damwand blijkt aangebracht te

zijn middels hoog frequent trillen. Met deze toelichting van de gemeente Nieuwegein voldoet de opgegeven referentie niet aan de eis van statisch drukken.

– Restaureren/reconstrueren van binnenstedelijke kademuren met monumenten status waarin metselwerk is toegepast. Hier zijn twee referenties (Vernieuwen brug in de Wierselaan in Nieuwegein met o.a. hoogfrequent trillen en herstel aan de lage walmuren in Utrecht) overhandigd die voldoen aan de eisen.

AANVULLING NAAR AANLEIDING VAN TOELICHTING DOOR FA. VAN HEES:

Naar aanleiding van vragen over de opgegeven referenties is veelvuldig contact geweest met fa. Van Hees. De gemeente Nieuwegein heeft naderhand verklaard dat een deel van de damwand bij De Doorslag toch statisch gedrukt is en daarmee voldoet deze referentie.

Over de referentie rond fa. De Koning, de heer 5.1.2E wil de gemeente Utrecht een nadere verduidelijking hebben hoe het proces en de verantwoordelijkheden rond het statisch drukken georganiseerd wordt. Hiertoe komt er een aanvullend verificatie overleg over dit onderwerp.

- Kopie van VCA certificaat. Kopie voldoet.
- Verklaring omzet. Verklaring voldoet.
- Protocol Social Return. Overhandigd is een ondertekend exemplaar.

3. Omgeving

Het Utrechtse binnenstedelijk gebied is een gevoelige omgeving daarom wil de gemeente overtuigd zijn van de kundigheid van de aannemer. Bomen moeten ontzien worden en het in te zetten materieel moet geschikt zijn voor het gebied. Van Hees geeft aan ervaring te hebben in Amersfoort, met het werken met een kleine hijskraan, en ze hebben voldoende kleine pontons ter beschikking en maken ruimte voor scheepvaart.

Van Hees is op de hoogte van de geluidseisen die worden gesteld in het bestek en geeft aan dat het in te zetten materieel hieraan voldoet. De gemeente vraagt ook aandacht voor de geluidseisen van de bemalingspompen, deze staan dag en nacht aan. Ook eventuele stroomaggregaten voor de bemalingspompen moeten voldoen aan de geluidseisen.

Qua logistiek, voert Van Hees alles over het water aan, dus materieel zal niet over de weg vervoerd worden. Van Hees heeft een eigen overlaadplaats.

Van Hees vindt het ook belangrijk om met bewoners te communiceren en is graag aanwezig op een informatieavond om de buurt mede te informeren.

4. Planning

De in het bestek bepaalde uitvoeringsduur is helemaal akkoord voor Van Hees en ze kunnen wat hen betreft snel beginnen. Van Hees geeft aan dat de uitvoeringsduur voldoende is voor de werkzaamheden en geeft aan dat de opleverdatum van 29 april 2012 reëel is..

De WABO vergunning wordt, als er geen bezwaar ingediend wordt, eind oktober verleend en dan zou er begin november begonnen kunnen worden.

5. Techniek, werkplannen

De technische en monitoringseisen zijn duidelijk voor Van Hees. De gemeente laat een opname van de panden maken foto's van gebouwen om stand en de staat van de panden voor en na de werkzaamheden vast te leggen.

De machines zijn in bezit van Van Hees en de drukmachinist komt, volgens Van Hees op verzoek van de opdrachtgever, van Firma de Koning.

Van Hees legt uit hoe ze het aanbrengen van startplanken vanuit het water uitvoeren.

De machine (UP GPF150) wordt opgesteld op een startframe. Hierin ziet Van Hees geen risico.

Prefab betonschorten worden volgens Van Hees op hun eigen werf geprefabriceerd.

5.1.2E geeft aan dat een aantal werkplannen gevraagd worden die voor de start van de werkzaamheden gereed en geaccordeerd moeten zijn conform het bestek. Van Hees is hiervan op de hoogte.

Risico's in uitvoering

In principe ziet Van Hees geen technische risico's behalve dat ze geen bronbemaling adviseren.

Hoe om te gaan met de werkzaamheden met damwanden in de nabijheid van bomen is 5.1.2E
het bestek. De damwand dient in gedeeltes ingebracht te worden i.v.m. takken en de kroon. Van Hees vindt dat het gefaseerd inbrengen van damwanden in relatie onder een boom werken, niet in het bestek staat.

6. Bodem, bemaling

De grond is aangeduid als vervuild categorie 1 dus dat betekent werken volgens de procedures daarvoor, in dit geval de CROW publ. 132. Van Hees stort deze grond in open beunbakken en transporteert dit naar de eigen losinrichting waar het wordt overgeslagen in afsluitbare containers tbv transport naar de verwerker. De gemeente geeft aan dat de milieuvergunning eist dat de containers dicht moeten zijn en dat het niet zomaar overgeslagen kan worden op het werkterrein. Hiervoor is een vergunning nodig. Van Hees geeft aan dat dit zijn eigen verantwoordelijkheid is en hier zondig de benodigde vergunning(en) voor aanvraagt.

Van Hees adviseert geen bronbemaling in dit binnenstedelijk gebied omdat naar zijn mening de grondwaterverontreiniging hierdoor verplaatst wordt. De gemeente geeft aan dat daarom juist een tegenbemaling is voorzien bij de Vrouwenjuttenthof. Volgens Van Hees kan het anders en met veel minder kosten. Desgevraagd zal de aannemer de bronnering aanbrengen zoals verwoord in het bemalingsplan van het bestek. Aannemer heeft het risico van verplaatsing van de grondwatervervuiling niet eerder aangekaart bij de aanbesteding terwijl ze wel een waarschuwingsplicht hebben. Van Hees gaat ervan uit dat er geen bronnering toegepast gaat worden.

De gemeente geeft aan dat het bemalingsplan binnen de randvoorwaarden past. Ben van Hees laat desgevraagd weten na gunning een waarschuwingsplicht uit te laten gaan aangaande de bronnering zoals deze in het bestek staat.

Daarnaast geeft Van Hees aan dat door het toepassen van een bronbemaling het risico op zettingschade erg groot is, Van Hees vraagt zich af of de CAR verzekering dit soort risico's als zettingschade dekt.

7. Inschrijfstaat

De gemeente constateert dat Van Hees een aantal posten op nul heeft gezet.
Het gaat om de volgende posten:

813 Monitoringsplan

813010 opstellen monitoringsplan geluidshinder.

814 Bemalingsplan Bouwkuip

814010 Opstellen bemalingsplan bouwkuip.

95 Stelposten

950050 Aankoop straatwerk

Van Hees had een paar vragen over deze posten en zegt hierop geen antwoord gekregen te hebben. Daarom zijn die posten leeg gelaten.

De gemeente geeft aan dat alle ingekomen vragen in de nota van inlichtingen zijn meegenomen en zijn beantwoord.

Verder heeft de gemeente een raming gemaakt om de kosten in te schatten. Op een aantal posten komt Van Hees beduidend lager uit in vergelijking met de raming:

411 Stalen damwand

411120 Statisch drukken stalen damwand walmuur.

Van Hees geeft aan achter deze eenheidsprijzen te blijven staan en ziet geen redenen om eerder genoemde prijzen te herzien.

De kosten voor de Startplank is aanzienlijk lager dan de raming van de opdrachtgever. Van Hees geeft aan dat de opgevoerde kosten niet onrealistisch zijn.

8. Social return

De social return procedures zijn bekend bij Van Hees.



9. Identificatieplicht

Van Hees zal ervoor zorgen dat kopieën van ID-bewijzen aan de directievoering wordt overlegd. De identificatieplicht is opgelegd i.v.m. vreemdelingenwet om te controleren dat alle werkers gemachtigd zijn.

10. Overige

Van Hees vraagt wat er in de planning staat en wanneer gestart kan worden. Het hangt van de verlening van de WABO-vergunning af en of er geen bezwaar op de vergunning gemaakt wordt. Als alles goed gaat, kan er begin november gestart worden.

5.1.2E [redacted] vraagt of de lage inschrijving op bemaling te maken heeft met het feit dat ze dat liever niet uitvoeren. Volgens Van Hees is daar geen relatie tussen.

11. Afsluiting

5.1.2E [redacted] sluit de vergadering en vertelt dat de uitslag z.s.m. bekend wordt gemaakt na intern overleg.

Akkoord directie

5.1.2E [redacted]

Datum:

25/10/11

Akkoord aannemer

*mits onze brief met toelichting aan het
beslag cq verificatie worden toegezonden*

5.1.2E [redacted]

Datum:

2/11/2011

Vergaderverslag

Bijeenkomst	2 ^e verificatieoverleg bestek 30 SW 11	Verslag door	5.1.2E
Projectnummer	402.10390	Datum verslag	21 oktober 2011
Datum	21 oktober 2011	Nummer verslag	2
Tijdstip	16.00 tot 17.30 uur	Verzonden aan	Aanwezigen
Plaats	Ravellaan 96, gebouw 1 kamer 403	Vervolg	-

Deelnemers

Gemeente Utrecht:

5.1.2E

B. van Hees en Zonen B.V.:

Ben van Hees jr.: directeur

5.1.2E 5.1.2E 5.1.2E

Adex Huizen

5.1.2E 5.1.2E

Afwezig

Gemeente Utrecht/ IBU Stadsingenieurs

5.1.2E 5.1.2E

Verslag

1. Opening

5.1.2E opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Het verslag van het eerste verificatieoverleg d.d. 30 september 2011 wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:

- Bij het vorige verificatieoverleg was Ben van Hees sr. aanwezig.
- 5.1.2E moet zijn: 5.1.2E 5.1.2E
- 5.1.2E vertegenwoordigt 5.1.2E en niet de fa. Van Hees.

2. Inschrijvingseisen

Na het eerste verificatieoverleg is er veelvuldig contact geweest met de fa. Van Hees over de opgegeven referenties m.b.t. 'het aanbrengen van damwanden door middel van statisch drukken in een binnenstedelijke omgeving waarbij gebruik is gemaakt van klein materieel'.

Uit de aanvullende verklaring van 5.1.2E d.d. 11 oktober 2011 kon door 5.1.2E niet onomstotelijk worden vastgesteld dat Adex Huizen ook juridisch verantwoordelijk was voor het aanbrengen van de damwanden d.m.v. statisch drukken voor de projecten 'Centrumplan Noord' te Wassenaar en 'Parkeergarage WFCC' te Den Haag. Met andere woorden: Was er sprake van een overeenkomst tot aanneming van werk of heeft Adex Huizen slechts adviesdiensten geleverd voor bovengenoemde projecten? 5.1.2E 5.1.2E verklaart dat Adex Huizen wel degelijk de juridische verantwoordelijkheid droeg voor het aanbrengen van de damwanden d.m.v. statisch drukken. Derhalve geeft 5.1.2E aan dat de fa. Van Hees hiermee voldoet aan de eisen gesteld in hoofdstuk 0.04 d. van het bestek.

De directie vraagt hoe de kennis en vaardigheden van Adex Huizen m.b.t. het statisch drukken van stalen damwanden door de fa. van Hees zullen worden geborgd in de uitvoering van de werkzaamheden van bestek 30 SW 11. 5.1.2E benadrukt dat Adex Huizen bij het hele proces



betrokken dient te worden. Ben van Hees jr. verklaart dat alle werkzaamheden betreffende het aanbrengen van de damwanden onder de verantwoordelijkheid van Adex Huizen, in haar hoedanigheid van onderaannemer van fa. Van Hees, zullen worden verricht. Op deze wijze wordt geborgd dat het project de middelen van Adex Huizen daadwerkelijk en volledig inzet, zoals dit voortvloeit uit de verplichtingen ontstaan door de aangeleverde referenties.

Adex Huizen is als onderaannemer van Van Hees betrokken bij het werk. Adex Huizen stelt samen met Van Hees het werkplan op en verzorgt de techniek van het drukken van de damwanden met de Silent Piler-machine die in eigendom is van de fa. Van Hees. Adex Huizen levert advies aan Van Hees en de drukmachinist die de Silent Piler-machine bedient wordt tevens door Adex Huizen ingehuurd. 5.1.2E

5.1.2E vraagt wat er gebeurt als 5.1.2E of de door hem ingehuurde machinist onverhoopt niet beschikbaar zijn. 5.1.2E geeft aan in dat geval door Adex Huizen voor passende vervanging wordt gezorgd.

Op vraag van 5.1.2E betreffende de betrokkenheid van Gebr. de Koning B.V. antwoordt Ben van Hees jr. dat Gebr. de Koning B.V. verder niet betrokken wordt bij de uitvoering van bestek 30 SW 11.

3. Planning

In het eerste verificatieoverleg heeft de fa. Van Hees aangegeven belang te hechten aan goede communicatie met de omwonenden en zich bereid verklaard aanwezig te zijn bij de door de gemeente te organiseren bewonersavond. Ook 5.1.2E zal bij de bewonersavond aanwezig zijn. De datum waarop deze plaats zal vinden hangt af van de start van de werkzaamheden.

Op 26 oktober is de WABO-vergunning gepubliceerd en is de zienswijzentermijn ingegaan. Deze termijn loopt af op 7 december. Indien er geen opschortende zienswijzen binnenkomen zou de aannemer dus vanaf 8 december aan kunnen vangen met de werkzaamheden. Ben van Hees jr. zal dit weekend de planning, uitgaande van start werk op 8 december 2011, doormailen naar 5.1.2E zodat de directie a.s. maandag de bewoners kan informeren over de voorlopige planning. Het bewonersoverleg zou dan medio november ingepland kunnen worden.

4. Inschrijfstaat

De fa. Van Hees stuurt zo spoedig mogelijk de aangepaste inschrijfstaat (0-posten ingevuld, zie verslag d.d. 30 september 2011), sluitend op hetzelfde eindbedrag aan 5.1.2E

5. Overige

Juridisch gezien staat, behoudens de nog aan te leveren punten als genoemd in dit verslag, er nu niets meer in de weg van de definitieve gunning van het werk aan de fa. 5.1.2E en Zonen 5.1.2E de definitieve opdracht verstrekt wordt dienen wel eerst de verslagen van de twee verificatiegesprekken ondertekend te worden door aannemer en directie. Beide verslagen zijn onderdeel van het contract tussen gemeente en aannemer.

Akkoord directie

5.1.2E

Datum:

25/10/11

Akkoord aannemer


mitzame brief met toelichting aan het verslag o.g. verificatie worden bevestigd

5.1.2E

Datum:

2/11/2011

Stadswerken
IBU Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 – 286 43 23 Fax 030 – 286 43 48
www.utrecht.nl



Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen B.V.
t.a.v. de heer B. van Hees jr.
Heycopstraat 4
3521 EN UTRECHT

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n) 2 in tweevoud
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 26 oktober 2011
Ons kenmerk SW11.085876-mb
Onderwerp Verificatie bestek 30 SW 11

Projectnummer 402.10390
Verzonden **26 OKT. 2011**
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer Van Hees,

Hierbij stuur ik u de verslagen van de verificatieoverleggen voor bestek 30 SW 11 d.d. 30 september 2011 en 21 oktober 2011 in tweevoud ter goedkeuring. Gelieve één exemplaar van elk verslag voor akkoord getekend te retourneren aan ondergetekende via het adres aangegeven bovenaan deze brief.

Zoals besproken tijdens het tweede verificatieoverleg kan er worden overgegaan tot formele opdrachtverstrekking nadat beide geaccordeerde verslagen en de aangepaste inschrijfstaat door aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen B.V. verstrekt zijn aan de directie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

5.1.2E

ir. 5.1.2E

5.1.2E

Stadswerken
IBU Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 – 286 43 23 Fax 030 – 286 43 48
www.utrecht.nl



Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen B.V.
t.a.v. de heer B. van Hees jr.
Heycopstraat 4
3521 EN UTRECHT

Behandeld door 5.1,2E
Doorkiesnummer 5.1,2E
E-mail 5.1,2E@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 27 oktober 2011
Ons kenmerk SW11.086030-mb
Onderwerp Rectificatie m.b.t. verificatie bestek
40 SW 11
Projectnummer 402.10390
Verzonden **28 OKT. 2011**
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer Van Hees,

In mijn schrijven d.d. 26 oktober 2011 met kenmerk SW11.085876-mb en in het bij voornoemde brief gevoegde verslag van het 2^e verificatiegesprek d.d. 21 oktober 2011 betreffende het werk 'Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde' te Utrecht is per abuis het verkeerde besteknummer genoemd.

In zowel de brief als het verslag wordt abusievelijk verwezen naar besteknummer 30 SW 11. U dient '30 SW 11' in bovengenoemde brief en bovengenoemd verslag te lezen als '40 SW 11'.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

5.1,2E
ing. 5.1,2E
5.1,2E

Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EUR	TOTAALBEDRAG IN EUR
1	OPRUIMINGEN EN SLOOPWERK				
11	VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE				
111	OPNAME SITUATIE BESTAANDE VERHARDINGEN				
111010	Opname bestaande situatie verhardingen	EUR	1,00 N	450,00	450,00
12	OPNEMEN BESTRATING EN STRAATMEUBILAIR				
121	OPNEMEN BESTRATING				
121010	Opnemen bestrating t.b.v. walmuur.	m2	270,00 V	5,00	1350,00
121020	Opnemen bestrating t.b.v. drainageleidingen.	m2	35,00 V	10,00	350,00
122	OPNEMEN STRAATMEUBILAIR E.D.				
1221	<u>Afmeerringen</u>				
122110	Opnemen afmeerring nr. 1.	st	1,00 V	35,00	35,00
122120	Opnemen afmeerring nr. 2.	st	1,00 V	35,00	35,00
122130	Opnemen afmeerring nr. 3, 4 en 5.	st	3,00 V	35,00	105,00
123	DIVERSEN				
123010	Verlenen assistentie bij verplaatsingen	uur	100,00 V	38,50	3850,00
13	SCHRIKHEKKEN EN MEERPALEN				
1311	<u>Schrikhekk</u>				
131110	Slopen schrikhek bij Bijlhouwerbrug.	st	1,00 N	125,00	125,00
131120	Slopen schrikhek bij Diaconessenstraat.	st	1,00 N	135,00	135,00
1312	<u>Meerpalen</u>				
131210	Slopen meerpalen bij Bijlhouwerbrug.	st	2,00 N	90,00	180,00
14	SLOPEN METSELWERK EN NATUURSTEEN				
141	SLOPEN METSELWERK				
1411	<u>Slopen metselwerk segment 3</u>				
141110	Slopen metselwerk rollaag segment 3.	m3	2,40 V	100,00	240,00
141120	Slopen metselwerk walmuur segment 3.	m3	3,60 V	100,00	360,00
1412	<u>Slopen metselwerk segment 4</u>				
141210	Slopen metselwerk rollaag segment 4.	m3	0,80 V	100,00	80,00
141220	Slopen metselwerk walmuur segment 4.	m3	6,55 V	100,00	655,00
1413	<u>Slopen metselwerk segment 5</u>				
141310	Slopen metselwerk rollaag segment 5.	m3	1,32 V	100,00	132,00
141320	Slopen metselwerk walmuur segment 5.	m3	2,25 V	100,00	225,00
1414	<u>Slopen metselwerk segment 6</u>				
141410	Slopen metselwerk rollaag segment 6.	m3	4,75 V	100,00	475,00
141420	Slopen metselwerk walmuur segment 6.	m3	29,50 V	100,00	2950,00
1415	<u>Slopen metselwerk segment 7</u>				
141510	Slopen metselwerk rollaag segment 7.	m3	0,52 V	100,00	52,00
141520	Slopen metselwerk walmuur segment 7.	m3	3,80 V	100,00	380,00
142	VERWIJDEREN NATUURSTEEN				
142010	Verwijderen natuursteen blok	st	1,00 N	90,00	90,00
15	VERWIJDEREN HOUT FUNDERING EN DAMWANDEN				
151	VERWIJDEREN HOUT FUNDERING SEGMENT 3				
1511	<u>Hout fundatie segment 3</u>				
151110	Verwijderen houten paalkoppen segment 3.	st	63,00 V	40,00	2520,00

Printdatum: 2-11-2011

Reconstructie lage walruw Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS-		EEN-	HOEEVEELHEID	PRIJS	TOTAALBEDRAG
POST-	OMSCHRIJVING	HEID	RESULTAATS-	PER EENHEID	IN EUR
NUMMER			VERPLICHTING	IN EUR	
151120	Verwijderen houten palen segment 3.	st	7,00 V	62,50	437,50
151130	Aanbrengen zand-bentonietmengsel in paalgaten	m3	0,70 V	205,00	143,50
1512	<u>Houten damwandscherm segment 3</u>				
151210	Verwijderen houten damwand segment 3.	m1	34,00 V	74,00	2516,00
152	VERWIJDEREN HOUT FUNDERING SEGMENT 4				
1521	<u>Hout fundatie segment 4</u>				
152110	Verwijderen houten onderdelen fundering segment 4.	m1	11,00 V	50,00	550,00
152120	Verwijderen houten palen segment 4.	st	4,00 V	57,00	228,00
152130	Aanbrengen zand-bentonietmengsel in paalgaten	m3	0,40 V	205,00	82,00
1522	<u>Houten damwandscherm segment 4</u>				
152210	Verwijderen houten damwand segment 4.	m1	11,00 V	50,00	550,00
153	VERWIJDEREN HOUT FUNDERING SEGMENT 5				
1531	<u>Hout fundatie segment 5</u>				
153110	Verwijderen houten paalkoppen segment 5.	st	32,00 V	40,00	1280,00
153120	Verwijderen houten palen segment 5.	st	4,00 V	62,50	250,00
153130	Aanbrengen zand-bentonietmengsel in paalgaten	m3	0,40 V	205,00	82,00
1532	<u>Verwijderen houten damwand segment 5</u>				
153210	Verwijderen houten damwand segment 5.	m1	18,00 V	67,50	1215,00
154	VERWIJDEREN HOUT FUNDERING SEGMENT 6				
1541	<u>Hout fundatie segment 6</u>				
154110	Verwijderen houten onderdelen fundering segment 6.	m1	65,00 V	50,00	3250,00
154120	Verwijderen houten paalkoppen segment 6.	st	104,00 V	40,00	4160,00
154130	Verwijderen houten palen segment 6.	st	13,00 V	82,50	1072,50
154140	Aanbrengen zand-bentonietmengsel in paalgaten	m3	0,85 V	205,00	174,25
1542	<u>Houten damwandscherm segment 6</u>				
154210	Verwijderen houten damwand segment 6.	m1	65,00 V	57,00	3705,00
155	VERWIJDEREN HOUT FUNDERING SEGMENT 7				
1551	<u>Hout fundatie segment 7</u>				
155110	Verwijderen houten onderdelen fundering segment 7.	m1	7,00 V	50,00	350,00
155120	Verwijderen houten paalkoppen segment 7.	st	12,00 V	40,00	480,00
155130	Verwijderen houten palen segment 7.	st	2,00 V	72,50	145,00
155140	Grond verwerken in paalgaten segment 7.	m3	0,16 V	500,00	80,00
1552	<u>Houten damwandscherm segment 7</u>				
155210	Verwijderen houten damwand segment 7.	m1	7,00 V	42,00	294,00
16	SLOPEN BETONWERK				
1601	<u>Slopen betonwerk segment 3</u>				
160110	Slopen gewapend betonsloof segment 3.	m3	5,70 V	150,00	855,00
1602	<u>Slopen betonwerk segment 5</u>				
160210	Slopen gewapend betonsloof segment 5.	m3	3,30 V	150,00	495,00
1603	<u>Slopen betonwerk riolering</u>				
160310	Slopen ongewapend betonomhulling riool segment 4	m3	1,00 V	200,00	200,00
160320	Zagen gewapend betonfundatie riolering segment 4.	m1	1,30 V	200,00	260,00
160330	Slopen gewapend betonsloof riolering segment 4.	m3	0,40 V	300,00	120,00
17	VERWIJDEREN RIOLERING				
171	VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING				

Printdatum: 2-11-2011

Reconstructie lage walruur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS-		EEN-	HOEEVEELHEID	PRIJS	TOTAALBEDRAG
POST-	OMSCHRIJVING	HEID	RESULTAATS-	PER EENHEID	IN EUR
NUMMER			VERPLICHTING	IN EUR	
171010	Uitbreken hoofdriolering 315 mm	m	3,50 V	45,00	157,50
171030	Verwijderen betonnen inspectieputafdekplaat.	st	1,00 V	200,00	200,00
171050	Verwijderen betonnen prefabput aansluitput	st	1,00 V	200,00	200,00
175	VERWIJDEREN HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
2	TIJDELIJKE CONSTRUCTIES EN BEMALING				
21	TIJDELIJKE BOUWKUIP				
211	TIJDELIJKE DAMWAND T.B.V. BOUWKUIP				
2111	<u>Aanbrengen tijdelijke damwand</u>				
211110	Statisch drukken tijdelijke stalen damwand.	m1	140,00 V	326,00	45640,00
211120	Aanbrengen gording.	m1	140,00 V	22,00	3080,00
211130	Aanbrengen compartimentering bouwkuip.	EUR	1,00 N	3240,00	3240,00
211140	Aanbrengen houten wrijfgording.	EUR	1,00 N	4550,00	4550,00
211150	Statisch drukken startplanken tijdelijke damwand	EUR	1,00 N	2940,00	2940,00
2112	<u>Verwijderen tijdelijke damwand</u>				
211230	Verwijderen compartimenteringen bouwkuip.	EUR	1,00 N	2120,00	2120,00
211240	Verwijderen gording.	m1	140,00 V	10,00	1400,00
211250	Verwijderen tijdelijke stalen damwand.	m1	140,00 V	175,66	24592,40
211260	Statisch trekken eindplanken tijdelijke damwand	EUR	1,00 N	1960,00	1960,00
211270	Aanbrengen zand-bentonietmengsel	m	60,00 V	110,00	6600,00
212	TIJDELIJKE GRONDKERING T.B.V. BOUWKUIP				
212110	Toepassen sleufbekisting	m1	140,00 V	31,00	4340,00
212120	Toepassen tijdelijk stempeling	m1	140,00 V	12,00	1680,00
212130	Verwijderen tijdelijke stempeling	m1	140,00 V	5,50	770,00
212140	Verwijderen sleufbekisting	m1	140,00 V	20,50	2870,00
23	BEMALING				
231	BEMALING BOUWKUIP				
2311	<u>Openbemaling</u>				
231110	Aanbrengen open bemaling bouwkuip	EUR	1,00 N	1360,00	1360,00
231120	Instandhouden open bemaling bouwkuip.	EUR	1,00 N	4680,00	4680,00
231130	Verwijderen open bemaling bouwkuip.	EUR	1,00 N	960,00	960,00
2312	<u>Bronbemaling</u>				
231210	Aanbrengen bronbemaling bouwkuip.	EUR	1,00 N	4200,00	4200,00
231220	Instandhouden bronbemaling bouwkuip.	EUR	1,00 N	2400,00	2400,00
231230	Verwijderen bronbemaling bouwkuip.	EUR	1,00 N	1000,00	1000,00
2313	<u>Inlaten water in bouwkuip</u>				
231340	Pompen water in bouwkuip.	EUR	1,00 N	1140,00	1140,00
232	TEGENBEMALING				
232010	Inrichten werkteerein tegenbemaling.	EUR	1,00 N	500,00	500,00
232020	Toepassen bronbemaling als tegenbemaling.	EUR	1,00 N	5500,00	5500,00
232030	Instandhouden bronbemaling (in bedrijf).	EUR	1,00 N	1600,00	1600,00
232040	Instandhouden bronbemaling (buiten bedrijf).	EUR	1,00 N	1000,00	1000,00
233	REINIGINGSINSTALLATIE BRONNERINGSWATER				
233010	Aanbrengen waterreinigings-installatie.	EUR	1,00 N	3000,00	3000,00
233020	Water reinigen.	EUR	1,00 N	1000,00	1000,00
233030	Afvoeren reinigingsinstallatie	EUR	1,00 N	1000,00	1000,00
3	GRONDWERK EN GROENVOORZIENINGEN				
31	GRONDWERK				

Printdatum: 2-11-2011

Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS-	EEN-	HOEEVEELHEID	PRIJS	TOTAALBEDRAG
POST-	HEID	RESULTAATS-	PER EENHEID	IN EUR
NUMMER		VERPLICHTING	IN EUR	
311	ONTGRAVEN GROND			
3110	<u>Aanvullende inrichting werkterrein</u>			
311010	Overige werkzaamheden locatie.	EUR	1,00 N	2900,00
3111	<u>Ontgraven grond sleuf walmuur tot N.A.P. +0.00 m</u>			
311110	Grond ontgraven uit sleuf segment 3 buiten bomen	m3	15,00 V	10,00
311120	Grond ontgraven uit sleuf segment 3 tpv bomen	m3	6,00 V	70,00
311130	Grond ontgraven uit sleuf segment 4 buiten bomen	m3	8,00 V	10,00
311140	Grond ontgraven uit sleuf segment 5 buiten bomen	m3	12,00 V	10,00
311150	Grond ontgraven uit sleuf segment 6 buiten bomen	m3	32,00 V	10,00
311160	Grond ontgraven uit sleuf segment 6 tpv bomen	m3	5,00 V	70,00
311170	Grond ontgraven uit sleuf segment 7 buiten bomen	m3	4,00 V	10,00
3112	<u>Ontgraven grond sleuf walmuur beneden N.A.P.</u>			
311210	Grond ontgraven uit sleuf segment 3 buiten bomen	m3	19,00 V	10,00
311220	Grond ontgraven uit sleuf segment 3 tpv bomen	m3	8,00 V	10,00
311230	Grond ontgraven uit sleuf segment 4 buiten bomen	m3	8,00 V	10,00
311240	Grond ontgraven uit sleuf segment 5 buiten bomen	m3	15,00 V	10,00
311250	Grond ontgraven uit sleuf segment 6 buiten bomen	m3	36,00 V	10,00
311260	Grond ontgraven uit sleuf segment 6 tpv bomen	m3	6,00 V	70,00
311270	Grond ontgraven uit sleuf segment 7 buiten bomen	m3	4,00 V	10,00
3113	<u>Grond ontgraven sleuven drainage</u>			
311310	Grond ontgraven t.b.v. drain diam. 80mm.	m3	20,00 V	10,00
312	VERVOEREN GROND			
3121	<u>Vervoeren ontgraven grond</u>			
312110	Vrijgekomen grond vervoeren over het water.	m3	207,00 V	19,14
312120	Overslag grond	m3	207,00 V	5,00
312130	Vrijgekomen grond vervoeren over de weg.	m3	207,00 V	7,00
313	VERWERKEN GROND			
3131	<u>Verwerken grond in sleuf achter walmuur</u>			
313110	Grond verwerken in sleuf verzamelrain.	m3	41,00 V	20,00
313130	Grond verwerken in aanvulling sleuf achter walmuur	m3	140,00 V	20,00
313140	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	140,00 V	2,00
313150	Grond verwerken in aanvulling sleuf bomenzand.	m3	10,00 V	20,00
3132	<u>Grondverwerken in sleuven drainage</u>			
313210	Aanvullen drainsleuf met draineerzand.	m3	40,00 V	20,00
313230	Aanvullen drainsleuf met bomenzand.	m3	25,00 V	20,00
314	LEVEREN GROND			
314010	Leveren zand in aanvulling of ophoging.	m3	140,00 V	12,00
314020	Leveren draineerzand	m3	81,00 V	15,00
314030	Leveren "Utrechts" bomenzand	m3	35,00 V	20,00
315	GEOTEXTIEL			
315010	Aanbrengen geotextiel (deksloof).	m2	150,00 V	13,50
315020	Aanbrengen geotextiel (drainage).	m2	110,00 V	13,50
32	TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN			
320	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING			
320010	Verwijderen/afvoeren bomen diam. tot 0,20 m.	st	1,00 V	500,00
321	AANBRENGEN GROENVOORZIENING			
321020	Grond verbeteren tbv te planten boom	m3	9,00 V	57,50
322	BOOMBESCHERMEDE MAATREGELEN			

Printdatum: 2-11-2011

Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS-		EEN-	HOEVEELHEID	PRIJS	TOTAALBEDRAG
POST-	OMSCHRIJVING	HEID	RESULTAATS-	PER EENHEID	IN EUR
NUMMER			VERPLICHTING	IN EUR	
322030	Toepassen stamommanteling, ? 0,20 m of meer.	st	22,00 V	120,00	2640,00
323	PLANTEN BOMEN				
323010	Planten bomen. soort, met kluit. (T.b.s.)	st	1,00 V	1000,00	1000,00
324	BEWATEREN BOMEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN				
324010	Watergeven bomen in verharding.	st	22,00 V	105,00	2310,00
325	NAZORG				
325010	Watergeven bomen in verharding.	st	1,00 V	35,00	35,00
4	FUNDERINGSCONSTRUCTIES EN BETONWERK				
41	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
411	STALEN DAMWAND				
4111	<u>Aanbrengen stalen damwand</u>				
411110	Aanbrengen paalverkliekers.	st	292,00 V	8,00	2336,00
411120	Statisch drukken stalen damwand walmuur.	m1	133,50 V	980,00	130830,00
411130	Statisch drukken stalen damwand walmuur- bomen.	m1	6,50 V	1303,00	8469,50
411140	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	6,50 V	10,50	68,25
411150	Verwijderen paalverkliekers.	st	292,00 V	3,50	1022,00
411160	Statisch drukken startplanken damwand walmuur	EUR	1,00 N	2940,00	2940,00
4112	<u>Voorzieningen stalen damwand</u>				
411210	Aanbrengen gaten voor doorvoer drainafvoer.	st	2,00 V	340,00	680,00
411220	Aanbrengen doorvoer drainafvoer.	st	2,00 V	275,00	550,00
411230	Aanbrengen gaten voor doorvoer riool.	st	1,00 V	70,00	70,00
411240	Aanbrengen doorvoer riool.	st	1,00 V	650,00	650,00
412	PAALFUNDERING				
412010	Aanbrengen stalen palen wasplaats.	st	2,00 V	2600,00	5200,00
412020	Aanbrengen wapening stalen buispalen.	EUR	1,00 N	170,00	170,00
412030	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	0,30 V	505,00	151,50
42	BETONWERK				
421	PREFAB BETONELEMENTEN				
4211	<u>Leveren prefab betonelementen</u>				
421110	Leveren prefab schortelementen.	m1	63,50 V	150,00	9525,00
4212	<u>Aanbrengen prefab betonelementen</u>				
421210	Aanbrengen prefab schortelementen..	st	11,00 V	225,00	2475,00
421220	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	19,00 V	10,00	190,00
422	IN HET WERK GESTORT BETON				
4221	<u>Aanstorten prefab elementen</u>				
422110	Aanbrengen werkvloer landzijde.	m2	25,00 V	48,00	1200,00
422120	Aanbrengen verloren bekisting waterzijde.	m2	13,00 V	85,00	1105,00
422130	Toepassen bekisting t.b.v. rand betonsloof.	m2	22,00 V	85,00	1870,00
422140	Toepassen bekisting t.b.v. dilatatievoegen.	m2	2,00 V	117,50	235,00
422150	Toepassen bekisting dilatatievoegen.	m2	2,00 V	117,50	235,00
422160	Aanbrengen beton deksloof.	m3	9,50 V	252,50	2398,75
422170	Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.	m2	32,00 V	17,50	560,00
4222	<u>Betonschorten</u>				
422210	Toepassen bekisting vloer (waterzijde).	m2	38,00 V	85,00	3230,00
422220	Aanbrengen werkvloer (landzijde).	m2	28,00 V	43,00	1204,00
422230	Toepassen bekisting t.b.v. randen waterzijde.	m2	48,00 V	85,00	4080,00
422240	Toepassen bekisting t.b.v. randen landzijde.	m2	21,00 V	85,00	1785,00

Printdatum: 2-11-2011

Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS-		EEN-	HOEEVEELHEID	PRIJS	TOTAALBEDRAG
POST-	OMSCHRIJVING	HEID	RESULTAATS-	PER EENHEID	IN EUR
NUMMER			VERPLICHTING	IN EUR	
422250	Toepassen bekisting t.b.v. dilatatievoegen.	m2	4,00 V	117,50	470,00
422260	Toepassen bekisting dilatatievoegen.	m2	4,00 V	117,50	470,00
422270	Aanbrengen in te betonneren doken.	st	140,00 V	6,50	910,00
422280	Aanbrengen beton deksloof.	m3	27,00 V	270,00	7290,00
422290	Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.	m2	60,00 V	3,50	210,00
4223	<u>Wasplaats op damwand</u>				
422310	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	1,35 V	100,00	135,00
422320	Aanbrengen werkvloer.	m2	3,75 V	18,00	67,50
422330	Toepassen bekisting t.b.v. rand betonsloof.	m2	1,65 V	100,00	165,00
422340	Toepassen bekisting t.b.v. rand betonsloof.	m2	2,10 V	85,00	178,50
422350	Toepassen bekisting t.b.v. dilatatievoegen.	m2	0,67 V	117,50	78,73
422360	Toepassen bekisting t.b.v. dilatatievoegen.	m2	0,67 V	117,50	78,73
422370	Aanbrengen in te betonneren doken.	st	5,00 V	55,00	275,00
422380	Aanbrengen beton wasplaats	m3	0,95 V	270,00	256,50
422390	Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.	m2	4,30 V	7,00	30,10
423	BETONSTAAL				
423010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.	kg	1600,00 V	1,40	2240,00
423020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	1700,00 V	1,30	2210,00
5	VERHARDINGEN				
51	BESTRATING				
511010	Aanbrengen bestrating langs werfmuur.	m2	270,00 V	35,00	9450,00
511020	Aanbrengen bestrating t.b.v. drainageleidingen.	m2	35,00 V	35,00	1225,00
52	AANBRENGEN AFMEERRINGEN				
520010	Aanbrengen afmeerring nr. 3, 4 en 5.	st	3,00 V	65,00	195,00
520020	Aanbrengen afmeerring nr. 1.	st	1,00 V	35,00	35,00
520030	Aanbrengen afmeerring nr. 2.	st	1,00 V	35,00	35,00
6	METSELWERK, NATUURSTEEN EN HOUTCONSTRUCTIES				
61	METSELWERK				
611	METSELWERK ALGEMEEN				
6111	<u>Leveren metselsteen walmuren</u>				
611110	Leveren metselsteen walmuur.	st	13500,00 V	0,60	8100,00
611120	Uitvoeren keuring metselsteen walmuur.	EUR	1,00 N	500,00	500,00
6112	<u>Uitvoeren proeven</u>				
611210	Uitvoeren 1 minuut hechtproef	keer	2,00 V	500,00	1000,00
611220	Uitvoeren 10 minuut hechtproef	keer	2,00 V	600,00	1200,00
611230	Proefstuk metselwerk walmuur.	st	2,00 V	600,00	1200,00
612	METSELWERK WALMUUR				
612010	Metselwerk walmuur, ? steens.	m2	47,00 V	147,00	6909,00
612020	Metselwerk walmuur, rollaag 1? steens.	m2	23,50 V	560,00	13160,00
612030	Metselwerk wasplaats, horizontaal, ? steens.	m2	2,70 V	230,00	621,00
62	NATUURSTEEN				
6211	<u>Natuursteen rollaag</u>				
621110	Aanbrengen natuursteenblok aansluiting Bijlh.brug.	st	1,00 N	389,00	389,00
621120	Aanbrengen natuursteenblok rollaag hoogteverschil.	st	1,00 N	340,00	340,00
6212	<u>Natuursteen wasplaats</u>				
621210	Aanbrengen natuursteenblokken wasplaats-rollaag.	st	2,00 N	340,00	680,00
621220	Aanbrengen natuursteenblokken wasplaats-hek.	st	3,00 N	320,00	960,00

Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS-		EEN-	HOEEVEELHEID	PRIJS	TOTAALBEDRAG
POST-	OMSCHRIJVING	HEID	RESULTAATS-	PER EENHEID	IN EUR
NUMMER			VERPLICHTING	IN EUR	
63	HOUTCONSTRUCTIES				
6310	<u>Schrikhek en meerpalen segment 7 (sectie 15W2)</u>				
631010	Vervaardigen schrikhek segment 7 (sectie 15W2).	st	1,00 N	200,00	200,00
631020	Vervaardigen meerpalen (sectie 15W2).	st	2,00 N	140,00	280,00
631030	Conserveren schrikhek en meerpalen voor aanbrengen	EUR	1,00 N	300,00	300,00
631040	Conserveren leuningbeugels schrikhek.	EUR	1,00 N	200,00	200,00
631050	Aanbrengen schrikhek (sectie 15W2).	st	1,00 N	200,00	200,00
631060	Aanbrengen meerpalen (sectie 15W2).	st	2,00 N	300,00	600,00
631070	Conserveren schrikhek en meerpalen na aanbrengen.	EUR	1,00 N	200,00	200,00
6311	<u>Schrikhek segment 6 (wasplaats, sectie 15W12)</u>				
631110	Vervaardigen schrikhek segment 6.	st	1,00 N	200,00	200,00
631120	Conserveren schrikhek voor aanbrengen	EUR	1,00 N	2004,00	2004,00
631130	Bevestigingsstrippen schrikhek segment 6.	st	3,00 N	51,00	153,00
631140	Aanbrengen schrikhek segment 6.	st	1,00 N	140,00	140,00
631150	Conserveren schrikhek na aanbrengen.	EUR	1,00 N	200,00	200,00
7	RIOLERING EN DRAINAGE				
72	AFKISTING EN BEMALING RIOLERING				
73	AANBRENGEN HOOFDRIOLERING				
733	KUNSTSTOFRIOLBUIZEN				
733010	Lev- /aanbrengen PVC-buis diam. 250 mm.	m	35,00 V	82,00	2870,00
733020	Lev- /aanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.	m	1,00 V	86,00	86,00
733030	Lev- /aanbrengen PVC-buis diam. 315 mm.	m	1,00 V	117,50	117,50
733410	Lev/aanbr. PVC-steek	st	1,00 V	80,00	80,00
733420	Lev/aanbr. PVC-steek	st	2,00 V	305,00	610,00
733430	Lev/aanbr. PVC-steekmof diam. 160 mm.	st	2,00 V	187,50	375,00
733510	Lev/aanbr. PVC-bocht 90 gr diam. 250 mm.	st	1,00 V	287,50	287,50
733520	Lev/aanbr. PVC-bocht 45 gr R=3,5 x D diam. 315 mm.	st	1,00 V	405,00	405,00
733610	Boren inlaat op gladde kunststof rioolbuis.	st	6,00 V	70,00	420,00
733710	Lev- /aanbrengen keilinlaat 125 op gladde buis.	st	6,00 V	170,00	1020,00
733810	Aanbrengen PVC-standpijp 125 mm.	m	3,00 V	50,00	150,00
734	KUNSTSTOF RIOOLINSPECTIEPUTTEN				
734010	Lev- /aanbrengen PP put, diam. 315 mm.	st	1,00 V	710,00	710,00
734020	Lev- /aanbrengen PP put, nominale diam. 400 mm.	st	2,00 V	810,00	1620,00
735	OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOL				
735120	Maken aansluiting 250 op bestaande prefab put 3303	st	1,00 V	310,00	310,00
735240	Aansluiten riool op bestaande PVC buizen	st	1,00 V	1200,00	1200,00
735330	Aanbrengen putrand met deksel op drainput.	st	2,00 V	355,00	710,00
736	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
736010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	1,00 N	1250,00	1250,00
736030	Tijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen.	EUR	1,00 N	2880,00	2880,00
736070	Aanbrengen tijdelijke verbindingen 250-500 mm.	st	1,00 V	1500,00	1500,00
75	AANBRENGEN AFWATERINGSVOORZIENINGEN				
753	AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING				
753010	Maken huisaansluitingen in de werf	m	4,00 V	105,00	420,00
753020	Lev- /aanbrengen ontstoppingsput, diam. 315 mm.	st	1,00 V	675,00	675,00
76	DRAINAGE EN INFILTRATIE				
761	DRAINAGE T/M 200 MM MET KLIKMOF VERBINDING				
761010	Lev-/aanbrengen drains 80 mm horizontale drainage	m	64,00 V	22,50	1440,00
761050	Lev-/aanbrengen drains 125 mm horizontale drainage	m	124,00 V	22,50	2790,00

Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EUR	TOTAALBEDRAG IN EUR
761100	Lev\aanbr T-stuk voor aansluiting op IT -drainage	st	1,00 V	27,50	27,50
761120	Lev\aanbr drain verbindingsleiding diam. 125 mm.	m	2,70 V	27,50	74,25
761910	Lev\ aanbrengen aansluiting drain op kademuur.	st	1,00 V	160,00	160,00
767	INFILTRATIEPUTTEN BIJ SPUWERS				
767010	Verwijderen en herplaatsen zakputje	st	8,00 V	90,00	720,00
778	OVERIGE WERKZAAMHEDEN DRAINAGE				
778010	Lev\aanbrengen mantelbuis DN 160	st	1,00 V	340,00	340,00
8	ALGEMEEN				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
811	V&G-CO?RDINATIE				
811010	V&G-Co?rdinatie	EUR	1,00 N	900,00	900,00
812	WERKPLANNEN EN TEKENINGEN				
812010	Vervaardigen algemeen gedetailleerd werkplan.	EUR	1,00 N	1320,00	1320,00
812020	Opstellen werkplannen onderdelen.	EUR	1,00 N	2300,00	2300,00
812030	Maken tekening(en) natuursteen elementen	EUR	1,00 N	200,00	200,00
812040	Maken tekeningen en berekeningen prefab elementen.	EUR	1,00 N	500,00	500,00
812060	Opstellen bouwveiligheidsplan	EUR	1,00 N	560,00	560,00
813	MONITORINGSPLANNEN				
813010	Opstellen monitoringsplan geluidshinder.	EUR	1,00 N	0,00	0,00
814	BEMALINGSPLAN BOUWKUIP				
814010	Opstellen bemalingsplan bouwkuij.	EUR	1,00 N	0,00	0,00
815	MONITORING				
815010	Uitvoeren monitoring geluidshinder.	EUR	1,00 N	700,00	700,00
816	REVISIE				
816010	Uitvoeren revisiewerk Civiele Constructies	EUR	1,00 N	1400,00	1400,00
816020	Het maken van revisiewerk t.b.v. riolering.	EUR	1,00 N	1400,00	1400,00
8162	<u>Revisie cultuurtechniek</u>				
816210	Het maken van revisiewerk t.b.v. Cultuurtechniek.	EUR	1,00 N	350,00	350,00
817	BESCHIKBAARSTELLEN WERKNEMERS				
817010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00 V	38,50	3080,00
818	BOUWHEK				
818010	Toepassen bouwhek	EUR	1,00 N	3970,00	3970,00
SUBTOTAAL					494180,93

Reconstructie lage walmuur Rak 15 westzijde
40SW11 Aanpassing c.q. verduidelijking op verzoek directie

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EUR	TOTAALBEDRAG IN EUR
	(Transport)				494180,93
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	1000,00 EUR	N		
910020	Opruimen van werkterrein.	500,00 EUR	N		
918880	Overige eenmalige kosten EUR	14650,00 EUR	N		
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	N		16150,00
929990	Uitvoeringskosten	EUR	N		15949,60
939990	Algemene kosten	EUR	N		26314,03
949990	Winst en risico	EUR	N		20524,94
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	V		5000,00
950020	Stelpost schoren bomen.	EUR	V		4000,00
950030	Stelpost overzetten vissen	EUR	V		1500,00
950040	Stelpost PVC rioleringen	EUR	V		2500,00
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	N		880,50
	AANNEEMSOM, EXCLUSIEF BTW				587000,00

Gedaan te Utrecht

De dinsdag 6 september 2011

De inschrijver(s),
BV Aannemersbedrijf B. van HEES en Zonen Utrecht

5.1.2E

B.V. Aannemers bedrijf
B. van Hees & Zonen
Heycopstraat 4, 3521 EN - Utrecht
Tel. 030-2937946

Aan gebr. de Leeuw B.V.
Beurtvaartweg 8
4906 CN Oosterhout

5.1.2E

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n) geen

Datum 19 augustus 2014
Ons kenmerk SW14.058976
Onderwerp Opdracht Bestekswerk 14 SW 086
Stabiliseren walmuren
Nieuwegracht

Uw kenmerk Bestek 14SW 086.
Uw brief van

Projectnummer 141.2076
Verzonden **20 AUG. 2014**
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte directie,

Hierbij draag ik u, conform uw prijsaanbieding binnen de openbare aanbesteding op 18 juli jl., de werkzaamheden op voor project "Stabiliseren walmuren Nieuwegracht" te Utrecht, conform bestek 14 SW 086 te Utrecht.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een maximaal bedrag van EUR 2.105.602,00 exclusief 21% BTW.

Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd alvorens deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Contactpersoon is de heer 5.1.2E telefonisch bereikbaar onder nummer 5.1.2E 5.1.2E
De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie moet binnen 7 werkdagen na datum van de opdracht, met begeleidend schrijven, bij ons zijn binnengekomen.

U wordt verzocht de gespecificeerde termijnen in tweevoud in te dienen onder vermelding van:

- de heer 5.1.2E van Projecten, Stadswerken.
- Opdrachtnummer: 57 000 18 367

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiële Dienstverlening
Postbus 10080 3505 AB Utrecht

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hooftachtend,

5.1.2E

G. de Wit
Directeur Stadswerken

Vergaderverslag

Bijeenkomst	Verificatieoverleg met Gebr. De Leeuw "Stabiliseren walmuren rak 16 t/m 20"	Projectnummer	141.2002.03
Datum overleg	11 augustus 2014	Verslag door	5.1.2E
Tijdstip	11.30 – 13.00 uur	Datum verslag	12 augustus 2014
Plaats	Ravellaan 96 te Utrecht Kamer 6.03	Verzonden aan	Genodigden
		Bijlagen	-

Aanwezig:

5.1.2E (Gebr. De Leeuw B.V.), 5.1.2E (Stedelijk Beheer), 5.1.2E (Stedelijk Beheer), 5.1.2E (Stedelijk Beheer), 5.1.2E (Stadsingenieurs) en 5.1.2E (Stadsingenieurs)

Afwezig:

5.1.2E (Stadswerken)

Verslag

1. Opening

5.1.2E opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Kennismaking/voorstelronde

Een korte voorstelronde volgt:

5.1.2E – 5.1.2E
5.1.2E –
5.1.2E –
5.1.2E –
5.1.2E –
5.1.2E –

3. Inschrijvingsvereisten/in te zetten (onder)aannemers

5.1.2E wil weten hoe het druksysteem gaat werken.

5.1.2E De Leeuw bouwt zelf een lichter uitgevoerde drukmachine van het type silent piler van constructief-/domex-staal. Deze machine is voor eind oktober 2014 gereed. Wanneer de opdracht wordt verstrekt, zal de drukstelling één week voor het van start gaan van de werkzaamheden gereed zijn.

5.1.2E merkt op dat 26 augustus a.s., mits er geen bezwaar wordt ingediend, de officiële opdracht wordt verstrekt.

De werkzaamheden voor het drukken van de damwanden wordt uitgevoerd door eigen personeel van De Leeuw + 1 ingehuurde kracht van Wedam. Er kan een extra drukmachine van Wedam worden ingezet wanneer dit nodig is. 5.1.2E vraagt een referentie van Wedam alsmede de referentie van project De Helling waarbij De Leeuw ervaring m.b.t. drukken damwanden claimt. 5.1.2E zal deze opvragen c.q. opstellen. Actie 1. 5.1.2E

4. Omgeving

5.1.2E merkt op dat er dagelijks een omgevingsmanager en een uitvoerder op het werk aanwezig zijn volgens de EMVI inschrijving. 5.1.2E vraagt of de behandeling van klachten/vragen wordt vastgelegd.

5.1.2E geeft aan dat alle bewoners/aanwonenden een brief met een inlogcode ontvangen waarmee ze kunnen inloggen op de site van het werk. Hier kunnen zij klachten/verbeterpunten/foto's op kwijt. De reactietijd op vragen is 2 uur.

5. Bodem en bemaling

5.1.2E merkt op dat er verontreiniging zit en dat slib en bagger in gesloten bakken moet worden afgevoerd. Is er een locatie voor een tijdelijk depot bekend? Rekening moet worden gehouden met vergunning en overslag en het moet aangemeld worden bij het NIWO.

5.1.2E is in onderhandeling met 2 particuliere locaties welke De Leeuw gaat huren.

5.1.2E vindt de prijs voor het dichtzetten van de bouwkuipen (de compartimenteringen) erg laag. Hij heeft hierover al eerder een brief aan De Leeuw verstuurd.

5.1.2E vindt dat er goede afspraken en inschattingen moeten zijn, zodat er geen discussies tijdens het werk.

5.1.2E merkt op dat het een verplichting van De Leeuw is om de schotten waterdicht te maken. Mocht dit niet lukken dan hebben zij altijd injectie achter de hand. Hij is ervan overtuigd dat hij de schotten dicht krijgt.

5.1.2E merkt op dat de kisten bewust tot 90–100 cm breed zijn gemaakt zodat ze er van overtuigd zijn dat het dicht is. Ook wordt er speciale vette klei aangevoerd wat met dezelfde cilinder kan worden gepompt als de zwelkorrels.

5.1.2E vindt het vreemd dat de duiker voor 0 euro staat vermeld.

5.1.2E geeft aan dat alleen voor het schoonmaken en het inmeten van de schotten duikers nodig zijn. Vastgelegd wordt dat De Leeuw op het bovenstaande niet terug kan komen.

5.1.2E wil weten hoe de zwelkorrels voor de afsluitende laag onder de rioolkoffer worden aangebracht en hoe wordt gecontroleerd of de zwelkorrels een dichte laag formeren.

Volgens 5.1.2E kunnen de baggerpompen met een slang van bovenaf tussen de damwand en achter de koffer. Met een cilinder kunnen de zwelkorrels worden aangebracht.

5.1.2E merkt op dat de betonnen rioolkoffer tussen 2 stalen damwanden is gestort; hier kan je niet zonder extra maatregelen onder komen. Er zal een sparing moeten worden gemaakt in de stalen damwand om de korrels aan te brengen. Dit is een aandachtspunt.

Voor de bemaling is vergunning verleend; er mag in de Nieuwegracht worden gepompt. Er moet wel een debietmeter tussen worden geplaatst.

6. Aan- en afvoer/logistiek

5.1.2E merkt op dat De Leeuw, bij het zoeken naar een overslaglocatie, er rekening mee moet houden dat er iets gegund of geregeld moet worden.

5.1.2E merkt op dat De Leeuw op de hoogte is van vaarwegen en bruggen in verband met de logistiek.

7. Beperkt beschikbare werkruimte

Aan bomen mag niet worden gekapt en er mogen ook geen takken worden verwijderd.

Er mag op de werven geen opslag plaatshebben.

8. Planning

5.1.2E merkt op dat er een cruciale planning is. Eind oktober 2014 kan De Leeuw beschikken over de gracht en op 1 april 2015 moet het werk gereed zijn. De werkzaamheden moeten zijn afgerond voordat het vaarseizoen begint.

De Leeuw kan eerder starten dan 27 oktober, zolang er maar geen belemmering is voor de doorvaart.

5.1.2E geeft aan dat dit duidelijk is.

9. Toelichting op risicoanalyse planning

5.1.2E merkt op dat in de EMVI omschrijving een aantal dingen niet smart omschreven zijn. Hoe wordt namelijk bepaald dat de planning wordt gehaald, op welk moment wordt er bijgestuurd en van hoeveel meter per dag is uitgegaan.

5.1.2E geeft aan dat De Leeuw start op 27 oktober 2014 met de damwand en opschonen. Er moet 7,5 meter per dag worden gemaakt om op 1 april 2015 gereed te zijn.

5.1.2E vraagt of er al een type damwand is gekozen en of er voldoende damwand op voorraad is zodat De Leeuw kan starten.

Volgens 5.1.2E is het type damwand nog niet gekozen, maar er zijn wel contacten met leveranciers. De drukmachine kan worden aangepast op elk type damwand. Met de leveranciers is afgesproken dat voor de Kerst 2/3 van de damwanden moet worden geleverd, daarna de rest. De Leeuw heeft de zekerheid dat de damwanden op tijd worden geleverd.

5.1.2E wil weten op welk moment een tweede machine wordt bijgezet.

5.1.2E geeft aan dat De Leeuw tijdens de vakanties doorwerkt. Ook kunnen zij op zaterdagen werken en meerdere uren per dag. Mocht dit niet voldoende zijn dan is er nog de mogelijkheid om een tweede drukmachine in te zetten.

5.1.2E stelt voor om in de werkplanning een aantal monitoringspunten op te nemen.

5.1.2E merkt op dat tijdens de 4-wekelijkse bouwvergadering de planning moeten worden besproken.

Fidex Expertise gaat de monitoring voor De Leeuw doen; er worden continu trillings-, hoogte-, scheur- en geluidsmetingen gedaan.

5.1.2E vraagt of er direct wordt bijgestuurd wanneer de metingen de grenswaarden overschrijden.

5.1.2E geeft aan dat wanneer er een overschrijding is, er direct een mail wordt gestuurd naar de, door de gemeente, opgegeven personen en dat er direct actie wordt ondernomen door De Leeuw. Er kan op locatie een meter worden opgehangen.

De Leeuw schaft zelf de apparatuur aan, deze wordt niet gehuurd; hierdoor is de prijs lager.

Vastgesteld moet worden dat De Leeuw het voor deze prijs gaat doen.

10. Toelichting op risicoanalyse overlast omgeving

5.1.2E merkt op dat alle transporten over het water plaatsvinden en dat er zo veel mogelijk elektrische machines worden gebruikt in verband met de geluidsoverlast. Er worden vaste stroomaansluitingen gemaakt om te kunnen laden. De duwboot gaat volledig op accu's draaien. In eerste instantie wordt elektrisch geprobeerd. De Leeuw zal een elektrische aansluiting aanvragen, anders wordt met aggregaten gewerkt. De stroomaansluiting is hoofdzakelijk benodigd voor het 's nachts laden van de schepen, hiervoor is de meeste stroom nodig.

5.1.2E geeft aan dat geluidsoverlast van een aggregaat 's nachts problemen op kan leveren. De Leeuw moet hierin terughoudend zijn.

Het aggregaat mag niet in het talud worden geplaatst, dit is een Rijksmonument.

5.1.2E geeft aan dat er traforuimtes in een aantal werfkelders zijn.

11. Toelichting op besteksposten

5.1.2E merkt op dat er een brief naar De Leeuw is verstuurd over de kosten van het damwanddruken e.d. Ook was de RAW-bijdrage niet opgenomen.

5.1.2E geeft aan dat De Leeuw de werkzaamheden uit kan voeren voor dit bedrag.

12. Technische zaken

Het bestek is duidelijk voor De Leeuw.

13. Rondvraag

5.1.2E vraagt hoe het staat met de CO2-ambitie van De Leeuw.

5.1.2E geeft aan dat De Leeuw momenteel op 4 zit er dat er een analyse wordt uitgevoerd wanneer ze naar 5 gaan.

Actielijst

Nr.	Actie	Actieh.	Deadline	Status
1	Referentie bij Wedam + referentie De Helling opvragen en doorsturen naar 5.1.2E	5.1.2E		

Akkoord verslag verificatieoverleg d.d. 11 augustus 2014	Inclusief eventuele wijzigingen
Directie	Aannemer Gebroeders De Leeuw B.V.
Datum	Datum

Verificatiegesprek herstel wal- en kluis muren Kromme Nieuwegracht, besteknummer 15 SB 016



Datum : 2 december 2015
Fase : Verificatie
Projectnummer : 141.2142.04
Projectnaam : Herstel wal- en kluis muren Kromme Nieuwegracht

Afdeling:
Stadswerken

Plaats bespreking:
Koploperstraat, Natuur

Verslagnummer: 1

Opgesteld door:
5.1.2E

Datum bespreking:
2 december 2015

Verzenddatum:
4 december 2015

Aanwezig:

5.1.2E (5.1.2E)
5.1.2E (5.1.2E)
5.1.2E (5.1.2E)
5.1.2E (5.1.2E)
5.1.2E (5.1.2E)
5.1.2E (5.1.2E)

Van:

Gemeente Utrecht (SW)
Gemeente Utrecht (SW)
Gemeente Utrecht (SW)
Gemeente Utrecht (SI)
H. van Steenwijk b.v.
H. van Steenwijk b.v.

ACTIE DOOR NR. VERSLAG

1. Opening en mededelingen

5.1.2E opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Kennismaking/voorstelronde

- 5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht, Stedelijk Beheer:
Vormt als projectleider onderdeel van het directieteam.
- 5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht, Stadsingenieurs:
Heeft de technische voorbereiding gedaan en zal de directie UAV in dit project voorzien van technische adviezen.
- 5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht, Stedelijk Beheer:
Vormt onderdeel van het directieteam.
- 5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht, Stedelijk Beheer:
Vormt onderdeel van het directieteam.
- 5.1.2E (5.1.2E), H. van Steenwijk b.v.:
Directeur.
- 5.1.2E (5.1.2E), H. van Steenwijk b.v.:
Hoofd bedrijfsbureau.
- 5.1.2E (5.1.2E) notuliste in opdracht van de gemeente Utrecht.

3. Toelichting/inleiding

5.1.2E heeft de aannemer vooraf per e-mail geïnformeerd over een aantal van de punten die in dit overleg aan de orde zullen komen.

Na de aanbesteding zijn door de gemeente vragen gesteld aan een drietal aannemers over de gehanteerde prijzen. Gebleken is dat deze van de diensten van hetzelfde calculatiebureau gebruik hebben gemaakt met als resultaat dat de eenheidsprijzen vrijwel niet van elkaar verschillen.

Dit is voor de afdeling Concern Inkoop aanleiding geweest aan deze drie partijen, waaronder Van Steenwijk, aanvullende vragen te stellen die inmiddels afdoende beantwoord zijn.

Gemeente Utrecht heeft dan ook Van Steenwijk b.v. schriftelijk geïnformeerd

over de intentie de opdracht aan hen te verstrekken en voorlopige gunning verleend.

Eén van de andere inschrijvers heeft aangekondigd voornemens te zijn formeel bezwaar aan te tekenen. Om die reden is besloten de Alcatel-periode te verlengen tot 8 december 2015.

4. EMVI-dossier

5.1.2E deelt mee dat de aannemer met de ingediende reacties op de EMVI niet hoog gescoord heeft. Onvoldoende is naar voren gekomen dat de aannemer zich realiseert in welke complexe omstandigheden en omgeving de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wat de beperkingen als gevolg daarvan zijn.

5.1.2E merkt op dat, voor wat betreft de twee risico's die de aannemer kenbaar heeft gemaakt, de actie ('huiswerk') bij de opdrachtgever is neergelegd terwijl de bedoeling van een EMVI juist is risico's weg te nemen en een oplossing/beheersmaatregelen aan te bieden.

De door de aannemer onderkende risico's zijn:

- De conditie van de kademuur is slechter dan vooraf is vastgesteld.
- Bodemonderzoek komt niet overeen met de werkelijke bodemopbouw.

5.1.2E merkt ten aanzien hiervan op dat de suggesties van de aannemer niet zullen worden overgenomen. Hij is van mening dat de voorbereiding voldoende is geweest om het werk aan te gaan.

De concrete vraag aan de aannemer is of voldoende duidelijk is wat de risico's kunnen zijn, of er nog risico's voorzien worden en of daarop geanticipeerd wordt in het plan van aanpak.

De aannemer verklaart zich bewust te zijn van de omgeving waarin gewerkt moet worden. Zij hebben de locatie zorgvuldig bekeken en hebben ervaring in het uitvoeren van binnenstedelijke waterwerken onder vergelijkbare omstandigheden en beschikken over het daarvoor geijkte materieel.

Voorts stelt de aannemer dat het bestek voldoende duidelijkheid biedt om de mogelijke complicaties te overzien.

Aannemer

De werkplannen zullen op korte termijn en na formele gunning worden opgesteld; daarvoor is capaciteit gereserveerd.

De aannemer verklaart dat de leveringstermijn van de damwandplanken niet als risico beschouwd behoeft te worden omdat hierop geanticipeerd is.

De aannemer bevestigt over het benodigde materieel te beschikken. Dit is niet in eigendom van de aannemer maar de beschikbaarheid daarvan is wel zeker gesteld.

De aannemer geeft aan geen vragen te hebben naar aanleiding van het bestek en de tekeningen.

5. Inschrijfstaat

5.1.2E heeft aanvullende vragen over de volgende posten, nl.:

- Post 530010: Verwijderen pleisterwerk in de kelders.

Het bedrag van € 5.1.1C -- (eenheidsprijs € 940/m2) wordt als hoog ervaren.

Aannemer

De aannemer zal hierop terugkomen.

5.1.2E voegt toe dat de directie kan besluiten deze bestekspost te laten vervallen.

- Posten 111210, 111220 (met daaraan gerelateerd posten 112210 en 112220): Kosten voor aansluitingen, toepassen van een waterdichte aansluiting bouwkuip.

Het eenheidsbedrag van € 5.1.1C -- per aansluiting wordt als laag ervaren.

Aannemer

De aannemer zal hierop terugkomen.

5.1.2E merkt op dat de resultaatsverplichtingen voor het realiseren van de waterdichte aansluitingen in de besteksposten zijn omschreven, waarbij het

uitgangspunt is dat het werk voor dit bedrag wordt uitgevoerd, en dat de uitleg van de aannemer uitsluitend ter informatie dient.

- | | |
|-----------------|---|
| Directie | <p>6. Gunning
Zoals reeds gemeld, volgt formele gunning direct na het verstrijken van de Alcatel-periode op 8 december 2015.
Dit verslag zal, na goedkeuring daarvan door partijen, onderdeel van de opdracht vormen.</p> |
| Aannemer | <p>8. Planning
De contractuele uitvoeringsperiode is van januari tot en met december 2016.
De aannemer verklaart geen planningsproblemen te voorzien uitgaande van de doorlooptijden volgens de begroting en rekening houdend met de beoordelingstijd van de nog in te dienen werkplannen.</p> <p>De aannemer zegt toe bij het startoverleg een concept planning te zullen indienen.</p> <p><u>Communicatie</u>
5.1.2E geeft aan dat omstreeks eind januari 2016 een informatieavond voor omwonenden zal plaatsvinden. Daarvoor is het nodig te beschikken over een globale planning opdat inzicht kan worden gegeven in de overlast (toegankelijkheid/parkeermogelijkheden). Van de aannemer wordt tijdens deze avond ook een bijdrage verwacht in het geven van nadere toelichting en het behulpzaam zijn bij de beantwoording van vragen.
5.1.2E heeft de in de omgeving aanwezige bedrijven en scholen al informatief op de hoogte gebracht van de aanstaande werkzaamheden.</p> <p>8. Volgende vergadering (startoverleg)
Woensdag 16 december 2015 om 13.00 uur ten kantore van Stadswerken Utrecht, Koploperstraat 50/52. De vergaderlocatie wordt nader bekend gemaakt.</p> |

Voor akkoord:

Voor akkoord:

De directie
d.d. 16 december 2015

De aannemer
d.d. 16 december 2015

Stadswerken
Stedelijk Beheer Projecten
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 – 286 00 00
www.utrecht.nl



Aan fa. H. van Steenwijk B.V.
T.a.v. de directie
Spaarndammerdijk 661
1014AD Amsterdam

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 030 2864743
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)

Datum 14 december 2015
Ons kenmerk SW.15.512 942
Onderwerp Opdracht bestek 15.SB.016

Uw kenmerk n.v.t.
Uw brief van n.v.t.

Projectnummer 141.2142.04.50.091.0101
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte directie,

Hierbij draag ik u, conform uw inschrijving bij de openbare aanbesteding d.d. 8 oktober 2015 de werkzaamheden op voor het bestek 15.SB.016; Herstel wal- en kluisuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een maximaal bedrag van EUR 1.410.000,00 exclusief 21% BTW.

Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd alvorens deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Contactpersoon is de heer 5.1.2E telefonisch bereikbaar onder nummer 030 – 2864743.

De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie (art. 01 07 01) moet binnen 7 werkdagen na datum van de opdracht, met begeleidend schrijven, bij ons zijn binnengekomen.

Het verslag van het verificatieoverleg dat op 2 december j.l. met u is gehouden is van toepassing op de opdracht.

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in tweevoud in te dienen onder vermelding van:

- de heer 5.1.2E van de groep Projecten, Stedelijke Beheer, Stadswerken.
- Projectnummer: 141.2142.04.50.091.0101.
- Opdrachtnummer: 5700021749

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiële Dienstverlening
Postbus 10080 3505 AB Utrecht

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,

G. de Wit
Directeur Stadswerken

Stadsbedrijven
Stedelijk Beheer groep Projecten
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 – 286 00 00
www.utrecht.nl



Combi H. van Steenwijk en Van Halteren Infra
t.a.v. de directie
Spaarndammerdijk 661
1014 AD AMSTERDAM

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk bestek 16SB020
Uw brief van 30 augustus 2016

Datum 3 oktober 2016
Ons kenmerk SW16.507538
Onderwerp Opdracht "Wal en Kluismuren rak
17 t/m 20"
Projectnummer 141.2142
Verzonden 10 OKT. 2016
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte 5.1.2E,

Hierbij draag ik u, overeenkomend met uw prijsaanbieding d.d. 30 augustus en verificatiegesprek 21 september, volgens bestek 16SB020 t.b.v. het project wal en kluismuren rak 17 t/m 20 te Utrecht. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een maximaal bedrag van € 2.799.400,00 exclusief 21% BTW.

Eventuele meerwerkzaamheden dienen schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd alvorens deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie moet binnen 7 (zeven) werkdagen na datum van opdracht, met begeleidend schrijven, bij ons binnen zijn gekomen.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E van Stadsbedrijven, Stadsingenieurs

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- De heer C..Kars, Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.03.50.090.0101
- opdrachtnummer 57 00 02 27 34

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht, Financiële Dienstverlening
T.a.v. Dienst Stadsbedrijven
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

5.1.2E

Directeur Stadsbedrijven



Betreft : Paulusbrug
Van : 5.1.2E
Aan : 5.1.2E – DSB – Beleid Buitenruimte - Regie
Datum : 26 juli 1999
Afschrift aan :

Beste 5.1.2E,

Bijgaand ontvang je, als aanvulling op het procesverbaal van overdracht (verzonden 4 augustus 1998 en waarvan ik nog **geen** getekend exemplaar van retour heb ontvangen) de volgende stukken:


Revisiegegevens van de opzichter.

Attentie: diverse bijgesloten stukken zijn uniek, dus s.v.p. aandacht voor de archivering.


Met vriendelijke groet,

5.1.2E



5.1.2E

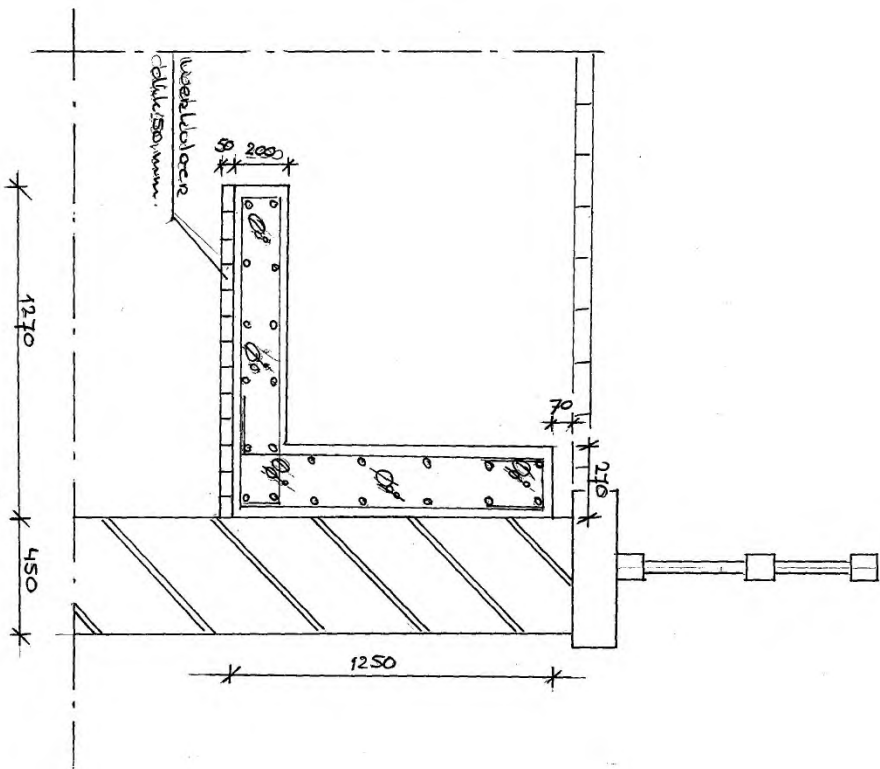


Doorsnede A
Schaal 1:20

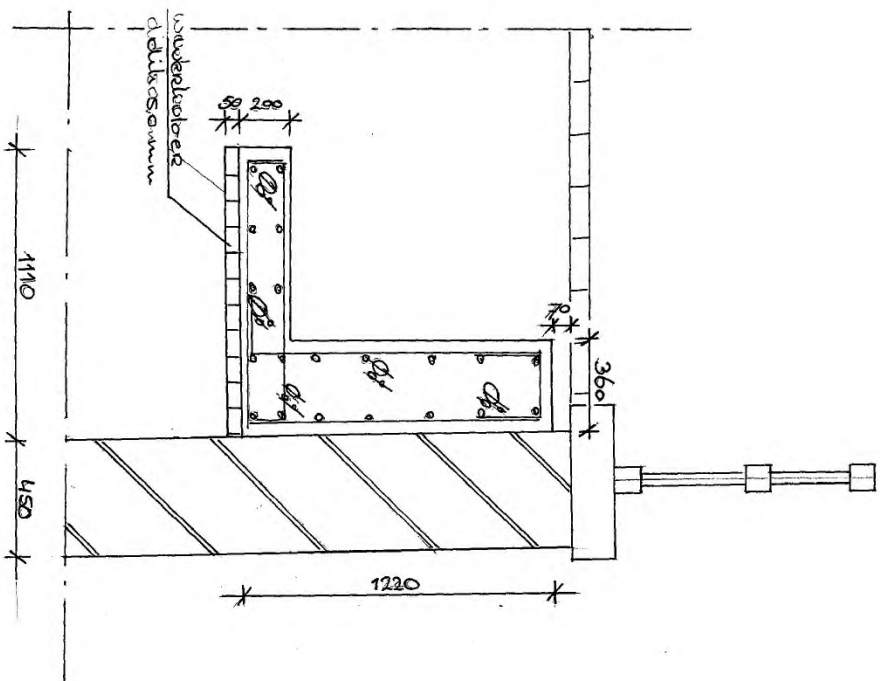



Doorsnede B
Schaal 1:20

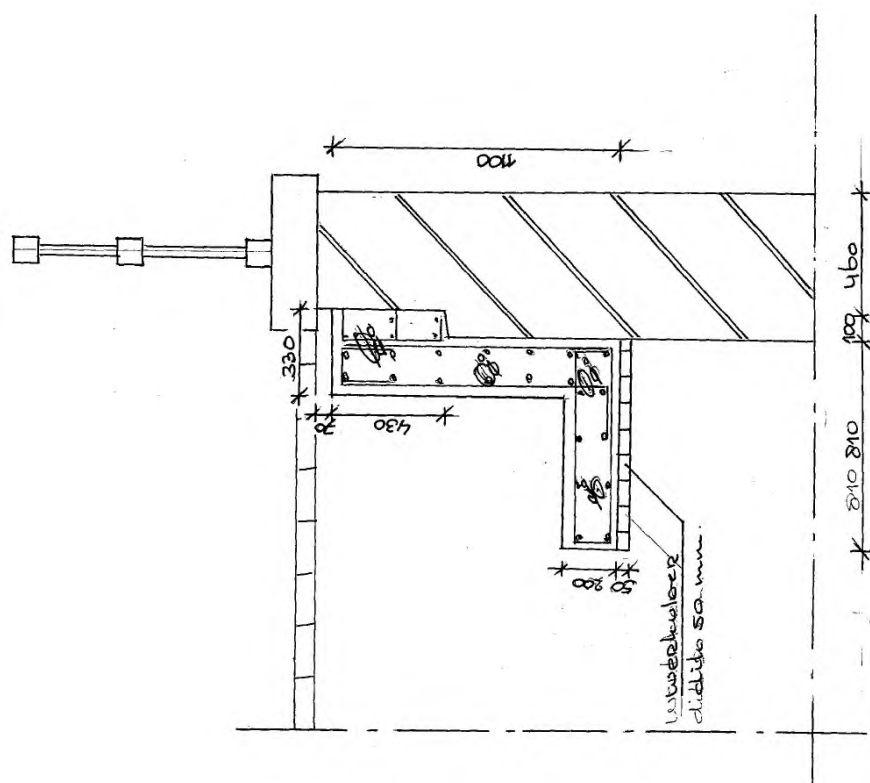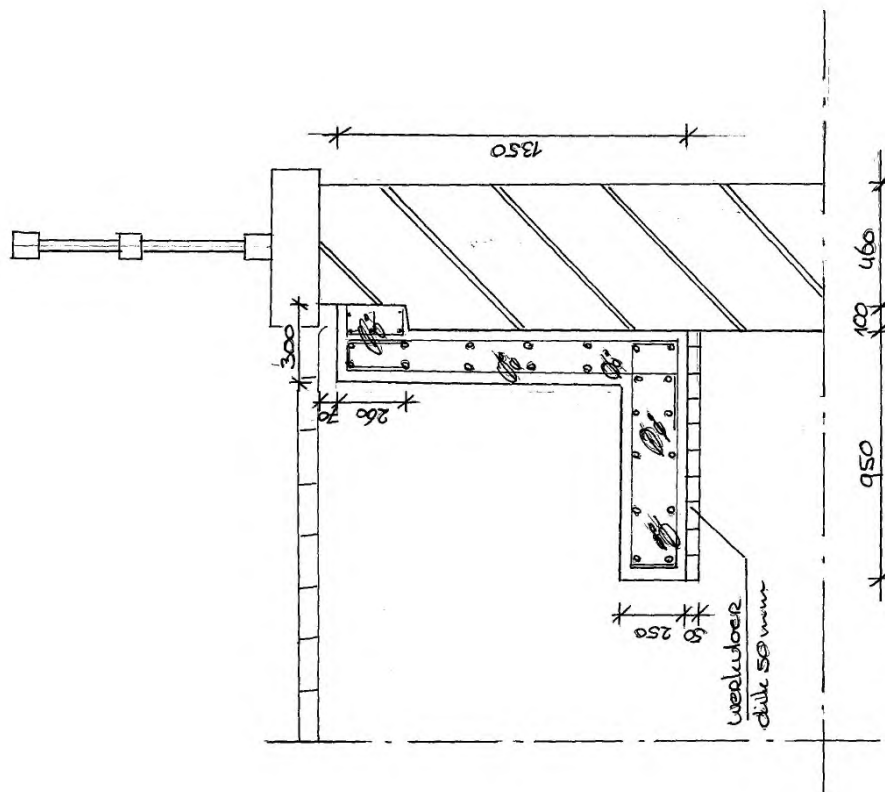

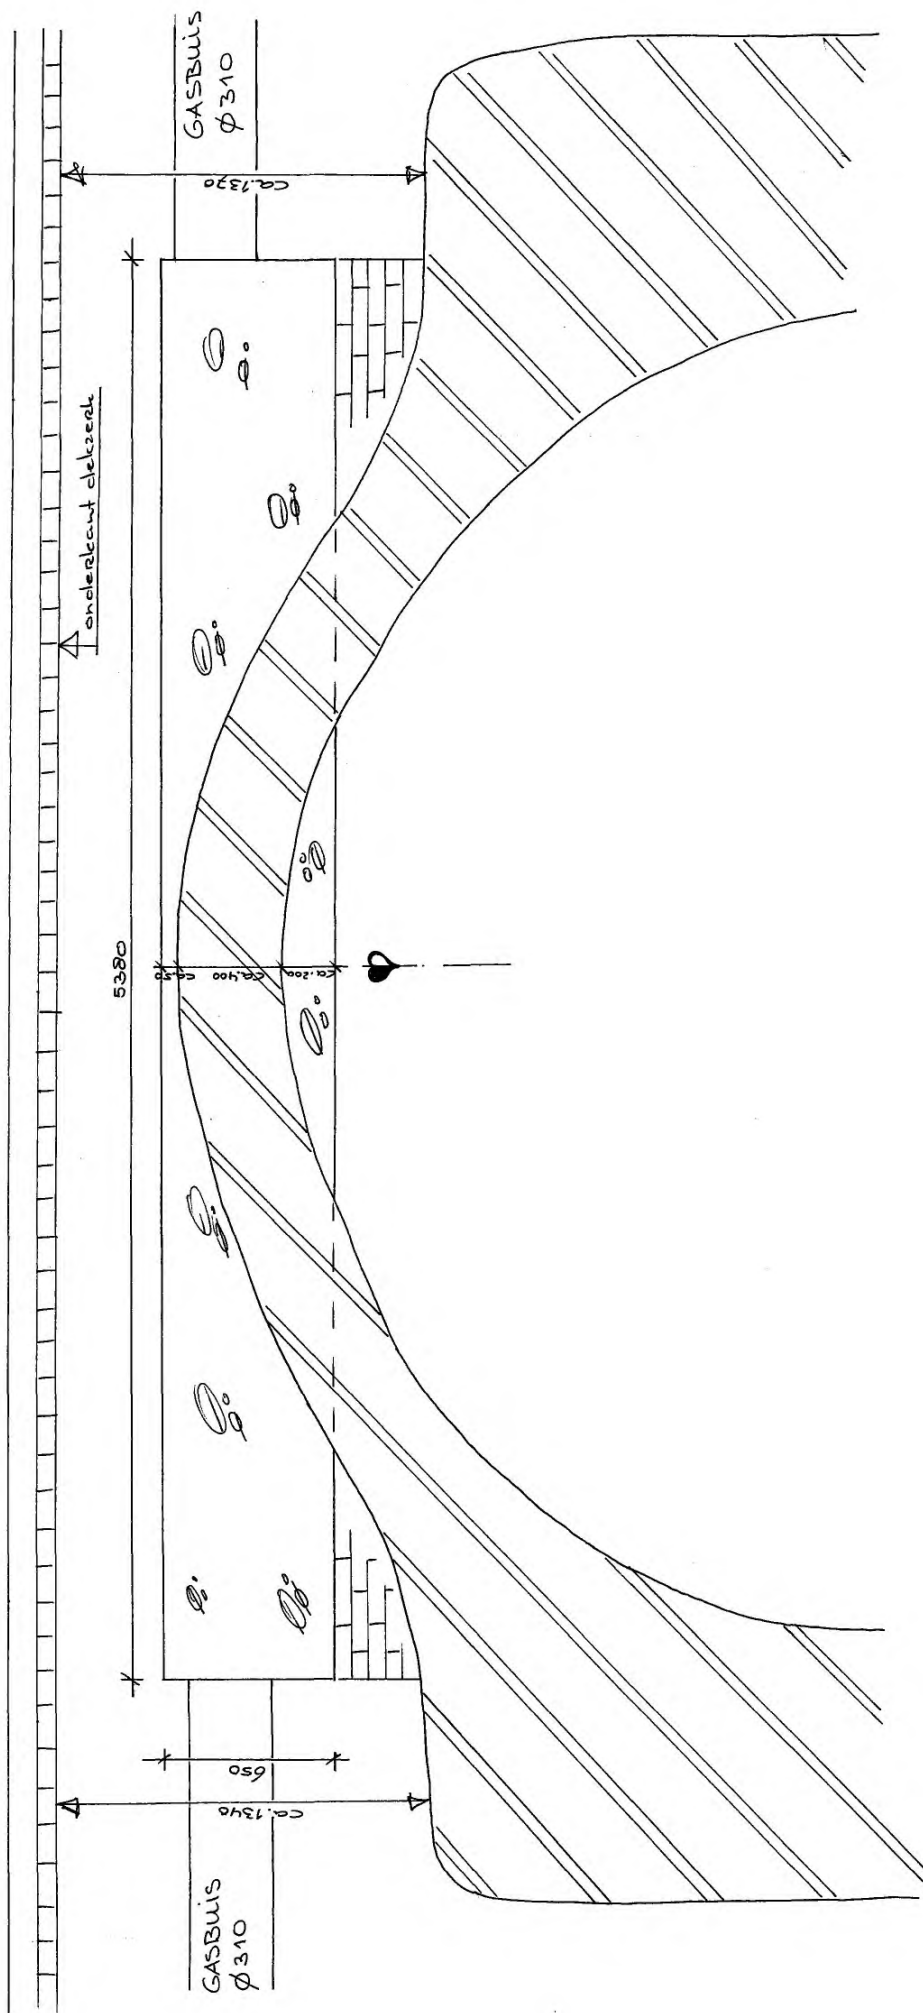


AANZICHT BETONNEN BAK DRS E-E

Schaal 1:1120

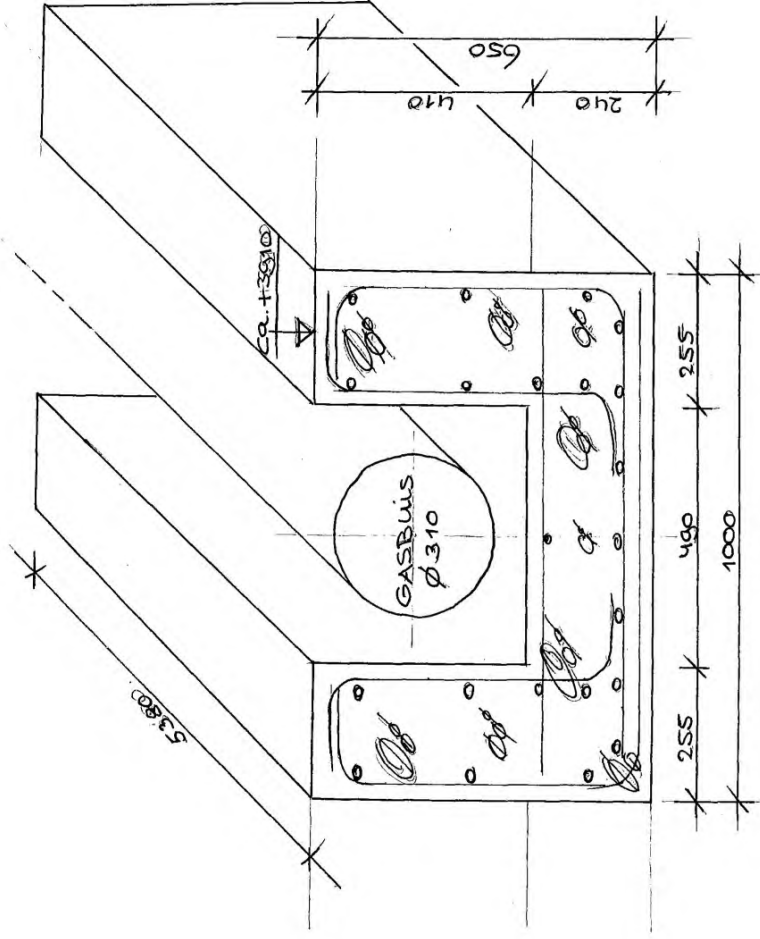

Betonnen bak Paulusberg school 1:10 DO 25-3-97

gebührenred. exp. Paulusbrunn

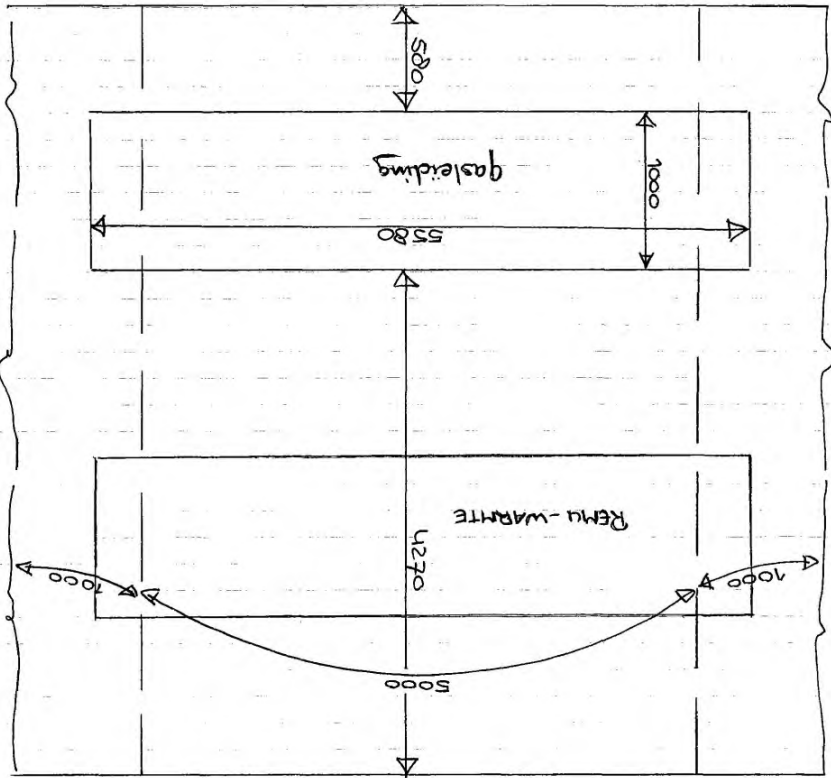


$$5,85 \times 7,00 \approx 40,95 \text{ m}^2$$

$$1,00 \times 5,58 \approx 5,58 -$$

$$\begin{array}{r} \text{Hor.} \\ \hline \pm 35,37 \text{ m}^2 \\ \text{VERT.} \\ \hline \pm 5,00 \text{ m}^2 \end{array}$$

Oplossing. Vraagwerk.

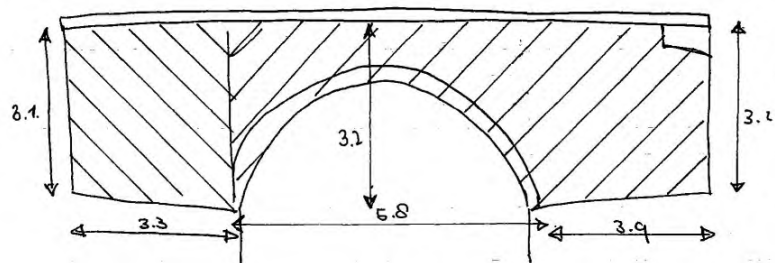



NOORDZIJDE

$$3.1 \times 3.3 = 10.23 \text{ m}^2$$

$$5.8 \times 3.2 = 18.56 \text{ m}^2 - 9.32 = 9.24 \text{ m}^2$$

$$3.9 \times 3.2 = 12.48 \text{ m}^2$$

TOTAAL NOORDZIJDE 31.95 m²

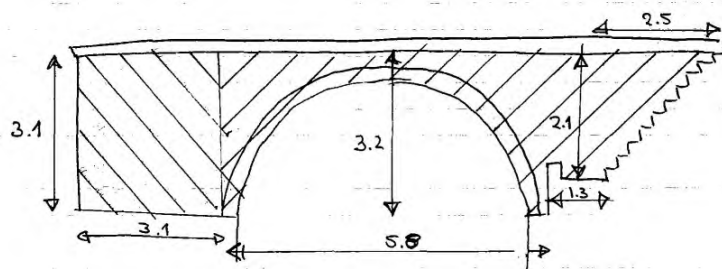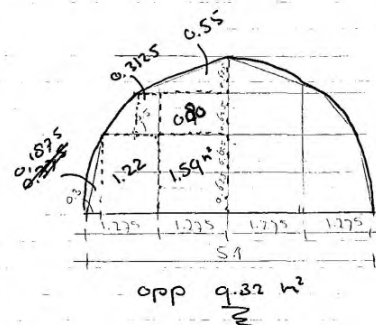

ZUIDZIJDE

$$3.1 \times 3.1 = 9.61 \text{ m}^2$$

$$5.8 \times 3.2 = 18.56 \text{ m}^2 - 9.32 = 9.24 \text{ m}^2$$

$$1.3 \times 2.1 = 2.73 \text{ m}^2$$

$$2.5 \times 2.1 \times 0.5 = 2.625 \text{ m}^2$$

TOTAAL ZUIDZIJDE 24.21 m²



Bespreekpunten verificatiebespreking 21-09-2016 aanbesteding Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Comb. H. Van Steenwijk / Van Halteren Infra – Gemeente Utrecht

De vragen zijn niet uitputtend.

Antwoorden op de vragen verwachten wij maandag 19 september 2016 op het mailadres van dhr 5.1.2E
5.1.2E 5.1.2E@utrecht.nl.

Vraag 1

Kunt u een nadere toelichting geven op de verdeling van het werk? Welke werkzaamheden worden uitgevoerd door respectievelijk H. Van Steenwijk BV, Van Halteren Infra BV en Gebr. Van 't Hek BV?

Antwoord:

*Van Steenwijk verzorgt o.a. het grondwerk, baggerwerk, straatwerk, betonwerk en metselwerk
Van Halteren verzorgt i.c.m. van 't Hek o.a. de damwanden, boorpalen en staalconstructies.*

Vraag 2

Kunt u voor de referentie van Gebr. Van 't Hek de (relevante) aantallen eenheden en tijdsduur van de werkzaamheden vermelden zoals gevraagd in de referentie-eis?

Antwoord:

Amsterdam, vervanging kade Damrak

Opdrachtgever: Heijmans Civiel BV

Aanneemsom: € 5.1.1C -

Uitvoering: 2013-2014

Datum opdracht: 05-09-2013

Opleverdatum: 19-12-2014

Voor het vervangen van de kade is in 2 fasen ca. **300m¹ damwand**, planklengte tot 20,5m¹ trillingsvrij ingedrukt. De damwandconstructie is middels groutankers verankerd.

Ter plaatse van de obstakels in de ondergrond is het damwandtracé voorgeboord.

Onder de kade zijn schroefinjectiepalen aangebracht om opdrijven te voorkomen.

Vraag 3

De referentie van Gebr. Van 't Hek betreft een tevredenheidsverklaring van hoofdaannemer Heijmans. In hoeverre is de opdrachtgever Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam tevreden over het uitvoeren van de werkzaamheden door Gebr. Van 't Hek als onderaannemer van Heijmans?

Antwoord:

Gemeente Amsterdam is tevreden over gebr. Van 't Hek, aangezien zij voor diverse aannemers worden goedgekeurd als onderaannemer. Project specifiek zijn de toets en acceptatie procedures naar tevredenheid verlopen en dit heeft geresulteerd in een tevredenheidsverklaring.

Vraag 4



In hoeverre heeft Gebr. Van 't Hek BV het aspect werken in binnenstedelijke omgeving gecoördineerd?
Wie gaat de rol van Heijmans in dit project vervullen?

Antwoord:

Gebr. Van 't Hek heeft in combinatie met de hoofdaannemer haar aandeel van de werkzaamheden gecoördineerd.

Omgeving management zal door Van Halten infra worden opgepakt.

Vraag 5

Welke werkwijze gaat u toepassen om de waterdichte aansluitingen op bestaand werk te maken?

(Bestekspostgroepen 1115, 1215, 2215, 3115, 3215, 4115 en 4215)

Houdt u hierbij rekening met:

- het eventueel na-injecteren t.g.v. mogelijke achter- en onderloopsheid?
- eventueel aanwezigheid van holle ruimte onder de rioolkoffer waardoor afdichting extra aandacht vraagt?

Antwoord:

Nader te bepalen conform bestekspost 801020 (tekening + berekening)

Wij houden rekening met de omschrijving conform de betreffende besteksposten.

Vraag 6

Hebt u de constructie van het stalen raamwerk bij de walmuur t.p.v. bomen goed op het netvlies? Heeft u voldoende rekening gehouden met het leverantie, samenstellen / laswerk en stellen/monteren?

(Bestekspost nrs. 115010 t/m 115310 en 315010 t/m 315310)

Kunt u deze werkzaamheden daadwerkelijk voor deze eenheidsprijzen uitvoeren?

Antwoord:

Ons antwoord is driemaal 'ja'.

Vraag 7

Heeft u bij de eenheidsprijs van de te leveren metselstenen in bestekspost 807110 rekening gehouden met het feit dat de gevraagde steen geen standaard productiesteen is?

Antwoord:

Ja, dat is ons bekend

Vraag 8

Hoe gaat u de maanden in het vaarseizoen zo goed mogelijk benutten binnen de beperkende randvoorwaarden die er opgelegd zijn voor werken gedurende het vaarseizoen?

Antwoord:

Voor de werkvoorbereiding zullen lean sessies worden uitgevoerd en deze uitkomsten zullen worden verwerkt in de werkplannen, hierin zal tevens worden bepaald welke werkzaamheden door kunnen gaan tijdens het vaarseizoen. Door een goede voorbereiding vooraf wordt een optimale werkstroom gecreëerd.

Vraag 9

In het bestek moet een groot aantal plannen ingediend te worden:

- algemeen tijdschema,
 - veiligheidsplan,
 - veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier,
- Diverse gedetailleerde werkplannen omvattende:
- plan van aanpak verontreinigde grond;
 - bemalingsplan;
 - werkplan baggerwerkzaamheden;
 - werkplan funderingswerkzaamheden;
 - werkplan aanbrengen onderwaterbeton (stortplan);
 - werkplan aanbrengen metsel- en voegwerk;
 - werkplan aanbrengen natuursteenwerk;
 - plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen;
 - plan voor het aanbrengen stalen onderdelen, lasplan

Al deze plannen zijn van groot belang voor de opdrachtgever om inzicht te krijgen in hoe u het werk denkt te gaan beheersen. Kunt u aangeven hoe u de opdrachtgever zo snel mogelijk gaat laten zien dat u de materie beheerst en doordacht te werk zult gaan?

Antwoord:

Wij zijn voornemens zo spoedig mogelijk na opdracht een Project Start Up (PSU) te organiseren waarbij we deze werkzaamheden zullen uitplannen in tijd en responstijden. De ervaring die wij inmiddels hebben opgedaan op de Kromme Nieuwe Gracht in Utrecht, zullen wij hiervoor als input gebruiken.

Vraag 10

De beperkingen die in de paragraaf 08 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE benoemd worden zijn zeer belangrijk voor de opdrachtgever. Hoe gaat u er voor zorgen dat hierover geen discussies en problemen ontstaan gedurende de werkzaamheden.

Antwoord:

Werkwijze wordt hier op afgestemd en vastgelegd in de betreffende werkplannen, komt ook terug in de PSU, zie vraag 9.
Paragraaf 8 is voor ons voldoende duidelijk omschreven.

Vraag 11

Wie stelt de berekeningen en tekeningen van alle nog nader uit te werken constructies op (bestekspost 801...) op en hoe zorgt u er voor dat deze tijdig goedgekeurd zijn?

Antwoord:

Eigen constructeurs (Hektec) i.c.m. gespecialiseerde (vaste) partijen (Walther Zwart, Nachenius Engineering)

Vraag 12

U dient uitvoeringsgerelateerde zaken met direct omwonenden te communiceren. (bestekspost 8020). Hoe gaat u dit organiseren dusdanig dat dergelijke zaken tijdig bekend zijn en daarmee geen onverwachte overlast zullen veroorzaken. Hoe gaat u deze communicatie met de communicatie-groep van de opdrachtgever delen?

Antwoord:



Gemeente Utrecht

Communicatie naar de omgeving doen wij middels één schrijven waarbij wij tevens de mensen uitnodigen voor een bewonersavond (vanuit de kromme Nieuwe Gracht organiseert de opdrachtgever deze) zodat er gelegenheid is mondeling vragen te behandelen en toe te lichten.

Vraag 13

Monitoring is een belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden en dan vooral het voorkomen van hinder en schade door tijdig acteren op alarmeringen. Hoe gaat de aannemer dit organiseren en welke maatregelen zou u op voorhand al kunnen noemen bij alarmeringen op ongewenste deformaties, trillingen en geluid?

Antwoord:

Wij organiseren dit volgens bestekspost 803010 t/m 803090. Mochten er afwijkingen optreden op de gestelde eisen, dan zullen wij in overleg met opdrachtgever treden en bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de overschrijdingen te beheersen.

Vraag 14

Welke aanvullende maatregelen denkt u te kunnen doorvoeren indien bij het boren van de gaten voor het aanbrengen van de stalen buispalen de boor steeds vastloopt of dat er teveel grof materiaal achterblijft waardoor de stalen buispalen niet aangebracht kunnen worden? Dit ook in relatie tot de beperkingen die er vanuit de monitoring kunnen ontstaan t.a.v. trillingen en geluidsoverlast.

Antwoord:

Het vastlopen voorkomen wij door het inzetten van de juiste boor en er op toezien dat de hele oude constructie wordt doorboord en verwijderd.

Vraag 15

Doet u uw aanbieding gestand?

Antwoord:

Ja.

From: "[REDACTED]" <[REDACTED]@utrecht.nl>
Sent: Tue, 27 Sep 2016 09:59:37 +0200
To: "[REDACTED]" <[REDACTED]@utrecht.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@utrecht.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@utrecht.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@utrecht.nl>
Subject: RE: Aanbesteding Nieuwegracht organisatiestructuur Van Halteren Infra

Beste [REDACTED]

In dit geval doet een T.Z. van Halteren Infra B.V. een beroep op de vakbekwaamheid van een van haar tantes (gebr. Van 't Hek B.V.). Dat is aanbestedingsrechtelijk toegestaan.

Voor de opdracht is de tante een onderaannemer van de combinatie. Dat is aanbestedingsrechtelijk geen enkel probleem. De inschrijving is juist gedaan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
aanbestedingsjurist

Gemeente Utrecht

Interne Bedrijven

ConcernInkoop

Postadres postbus 16200 3500 CE Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1 Utrecht

Telefoon [REDACTED]

E-mail [REDACTED]@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl

Aanwezig dinsdag, woensdag, donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 23 september 2016 13:20
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
Onderwerp: Aanbesteding Nieuwegracht organisatiestructuur [REDACTED]

Hallo [REDACTED]

Uit het verificatiegesprek kwam naar voren dat Van Halteren Infra een dochteronderneming is van de Van 't Hek groep BV.

Gebr. Van t' Hek fungeert als onderaannemer van hoofdaannemer Van Halteren Infra.

Is dit juridisch in orde?

Kan jij uit meegestuurd organogram van Van Halteren Infra en Gebr. Van 't Hek opmaken dat de inschrijving op de juiste wijze is gebeurd?

Kan je ons maandag uitsluitsel geven, dan verloopt de Alcateltermijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2E 5.1.2E
Projectvoorbereider

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Constructies en Bodem

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 5.1.2E

E-mail 5.1.2E @utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl

Aanwezig di t/m vr

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: 5.1.2E 5.1.2E @halteren.com]

Verzonden: vrijdag 23 september 2016 11:33

Aan: 5.1.2E ; 5.1.2E ; 5.1.2E

CC: 5.1.2E @hvsteenwijk.nl'; 5.1.2E [H.v. Steenwijk]

Onderwerp: Verificatiebespreking organisatiestructuur

Beste 5.1.2E 5.1.2E

Zoals mondeling besproken tijdens onze verificatiebespreking d.d. 21-09-2016 bijgaand een organogram ten aanzien van de structuur binnen de groep.

Volledigheidshalve meldt ik dat Van Halteren Infra een coördinerende functie heeft en dat de werkzaamheden t.b.v. de referentie worden uitgevoerd door Gebr. van 't Hek.

Mocht er om wat voor reden onduidelijkheid zijn dan zie ik uw vragen gaarne tegemoet.

Alvast een goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groet / Kind regards,



Zilvester van Halteren | *Directeur*

Energieweg 13a - 3751 LT Bunschoten - The Netherlands

5.1.2E [redacted]@halteren.com

tel 5.1.2E [redacted]

mob +31 (0) 6 5.1.2E [redacted]

Damwandprofessionals met innovatieve daadkracht

Denk alstublieft aan het milieu, voordat u deze e-mail print.

Email Disclaimer: www.vanhaltereninfra.nl/disclaimer.txt

Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht (rak 17 t/m 20)

Bijeenkomst	Verificatiegesprek	Verslag door	5.1.2E (5.1.2E), GU-SI
Besteknummer	06.SB.020	Datum verslag	26 september 2016
Datum	21 september 2016	Nummer verslag	V00
Tijdstip	08.30 – 10.00 uur	Verzonden aan	genodigden
Plaats	Stadskantoor gemeente Utrecht, 6 ^e etage kamer W41	Bijlage(n)	1: Bespreekpunten verificatiebespreking (vraag en antwoord)

Deelnemers

5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht-Stadsingenieurs
5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht-Stadsingenieurs
5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht-Stadsingenieurs
Gebko van den Boogaard (5.1.2E), H. van Steenwijk B.V.
Zilvester van Halteren (5.1.2E), Van Halteren Infra B.V.

Afwezig

5.1.2E (5.1.2E), gemeente Utrecht-Stadsingenieurs

Verslag

1. Opening, kennismaking/ voorstelronde en vaststellen agenda

5.1.2E opent het gesprek en heet de aanwezigen welkom. Agenda wordt door 5.1.2E verstrekt aan aanwezigen en vastgesteld. Er vindt een korte voorstelronde plaats:

Naam	Functie/ bedrijf	Contactgegevens
Gebko van den Boogaard	Directeur H. van Steenwijk B.V.	5.1.2E @hvsteenwijk.nl 5.1.2E
Zilvester van Halteren	Directeur Van Halteren Infra B.V.	5.1.2E @halteren.com 5.1.2E
5.1.2E	Technisch Projectleider Gemeente Utrecht – Stadsingenieurs	5.1.2E @utrecht.nl 5.1.2E
5.1.2E	Projectvoorbereider Gemeente Utrecht – Stadsingenieurs	5.1.2E @utrecht.nl 5.1.2E
5.1.2E	Ontwerpleider/ Adviseur Civiele Constructies Gemeente Utrecht – Stadsingenieurs	5.1.2E @utrecht.nl 5.1.2E
5.1.2E	Projectassistent Gemeente Utrecht – Stadsingenieurs	5.1.2E @utrecht.nl 5.1.2E

2. Procedure van verificatie

Na aanbesteding van het bestek 'Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht' met kenmerk 16.SB.020, is het werk voorlopig gegund aan de combinatie H. van Steenwijk B.V. en Van Halteren Infra B.V.

Dit verificatiegesprek vindt plaats in de Alcatelperiode en is bedoeld om vragen te stellen over de aanbidding van de inschrijver om na te gaan of de inschrijver de contractstukken juist geïnterpreteerd heeft. Tot definitieve gunning wordt overgegaan na verstrijken van de Alcatelperiode op 26 september 2016 en als door de opdrachtgever (gemeente Utrecht) is vastgesteld dat er geen onduidelijkheden (meer) bestaan naar aanleiding van de aanbidding.

Verslag van het verificatiegesprek wordt verzorgd door 5.1.2E gemeente Utrecht. Het verslag van het verificatiegesprek is onderdeel van het contract.

3. Doorspreken antwoorden op de gestelde vragen (zie bijlage)

Voorafgaand aan het verificatiegesprek is er op 15 september 2016 reeds een lijst met vragen over de inschrijving verstuurd aan de inschrijver. Document is via TenderNed en tevens via e-mail verzonden. De inschrijver heeft het document voorzien van antwoorden en het op 19 september 2016 per e-mail en via TenderNed aan de opdrachtgever verzonden. Op enkele antwoorden wordt tijdens dit gesprek een nadere toelichting gevraagd aan de inschrijver.

Bomen en boompassage

Vooruitlopend op het doornemen van de antwoorden benadrukt 5.1.2E dat er één zeer belangrijk onderwerp steeds een grote rol speelt op (bijna) alle rakken waar walmuurherstel plaatsvindt. Hij vraagt of de inschrijver een beeld heeft bij wat dit onderwerp is. GB antwoordt de krappe (werk)ruimte en de omgeving als belangrijkste aandachtspunten/ risico's in te schatten. 5.1.2E vertelt dat de bomen op de werven een zeer gevoelig punt zijn. Hij vraagt hoe de inschrijver zal borgen dat de bomen onbeschadigd of zo onbeschadigd mogelijk gepasseerd worden. Inschrijver geeft aan zeker rekening gehouden te hebben met boombeschermende maatregelen, maar niet uit de stukken te hebben kunnen destilleren dat de bomen het belangrijkste aandachtspunt betreffen (stonden op nummer 3). Op vraag van 5.1.2E antwoordt 5.1.2E dat de bomen weliswaar niet officieel de status monumentaal hebben, maar wel als zodanig beschouwd dienen te worden. Inschrijver beaamt het belang van een goede voorbereiding van de werkzaamheden, aandachtspunten die hierbij genoemd worden zijn werkhogtes en positie van het materieel ten opzichte van de te passeren bomen ook in hoogte gezien ten opzichte van de takken. Reeds als 'onmogelijk te passeren' aangeduide bomen zullen conform ontwerp van een frameconstructie voorzien worden. Daarnaast geeft 5.1.2E aan dat de uitvoerder die ingezet zal worden op het werk (5.1.2E) vorig jaar is opgeleid tot Flora- & Faunadeskundige. Afspraak: voorafgaand aan elke boompassage wordt de boomdeskundige van de gemeente Utrecht (5.1.2E) ingeschakeld om een inschatting te maken hoe de betreffende boom het beste met de voorgeschreven methode zo ongeschonden mogelijk gepasseerd kan worden.

5.1.2E vraagt of er in de zomermaanden een minimale vrije hoogte is voor de scheepvaart die moet worden aangehouden. Aangezien deze niet specifiek is voorgeschreven zou een onbeperkte hoogte uitgangspunt kunnen zijn. 5.1.2E geeft aan dat de hoogte van de boogbruggen als minimale hoogte aangehouden kan worden. De werkruimte hierboven wordt echter ook beperkt door met name de boomkronen.

De werkhogte tijdens de uitvoering in de winterperiode zal per locatie bepaald moeten worden en is ook weer met name afhankelijk van de bomen.

Aanvulling vraag 12

5.1.2E benadrukt het belang van een goede planning, ook in relatie tot de communicatie met de omgeving (tijdig communiceren en waarmaken wat er gecommuniceerd wordt). Alle communicatie-uitingen dienen in nauw overleg met de Omgevingsmanager (5.1.2E) en het communicatieteam van de gemeente Utrecht opgesteld te worden.

Aanvulling vraag 9

Inschrijver heeft aangegeven 'zo spoedig mogelijk' na gunning een PSU te organiseren. 5.1.2E vraagt inschrijver dit te concretiseren. Afgesproken wordt dat Van Steenwijk/ Van Halteren (actie V00.01) de PSU 1 week na definitieve gunning in zal plannen. 5.1.2E (actie V00.02) zal namen en contactgegevens (en evt. voorkeursdatum) van de personen die namens de opdrachtgever aan zullen sluiten doorgeven aan Van Steenwijk/ Van Halteren. 5.1.2E licht toe dat doel van de PSU is om open en transparant de wederzijdse wensen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

ZvH vraagt of er al zicht is op de datum van definitieve gunning. 5.1.2E en 5.1.2E benadrukken dat de opdrachtgever er alles aan gelegen is om de gewenste startdatum van 1 november 2016 te kunnen halen, maar hier nog geen definitief uitsluitsel over te kunnen geven. Datum van gunning is onder meer afhankelijk van:

- Alcateltermijn (verstrijkt 26/09/'16)
- Afwikkeling van het door een andere partij aangetekende bezwaar (ligt bij aanbestedingsjuristen, kan nog niets bericht worden over de uitkomst)
- Gunningsadvies SI aan interne opdrachtgever n.a.v. deze bijeenkomst

Aanvulling vraag 1

Op vraag van 5.1.2E om rol en taakverdeling van Van Halteren Infra en Gebr. Van 't Hek binnen het werk nader toe te lichten geeft 5.1.2E aan dat Van Halteren Infra een dochteronderneming is van Gebr. Van 't Hek. Juridische structuur/ organogram wordt deze week verstrekt aan gemeente door 5.1.2E (actie V00.03)

Aanvulling vraag 7

5.1.2E geeft aan de eenheidsprijs voor levering metselstenen aan de lage kant te vinden. Gevraagde steen vraagt een bakproces dat niet standaard is (i.v.m. eisen t.a.v. hardheid en wateropname) en niet elke bakkerij zal de steen kunnen leveren. 5.1.2E geeft aan dat dit bekend is en dat er een zeer deskundige medewerker op het gebied van metselstenen betrokken is/wordt bij dit project. Metselstenen zullen geleverd worden conform omschrijving in het contract.

4. Aanvullende vragen en opmerkingen

Planning / Werkvolgorde

5.1.2E vraagt of er een voorkeur is voor 'kort en hevig' of een langere doorlooptijd van de werkzaamheden. 5.1.2E antwoordt dat het aan de inschrijver is om een optimalisatie te zoeken in uitvoeringsplanning, binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden. In relatie tot de eis dat er in de zomerperiode een minimale doorvaartbreedte van 3,5 meter gehandhaafd dient te worden lijkt het uitvoeren van werkzaamheden in/ vanaf het water in de zomer niet mogelijk. Aanvullend wordt door 5.1.2E aangegeven:

- Rak 18 west: niet in het eerste jaar in planning opnemen. Momenteel wordt er in overleg met de afd. Erfgoed een nieuw ontwerp uitgewerkt voor de (instabiele) trap op rak 18. Tot ontwerp gereed is staat uitvoering rak 18 'on hold'.
- Rak 17: westzijde eerst uitvoeren i.v.m. aanbrengen frame voor 5 bomen op de oostzijde. Wordt niet dwingend voorgeschreven, maar inschrijver dient goed na te gaan wat mogelijk is ook i.r.t. in te zetten materieel.
- Opgenomen in bestek: watervergunning (onttrekken en lozen) wordt begin januari 2017 verleend. Bemalen mag pas starten na verlening van deze vergunning. Heeft geen consequenties voor het plaatsen van de bouwkuipdamwanden.
- Graafwerkzaamheden dienen tijdig (minimaal 7 weken van tevoren) gemeld te worden bij de gemeente i.v.m. BUS-meldingen die voorafgaand aan het graafwerk ingediend moeten worden.
- Planning aanleveren werkplannen dient in beeld te zijn tijdens PSU. Aannemer zegt dit toe.
- Einddatum opgenomen in het bestek is 1 april 2019. Aannemer acht dit haalbaar, ook op basis van 3x5 maanden werken in de winterperiode.

5.1.2E vraagt of de inschrijver al ideeën heeft over planning en werkvolgorde. 5.1.2E antwoordt dat dit het geval is en dat deze na gunning concreet gemaakt zullen worden. Wensen van beide partijen binnen de gegeven randvoorwaarden zullen pro-actief en transparant besproken worden.

Beperkte werkruimte

Inschrijver heeft eerder in dit gesprek (agendapunt 3, onder 'bomen en boompassage') aangegeven dit als één van de top-risico's/ aandachtspunten te beschouwen. 5.1.2E vraagt om nadere toelichting. Inschrijver antwoordt klein materieel in te zullen zetten. Ook het aandachtspunt m.b.t. rak 17 onder planning/ werkvolgorde wordt onderkend. Aanvullend wijst 5.1.2E de inschrijver op de volgende aandachtspunten:

- Bereikbaarheid vanaf straatniveau is beperkt. Daarnaast wordt gewezen op de aslastbeperkingen die gelden voor een groot gedeelte van de (bruggen) in de binnenstad. ZvH vraagt waarom er in de Nota van Inlichtingen is opgenomen dat de Pausdambrug niet langer als werkruimte/ aanvoerroute gebruikt mag worden. 5.1.2E antwoordt dat dit de maken heeft met het verplaatsen van het beeld van paus Adrianus VI naar die locatie i.v.m. werkzaamheden rak 21. Hij geeft aan dat de gemeente wel open staat voor overleg hierover, maar dat er nu geen toezeggingen gedaan kunnen worden over het elders plaatsen van het beeld en/ of het gebruik van de Pausdambrug.
- Aanvraag ontheffing om met niet-elektrische boten en tegen de vaarrichting in te mogen varen over de Nieuwegracht. Ontheffingen aan te vragen bij Frank van Kleef, Hoofd Havendienst gemeente Utrecht (5.1.2E utrecht.nl, 5.1.2E).

Huisaansluitingen riolering

5.1.2E geeft aan dat de locaties van de huisaansluitingen voorafgaand aan het boren opgezocht moeten worden. Dit ter voorkoming van beschadiging bij het boren van de gaten door de bestaande walmuurconstructie en het aanbrengen van de buispalen. 5.1.2E vraagt op welke hoogte de aansluitingen ongeveer door de bestaande constructie heen aangebracht zijn. 5.1.2E antwoordt dat dit verschilt, maar dat ze meestal net onder de bestaande constructie door lopen. 5.1.2E geeft aan dat in het bestek is opgenomen 'lokaliseren huisaansluitingen', maar er geen methode wordt voorgeschreven. Kan dit d.m.v. proefsleuven? 5.1.2E kan op verschillende manieren en noemt enkele voorbeelden. Hij verzoekt de

inschrijver de gekozen methode(n) op te nemen en toe te lichten in het werkplan. 5.1.2E geeft als aandachtspunt mee dat het niet overal mogelijk is om proefsleuven te graven i.v.m. boomwortels. Het wortelpakket, met name de steunwortels, mogen niet beschadigd worden.

Certificering CO₂-prestatieladder niveau 5

5.1.2E vraagt inschrijver wat de status is van genoemde certificering. 5.1.2E antwoordt dat dit geen probleem zal opleveren: proces loopt. Inschrijver bevestigt bekend te zijn met het boetesysteem opgenomen in de inschrijvingsleidraad m.b.t. EMVI-aspecten Social Return en CO₂-prestatieladder.

Werkplannen/ monitoringsplan

5.1.2E wijst inschrijver op het belang van goed uitgewerkte en onderbouwde werkplannen ook in relatie tot monitoring. ZvH vraagt naar het onderliggende zorg-/ aandachtspunt. 5.1.2E geeft aan dat de huizen en werfkelders wel monumentaal zijn. Daarnaast zijn de meeste panden op staal gefundeerd. Wanneer er niet zorgvuldig gewerkt wordt kan er echt serieuze schade ontstaan. Aannemer dient snel te kunnen schakelen en beheersmaatregelen achter de hand te hebben voor wanneer er alarmwaardeoverschrijdingen (dreigen) plaats te vinden. O-situatie t.b.v. monitoring moet voorafgaand aan het werk goed in beeld worden gebracht (incl. reeds bestaande schades).

5.1.2E vraagt of er op eerder uitgevoerde rakken problemen zijn ontstaan tijdens het voorboren van de gaten voor de buispalen. 5.1.2E vertelt dat deze methode over het algemeen goed werkt, er zijn tijdens de uitvoering wel enkele optimalisatieslagen gemaakt. Hij noemt als voorbeeld dat de vergruizende boor onder druk gezet wordt om 'springen' (en dus trillingen) te voorkomen. Ook komt het voor dat de boor vastloopt op vochtig, oude metselwerk. 5.1.2E geeft aan dat de gemeente geen methode voor zal schrijven, maar wel bereid is aandachtspunten te delen.

5. Rondvraag

5.1.2E In deel 3 van het bestek is opgenomen dat de mogelijkheid bestaat voor de aannemer om alternatieve voorstellen in te dienen, maar dat de directie zich te allen tijde het recht voorbehoudt om deze af te wijzen. Is dit bewust zo opgenomen in het bestek?

5.1.2E geeft aan dat dit inderdaad vrij dwingend voorgeschreven is. Ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente Utrecht. Project loopt al 10 jaar en er zijn op voorhand al heel wat alternatieven onderzocht. Aannemer is vrij om alternatieven in te dienen, directie is zeker bereid om toe te lichten waarom een eventueel alternatief (niet) toegepast mag worden, maar behoudt zich ook het recht een voorstel zonder toelichting af te wijzen.

5.1.2E vraagt of de constructieberekeningen (D-sheet files) gelijk bij opdrachtverstrekking aangeleverd kunnen worden. Dit om snel aan te kunnen vangen met het opstellen van de werkplannen. 5.1.2E (actie V00.04) zegt toe deze z.s.m. te verstrekken, kan ook al voorafgaand aan definitieve gunning.

6. Vaststellen actielijst

Acties worden samengevat en actielijst wordt vastgesteld.

7. Sluiting verificatiegesprek

5.1.2E sluit het gesprek en bedankt aanwezigen voor hun deelname.

Actielijst *Gereedgemelde acties worden grijs gemarkeerd en in het eerstvolgende verslag verwijderd.*

Nr.	Actie	Actiehouder	Status/ deadline
V00.01	Inplannen PSU .	Aannemer	1 wk na def. gunning
V00.02	Aanleveren namen/ contactgegevens/ voorkeursdatum uit te nodigen deelnemers PSU gemeente.	5.1.2E	Samen met definitieve gunning.
V00.03	Juridische structuur/ organogram Van Halteren Infra/ Van 't Hek verstrekken aan gemeente.	5.1.2E	Week 39
V00.04	Verstrekken constructieberekeningen aan aannemer	5.1.2E	Week 39

From: "Gebko van den Boogaard [H.v. Steenwijk]" <5.1.2E@hvsteenwijk.nl>
Sent: Wed, 28 Sep 2016 16:27:13 +0200
To: "5.1.2E" <5.1.2E@utrecht.nl>
Cc: "5.1.2E@halteren.com" <5.1.2E@halteren.com>
Subject: RE: Verslag verificatieoverleg 16 SB 020

Goedemiddag 5.1.2E

Zilvester en ik hebben het verslag doorgenomen en hebben verder geen opmerkingen of toevoegingen op het verslag. Ik ga ervan uit dat deze mededeling zo voldoende is. In afwachting zie ik de opdracht graag tegemoet.!

Met vriendelijke groeten,

Gebko van den Boogaard
H.v. Steenwijk b.v.

020 5.1.2E / 5.1.2E
7 020 6827255
Spaarndammerdijk 661, 1014 AD AMSTERDAM
5.1.2E @hvsteenwijk.nl
www.hvsteenwijk.nl



De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontleen aan de inhoud van deze e-mail.

Van: 5.1.2E [5.1.2E@utrecht.nl]
Verzonden: woensdag 28 september 2016 15:18
Aan: Gebko van den Boogaard [H.v. Steenwijk] <5.1.2E@hvsteenwijk.nl>; 5.1.2E@halteren.com' <5.1.2E@halteren.com>
Onderwerp: RE: Verslag verificatieoverleg 16 SB 020

Beste Gebko en Zilvester,

Hebben jullie nog op of aanmerkingen op het verslag van het verificatieoverleg? Zo ja dan graag vandaag nog jullie reactie. Zo nee dan ook graag even een mail dat jullie verder geen opmerkingen hebben. Dit verslag hoeven we niet apart af te tekenen (ik haal de handtekeningen voor akkoord er af), omdat dit verslag als bijlage aan de overeenkomst wordt toegevoegd.

Ik hoor graag vandaag nog even van jullie.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2E 5.1.2E
5.1.2E

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Constructies en Bodem

Postadres Postbus 8375

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 8e etage N

Telefoon 5.1.2E

E-mail 5.1.2E@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl

Aanwezig maandag t/m vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: 5.1.2E

Verzonden: maandag 26 september 2016 14:04

Aan: 5.1.2E; 5.1.2E; 5.1.2E; 5.1.2E; 5.1.2E@hvsteenwijk.nl;
5.1.2E@halteren.com'

Onderwerp: Verslag verificatieoverleg 16 SB 020

Beste heren,

Bijgaand het verslag van het verificatieoverleg 'Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht' incl. bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2E 5.1.2E

5.1.2E

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Stadsingenieurs

Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 8e etage

Telefoon 5.1.2E

E-mail 5.1.2E@utrecht.nl

Internet www.utrecht.nl/Stadsingenieurs

Aanwezig dinsdag t/m vrijdag

5.1,1C

5.1,2E



Gebr. de Leeuw B.V.

Beurtvaartweg 8
4906 CN Oosterhout

Postbus 138
4900 AC Oosterhout

Telefoon: (0162) 426884

www.gebrdeleeuw.nl
info@gebrdeleeuw.nl

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven / Stadsingenieurs
De heer 5.1.2E
Oudegracht aan de werf 387
3511 AZ Utrecht

Ons kenmerk: 18060/01/01
Onderwerp: KNG Rak 21B

20-07-2018

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij doen wij u toekomen, een indicatieve begroting betreffende het herstellen van kelders en kluisuren aan de Kromme Nieuwegracht in de gemeente Utrecht, alsmede een tarievenlijst.

- De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van regieprijzen volgens bijgevoegde tarievenlijst (bijlage 01)
- Tevens zenden wij u ter indicatie een begroting m.b.t. het herstellen van kelders en kluisuren aan de Kromme Nieuwegracht rak 21B te Utrecht.

Van toepassing zijn de volgende algemene voorwaarden:

- De Uniforme Admistratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken (UAV 2012)

Vertrouwende u hiermede een passend voorstel te hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,

Gebr. de Leeuw B.V.
Oosterhout
C.K. (Mark) de Leeuw

5.1.2E



Regieprijzen 2018



Omschrijving	Prijs	Eenheid
Rupskraan (1500 liter)	€ 5.1,1C	uur
Mobiele kraan (1000 liter)	€	uur
Mobiele kraan (500 liter)	€	uur
Midigraver 3,5 ton	€	uur
Midigraver 5,5 ton	€	uur
Transport	€	st
Laadschop (2000 liter)	€	uur
Laadschop (300 liter)	€	uur
Werkschip incl. schipper	€	uur
Hybride duwboot	€	uur
Drijvende boorstelling incl. 2 man bediening	€	uur
Beunbak	€	dag
Hydr. Sloophamer	€	uur
Hydr. Sloop/sorteergrijper	€ 5.1,2E	uur
Hydr. Steentrommel / Schudbak	€	uur
Zelf rijdende veegbezem	€	uur
Hydr. stenen/bandenkleem	€	uur
Hydr. Betonfrees	€ 5.1,1C	uur
Auto oprijwagen 12 ton	€	uur
Auto 6x6 wide spread met afzet installatie	€	uur
Auto met laadkraan	€	uur
Auto 8*8 tridem	€	uur
Dieplader	€	uur
Tracktor met grondtumper 12 m3	€	uur
Tracktor met waterwagen 10 m3	€	uur
Electrisch transportmiddel 5 ton	€	uur
Electrische kruiwagen 350 liter	€	dag
Aluminium loopbrug 6 m1	€	dag
Pick-up bus, excl. Bediening	€	uur
Trilplaat excl. bediening (slagkracht 6 ton)	€	uur



Regieprijzen 2018



Omschrijving	Prijs	Eenheid
Trilplaat excl. bediening (slagkracht 3 ton)	€ 5.1,1C	uur
Wackerstamper excl. Bediening	€	uur
Compressor excl. Bediening	€	uur
Schudzeef excl. Transport / bediening incl. diesel	€	dag
Klokpomp 18m3	€	uur
Klokpomp 160m3 incl. niveau apparatuur	€	uur
Aggregaat 5 kva, incl. onderhoud	€	uur
Aggregaat 40 kva, incl. onderhoud	€	uur
Vierduims diesel pomp	€	uur
Vierduims dieselpomp geluid gedempt en vlotter	€	uur
Drieduims dieselpomp geluid gedempt en vlotter	€	uur
Tweeduims diesel pomp	€	uur
Riool afsluiter 200/400	€	dag
Riool afsluiter 400/600	€	dag
Riool afsluiter 600/1000	€	dag
Riool afsluiter 1000/1500	€	dag
Schrikhek	€	dag
Geleidebaken	€	dag
Bouwhek incl.klem (excl aanbrengen)	€	m1/dg
Kunstof loopschotten 2m1 * 0,8m1	€	dag
Zagen, boren van asfalt of beton (min tarief)	€	euro
Grondwerker	€ 5.1,1C	uur
Stratenmaker	€	uur
Opperman	€	uur
Metselaar	€	uur
Uitvoerder	€	uur
Monteur	€	uur
Revisie	€	st
KLIC melding (MAX 100 aansluiting per melding)	€	st

Gebr. De Leeuw B.V.
t.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 138
4900 AC OOSTERHOUT

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)

Uw kenmerk 18095
Uw brief van 8 november 2018

Datum 22 november 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/1811221031-es
Onderwerp Opdracht voor herstelwerkzaamheden
aan de kelders en kluisuren in de
Kromme Nieuwegracht rak 21B
Projectnummer 141.2266
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw prijsaanbieding met bovengenoemd kenmerk d.d. 8 november 2018, de herstelwerkzaamheden op aan de kelders en kluisuren in de Kromme Nieuwegracht rak 21B te Utrecht.

Op deze opdracht is de U.A.V. 2012 van toepassing.
Voorwaarden van andere partijen worden bij deze uitdrukkelijk verworpen.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van regie met een plafond bedrag van € 553.186,00 exclusief 21% btw.
Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersonen zijn aangewezen de heren 5.1.2E (uitvoering) en 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E en 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2266
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/1811221031-es

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht – Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via 5.1.2E@utrecht.nl

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 – 286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E


Y.A.J. Kokx
Directeur Stadsbedrijven

Gebr. De Leeuw B.V.
t.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 138
4900 AC OOSTERHOUT

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n) Zie onderaan deze brief
Uw kenmerk n.v.t.
Uw brief van n.v.t.

Datum 24 oktober 2019
Ons kenmerk SBSI/4123544/1910170843-mb
Onderwerp Uitnodiging aanbesteding opschonen
watergang KNG rak 21B
Projectnummer 141.2266
Verzonden 24 oktober 2019
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E 5.1.2E

Hierbij nodig ik u uit om een offerte uit te brengen voor het volgende onderwerp: het opschonen van de watergang ter plaatse van rak 21B van de Kromme Nieuwegracht te Utrecht. Rak 21B betreft het gedeelte van de Kromme Nieuwegracht tussen Jeruzalemstraat en Hieronymusplantsoen. Ten tijde van de uitvoering van eerdere werkzaamheden op dit rak (bestek 15 SB 016) zijn er 'blowoutvoorzieningen' aangebracht in de gracht. Deze dienen nu verwijderd te worden.

Ik verzoek u deze offerte uit te brengen als omschreven in deze offerteaanvraag en in overeenstemming met de bijbehorende bijlagen. Bij de offerte dient een lijst van alle te hanteren tarieven te worden gevoegd.

Het werk bestaat uit:

- Verwijderen en afvoeren losliggend bouwpuin van zandpakket blowoutvoorziening;
- Handmatig ontgraven en afvoeren van de bovenste 10 cm van het zandpakket uit de blowoutvoorziening;
- Verwijderen en afvoeren houten constructie blowoutvoorziening;
- Verwerken zandpakket uit blowoutvoorziening door zeef op grachtbodem tot 0,70 meter – NAP, binnen werkgebied conform afbeelding in bijlage 3. Hierbij eventueel vrijkomende groutresten en ander bouwpuin afvoeren;
- Eventueel overgebleven zand dat niet verwerkt kan worden op de waterbodem afvoeren;
- Stalen blowoutbak verwijderen en afvoeren (foto's blowoutbak reeds aangeleverd per e-mail door 5.1.2E op 14 oktober 2019 12:36 uur);
- 6 stuks houten vlonders terugbrengen op aanwijzing directievoerder U.A.V. (zie foto bijlage 4 ter info);
- In stand houden x, y, z-monitoring gedurende bovengenoemde werkzaamheden en aanbrengen 2 trillingsmeters. E.e.a. conform monitoringsplan Fides Expertise dat momenteel wordt opgesteld op basis van het monitoringsvoorstel van Fides Expertise d.d. 13 oktober 2019 (zie bijlage 5).

Het productcertificaat van het in de blowoutvoorziening toegepaste zand (bijlage 6) en het uitgevoerde bodemonderzoek t.b.v. vaststellen aanwezigheid PFAS in het zandpakket in de blowoutvoorziening (bijlage 7) zijn bij deze offerteaanvraag gevoegd.

Alle vrijkomende materialen geschikt voor hergebruik vervallen aan de aannemer, met uitzondering van de uitkomende grond die moet worden toegepast binnen het werkgebied.

Alle bij het werk vrijgekomen materialen, niet geschikt voor hergebruik in een toepassing binnen de werkgrens dienen door de aannemer te worden afgevoerd naar erkende bewerkings-, verwerkings- of eind-verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Acceptatie, verwerkings- en/of stortkosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer toont de overdracht van het vrijgekomen materiaal aan door een bewijs van ontvangst van de betreffende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting aan de Directievoerder U.A.V. te verstrekken.

Social Return

De gemeente investeert samen met haar opdrachtnemers in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. Een van de instrumenten om dit te doen is Social Return. Social Return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren.

Bij deze aanbesteding dient 5% van de opdrachtsom ingezet te worden voor Social Return. Zie voor meer informatie <https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/aan-het-werk/social-return>.

1. AANPAK EN PLANNING VAN DE OFFERTEPROCEDURE

De contactpersonen voor dit inkoopproject zijn de heren ^{5.1.2E} (Contractmanager) en ^{5.1.2E} ^{5.1.2E} (Directievoerder U.A.V.), bereikbaar via resp. ^{5.1.2E} @utrecht.nl en ^{5.1.2E} @utrecht.nl.

Informatieronde

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze offerteaanvraag, dan kunt u deze per e-mail zenden aan de hierboven genoemde contactpersonen. De uiterste datum voor het indienen van uw vragen is opgenomen in de planning (zie hieronder). De vragen en de daarop gegeven antwoorden vormen een integraal onderdeel van deze offerteaanvraag.

Indienen offerte

Graag ontvang ik uw offerte uiterlijk op de datum die in de planning is opgenomen. Dit is een uiterste datum. U kunt uw offerte per e-mail zenden naar bovenstaand contactpersoon.

Planning

Voor het offertetraject en de uitvoering van de opdracht heb ik de volgende planning opgesteld:

Versturen offerteaanvraag	24-10-2019
Deadline indienen vragen informatieronde	25-10-2019
Beantwoorden vragen informatieronde	25-10-2019
Deadline indienen offerte	28-10-2019
Voorgenomen opdrachtverstrekking	29-10-2019
Definitieve opdrachtverstrekking	31-10-2019
Startdatum uitvoeren opdracht	01-11-2019
Opdracht gereed	06-12-2019 (m.u.v. terugbrengen vlonders; deze uitvoeren na afronding werkzaamheden in de watergang t.b.v. kelders 68-1 en 68-2, maar uiterlijk gereed 30-10-2020)

2. EISEN EN BEPALINGEN BIJ DE OFFERTE EN DE OPDRACHT

Gestanddoeningstermijn

Uw offerte heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 90 dagen na de datum waarop u de offerte uiterlijk moet indienen. Tijdens deze periode heeft uw offerte het karakter van een onherroepelijk aanbod.

Betalingswijze

U stemt in met: 4-wekelijkse betaling van de uitgevoerde werkzaamheden per 4 weken achteraf.

Verrekening van de gemaakte kosten vindt plaats op basis van regie. De vergoeding voor de opdracht wordt bepaald op basis van bestede tijd en de in uw offerte genoemde (uur)tarieven. In deze tarieven zijn alle met de opdracht gemoeide kosten verdisconteerd. Voornoemde tarieven/bedragen kunnen niet tussentijds worden geïndexeerd of anderszins door u worden aangepast.

Algemene Voorwaarden

Op deze opdracht zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) van toepassing. Een exemplaar van de UAV 2012 vindt u als bijlage bij deze offerteaanvraag. Algemene voorwaarden van uw organisatie worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Integriteit

Indien u zich inschrijft op onderhavige aanbesteding, dan verklaart u dat uw onderneming of personen uit haar bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings- of beslissingsbevoegdheid hebben, op het moment van inschrijven in de afgelopen vijf jaar niet onherroepelijk zijn veroordeeld door een rechterlijke uitspraak voor de volgende zaken: deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld, terroristische misdrijven of strafbare feiten i.v.m. terroristische activiteiten. Ook verklaart u dat uw onderneming de afgelopen vijf jaar niet met een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing is veroordeeld omdat uw onderneming niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies. Als veroordelingen als hiervoor bedoeld vallen in ieder geval veroordelingen op grond van artikel 134a-140, 140a, 177, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, 273f, 285, derde lid, 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht, of veroordelingen wegens overtreding van de in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde misdrijven, indien aan het bepaalde in dat artikel is voldaan.

Contractuele voorwaarden

De gemeente Utrecht zal uw offerte bekijken en besluiten om al dan niet over te gaan tot opdrachtverstrekking. Bij opdrachtverstrekking zal de gemeente Utrecht met uw organisatie een overeenkomst aangaan op basis van de bijgevoegde opdrachtbrief. Met het indienen van een offerte gaat u akkoord met de inhoud van deze opdrachtbrief.

Stadsbedrijven

Beheer Openbare Ruimte & Gebouwen

Datum 24 oktober 2019

Ons kenmerk SBSI/4123544/1910170843-mb



Ik zie uw offerte met veel belangstelling tegemoet. Indien u geen offerte wilt uitbrengen, verneem ik dat graag van u op korte termijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht,
namens dezen,

5.1.2E

A. Kröp
Directeur Stadsbedrijven

Bijlagen:

1. UAV 2012
2. 20191024 CPT Opdrachtbrief enkelvoudig onderhands Werken_opschonen watergang rak 21B
3. Overzicht ophogen waterbodem KNG RAK21B
4. 20170516_134701 foto vlonders
5. 20192689 def. monitoringvoorstel herstel kelder 68 KNG
6. 2016-01-01 certificaat BRL 9313 ZW-006-6
7. WKM Rak 21 Briefrapport onderzoek PFAS

Gebr. De Leeuw B.V.
t.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 138
4900 AC OOSTERHOUT

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n) geen
Uw kenmerk 19106.01
Uw offerte van 28 oktober 2019

Datum 31 oktober 2019
Ons kenmerk SBSI/4123544/1910171105-mb
Onderwerp Opdracht opschonen watergang KNG rak
21B
Projectnummer 141.2266
Verzonden 31 oktober 2019
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E 5.1.2E

Hierbij geven wij u opdracht voor de uitvoering van het opschonen van de watergang ter plaatse van rak 21B van de Kromme Nieuwegracht te Utrecht. Deze overeenkomst (hierna: Overeenkomst) bevat de randvoorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

Contractdocumenten

De navolgende documenten zijn onderdeel van onderhavige Overeenkomst. In geval van strijdigheid geldt de hierna genoemde rangorde, waarbij een hoger geplaatst document prevaleert ten opzichte van een lager geplaatst document:

1. Deze Overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen;
2. De offerteaanvraag d.d. 24 oktober 2019 met kenmerk SBSI/4123544/1910170843-mb (hierna: Offerteaanvraag);
3. Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012)
4. Uw offerte (hierna: Offerte).

Omschrijving werkzaamheden

De door u uit te voeren werkzaamheden staan beschreven in deze Overeenkomst, waaronder ook onder meer de Offerteaanvraag valt.

U voert de Overeenkomst tijdig uit en conform de overeengekomen condities en kwalificaties als vastgelegd in deze Overeenkomst inclusief bijbehorende documenten.

Het gehele werk zal uiterlijk worden opgeleverd op 06-12-2019 (m.u.v. terugbrengen houten vlonders; deze werkzaamheden uitvoeren na gereedkomen werkzaamheden in de watergang t.b.v. kelders 68-1 en 68-2, maar uiterlijk gereed 30-10-2020).

Prijs en betaling

Verrekening van de gemaakte kosten vindt plaats op basis van regie. Voor deze opdracht geldt een maximum vergoeding van €180.500,00 exclusief btw. De vergoeding voor de opdracht wordt bepaald op basis van bestede tijd en de in uw offerte genoemde (uur)tarieven. In deze tarieven zijn alle met de opdracht gemoeide kosten verdisconteerd. Voornoemde tarieven/bedragen kunnen niet tussentijds worden geïndexeerd of anderszins door u worden aangepast.

Facturering van de gemaakte kosten vangt aan bij de start van de uitvoering en vindt plaats middels indiening van 4-wekelijkse termijnen die gelijke tred houden met de stand van de reeds verrichte en gereed zijnde werkzaamheden op de bouwplaats.

De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door u ter goedkeuring aan de Directievoerder U.A.V. worden voorgelegd alvorens deze in te dienen.

Algemene voorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) van toepassing. Een exemplaar van de UAV 2012 heeft u reeds ontvangen bij de Offerteaanvraag. Algemene voorwaarden van uw organisatie worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Normering, wet- en regelgeving

Als er voor de uitvoering van de Overeenkomst vergunningen, ontheffingen of toestemmingen van overheidswege noodzakelijk zijn, vraagt u deze aan.

Wet- en regelgeving

U houdt zich in de uitvoering van de Overeenkomst aan de geldende arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao. U vrijwaart de gemeente Utrecht tegen alle aanspraken ter zake, waaronder aanspraken op grond van de ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht. U vrijwaart de gemeente Utrecht van alle aanspraken ter zake. U bent aansprakelijk voor eventuele boetes die de gemeente Utrecht krijgt opgelegd door de niet nakoming door u van de hiervoor genoemde verplichtingen.

U legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. Indien de gemeente Utrecht het vermoeden heeft dat de hieraan niet voldoet geeft u desgevraagd aan de gemeente Utrecht inzicht in de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt u mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente Utrecht. U legt de verplichtingen genoemde in deze paragraaf 'wet- en regelgeving' onverkort op aan de derden waarmee u overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Op verzoek van de gemeente Utrecht verschaft u aan (een vertegenwoordiger van) een vakbond toegang tot de bouwplaats. De gemeente Utrecht kan voorwaarden verbinden aan deze toegang.

Directievoering

5.1.2E [REDACTED] wordt aangesteld als Directievoerder U.A.V. en kan de gemeente Utrecht vertegenwoordigen in alle zaken die het onderhavige werk betreffen.

De gemeente Utrecht aanvaardt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, geen verantwoordelijkheid voor door derden gegeven aanwijzingen, gemaakte wijzigingen, geplaatste (meerwerk)opdrachten en dergelijke.

Facturen

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in pdf-format, via 5.1.2E@utrecht.nl.

Op de factuur vermeldt u:

- De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder:
naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN-nummer en BIC-gegevens, btw-nummer, KvK-nummer;
- Uw unieke factuurnummer;
- De factuurdatum;
- Omschrijving van het uitgevoerde werk;
- Uw factuuradres;
- Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw;
- Het door de gemeente afgegeven bestelnummer. Dit wordt separaat per e-mail aan u verstrekt.
Op de factuur staat altijd maar één bestelnummer;
- 5.1.2E@utrecht.nl Stadsbedrijven, Stadsingenieurs;
- Projectnummer: 141.2266.xx.xx.xxx.xxx. Het volledige, op de facturen te vermelden projectnummer wordt samen met het bestelnummer separaat per e-mail aan u verstrekt.
- Kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/1910171105-mb
- Bij een creditfactuur vermeldt Contractant het factuurnummer en het bestelnummer van de corresponderende debetfactuur.

Indien een factuur niet voldoet aan bovenstaande eisen, zoals een verkeerd bestelnummer of het ontbreken van een bestelnummer, kan de gemeente deze factuur weigeren en gaat zij dus niet tot betaling over. Als de gemeente de factuur weigert, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade door u geleden.

De gemeente Utrecht hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur die voldoet aan de eisen zoals hierboven genoemd.

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 -286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

Aanpassingen Overeenkomst

Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen om een vervangende bepaling overeen te komen, zodanig dat de strekking van deze Overeenkomst zoveel mogelijk behouden blijft. Aanpassingen van de Overeenkomst op grond van voornoemd overleg en op grond van regelgeving zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid leiden voor partijen.

Voortzetting overeenkomst

Indien u in staat van faillissement bent geraakt, besluit tot ontbinding of surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag, gevolgd door vanwaardeverklaring, gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van uw bedrijfsvoering (welk beslag een belemmering kan vormen voor de uitvoering en de nakoming van de overeenkomst), of de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van aandelen, heeft de gemeente Utrecht het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen. Als een andere partij in uw positie wenst te treden na faillissement, ontbinding of wijziging van de rechtspersoon, dan heeft de gemeente Utrecht het recht de overeenkomst met die andere partij voort te zetten.

Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze



overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. Wij verwachten u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze Overeenkomst, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze Overeenkomst. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht,
namens dezen,

5.1.2E

A.M. Kröp
Directeur Stadsbedrijven

Gebr. De Leeuw B.V.
t.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 138
4900 AC OOSTERHOUT

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n) geen
Uw kenmerk werknummers 20033 en 19105
Uw prijsopgaven d.d. 20 en 23 maart 2020

Datum 01 april 2020
Ons kenmerk SBSI/4123544/202004011108-mb
Onderwerp Scopeuitbreiding herstel KNG kelder 68 met herstel walmuur sectie 6
Projectnummer 141.2266
Verzonden 10 april 2020
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E 5.1.2E

Hierbij dragen wij u de werkzaamheden op voor 'Herstel walmuur sectie 6' ter plaatse van rak 21B aan de Kromme Nieuwegracht te Utrecht. Werkzaamheden betreffen een uitbreiding van de scope van het eerder met u overeengekomen werk 'Herstel Kromme Nieuwegracht kelder 68' zoals vastgelegd in de Aannemingsovereenkomst d.d. 09 december 2019, contractnummer 2019-SB-069.

Ophoging richtprijs

Zoals op 31 maart 2020 reeds per e-mail aan u gemeld door onze Contractmanager (de heer 5.1.2E) verhogen wij in verband met de aan sectie 6 uit te voeren werkzaamheden de richtprijs van bovengenoemde Aannemingsovereenkomst 'Herstel KNG kelder 68' met een bedrag van € 269.093,55 exclusief btw. Dit conform het totaal van uw prijsopgaven d.d. 20 maart 2020 (meerwerk sectie 6) en 23 maart 2020 (minderwerk sectie 6), met bovengenoemde kenmerken.

De totale richtprijs voor het werk 'Herstel Kromme Nieuwegracht kelder 68' komt daarmee op € 1.211.628,55 exclusief btw. Verrekening van de gemaakte kosten vindt plaats op basis van regie.

Wijziging uiterlijke opleverdatum

De uiterlijke opleverdatum van het werk wordt met de toevoeging van sectie 6 aan de scope van het werk gewijzigd van 18 september 2020 naar 02 oktober 2020.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht,
namens dezen,

A. Krop
Directeur Stadsbedrijven

From: "[5.1.2E]" <[5.1.2E]@utrecht.nl> on behalf of "Krop, Anneke" <a.krop@utrecht.nl>
Sent: Fri, 10 Apr 2020 09:27:42 +0200
To: "[5.1.2E]@gebrdeleeuw.nl" <[5.1.2E]@gebrdeleeuw.nl>
Cc: "[5.1.2E]" <[5.1.2E]@utrecht.nl>; "[5.1.2E]" <[5.1.2E]@utrecht.nl>; "[5.1.2E]" <[5.1.2E]@utrecht.nl>
Subject: Opdrachtbrief m.b.t. de uitbreiding van de scope met sectie 6 van het contract "KNG Rak 21B; Herstel kelder 68
Attachments: 20200401 Scopeuitbreiding KNG sectie 6_DEF.pdf

Geachte heer [5.1.2E] [5.1.2E]

Hierbij zend ik u de opdrachtbrief m.b.t. de uitbreiding van de scope met sectie 6 van het contract "KNG Rak 21B; Herstel kelder 68".
In verband met corona ben ik nu niet in de gelegenheid deze brief 'nat' te ondertekenen.
Daarom is mijn verzoek aan u om dit mailbericht te beschouwen als de ondertekening van deze opdrachtbrief.
Zodra de mogelijkheid weer daar is, zal ik deze brief alsnog voorzien van mijn handtekening.

Hoogachtend,

A.M. Krop
Directeur Stadsbedrijven

post	onderdeel	eenheid	aantal	uren	uurtarief	materiaalkosten	sub tot	Opmerkingen
20	Kromme Nieuwegracht 56, sectie 20:							
20.01	Vervangen gebroken spuyer;	st	1	2	€	5.1,1C		metselaar
20.02	Terugplaatsten deel van de rollaag en leuning en herstel metselwerk;	m ¹	4	60	€			metselaar
20.03	vervangen voegwerk platvol;	m ²	6	16	€			metselaar
20.04	Metsel en voegwerk op wind waterlijn nalopen en repareren,	m ²	4	6	€			duikploeg
20.05	Verwijderen van groutresten op gevel boven de waterlijn	post	1	8	€			waterstralen o.i.d.
20.06	Verwijderen houten plaat onder waterlijn t.h.v. uitstroom;	st	1	2	€			duikploeg
19	Kromme Nieuwegracht 58, sectie 19							
19.01	Vervangen gebroken spuyer;	st	1	2	€			metselaar
19.02	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	24	€			waterstralen o.i.d.
19.03	Vervangen voegwerk platvol	m ²	7,5	16	€			metselaar
19.04	Metsel en voegwerk op wind waterlijn nalopen en repareren	m ²	3	4	€			duikploeg
18	Kromme Nieuwegracht 58, kelder 58 sectie 18B;							
18.01	Inboeten metselwerk	m ²	1	8	€			metselaar
18.02	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	8	€			waterstralen o.i.d.
18.03	Vervangen voegwerk platvol	m ²	4	8	€			metselaar
17	Kromme Nieuwegracht 60, kelder 60 sectie 18A en 17;							
17.01	Montagegaten van totall station dichtzetten met mortel op kleur;	post	1	3	€			metselaar
17.02	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	8	€			waterstralen o.i.d.
17.03	Vervangen voegwerk platvol	m ²	2	4	€			metselaar
17.04	Verwijderen houten plaat onder waterlijn t.h.v. uitstroom;	st	1	2	€			duikploeg
16	Kromme Nieuwegracht 62, kelder 62 1 sectie 16;							
16.01	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	4	€			waterstralen o.i.d.
16.02	Vervangen voegwerk platvol ca 3,5m ² ;	m ²	3,5	8	€			metselaar
16.03	Verwijderen houten plaat onder waterlijn t.h.v. uitstroom;	st	1	2	€			duikploeg
15	Kromme Nieuwegracht 62, sectie 15 en 14;							
15.01	Verwijderen groutresten op gevel boven water	post	1	8	€	5.1,1C		waterstralen o.i.d.
15.02	Vervangen voegwerk platvol	m ²	20	24	€			metselaar
15.03	Gietijzeren pijp verwijderen uit metselwerk (is loos)	st	1	8	€			metselaar
15.04	Inboeten locatie rond verwijderde pijp	post	1	4	€			metselaar
14	Brug Daltonschool;							
14.01	Reinigen om onderhoud te bepalen	post	1	8	€			hogedrukspuit
14.02	Voegwerk (ingeschat)	m ²	2,5	8	€			metselaar
13	Kromme Nieuwegracht 62-2, sectie 13;							
13.01	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	8	€			waterstralen o.i.d.
13.02	Vervangen voegwerk knip/snijvoeg	m ²	25	40	€			hans baars
13.03	Vervangen gebroken spuyer;	st	1	2	€			metselaar
12	Kromme Nieuwegracht 66, Brug B7;							
12.01	Verwijderen afgekapte warmteleidingen;	post	1	8	€			metselaar
12.02	Inboeten metselwerk onder brugliggers	m ²	3	24	€			metselaar
12.03	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	8	€			waterstralen o.i.d.
12.04	Vervangen voegwerk platvol	m ²	2	4	€			metselaar
11	Kromme Nieuwegracht 66, kelder 64 (voormalig) sectie 11;							
11.01	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	24	€	5.1,1C		waterstralen o.i.d.
11.02	Vervangen voegwerk platvol circa	m ²	3	8	€			metselaar
11.03	Rollaag ligt mogelijk los, tenminste voegwerk	m ²	3	4	€			metselaar
11.04	Inboet metselwerk bij deuropening	m ²	1	8	€			metselaar
11.05	Uitboren ankers in metselwerk en repareren gaten;	post	1	16	€			metselaar
10	Kromme Nieuwegracht 66, tussenmuur sectie 10;							
10.01	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	8	€			waterstralen o.i.d.
10.02	Rollaag ligt mogelijk los, tenminste voegwerk	m ¹	4	4	€			metselaar
9	Kromme Nieuwegracht 66, kelder 66 1 sectie 09;							
09.01	Verwijderen groutresten op gevel boven water;	post	1	4	€			waterstralen o.i.d.
09.02	Vervangen voegwerk platvol	m ²	2	6	€			metselaar
09.03	Rollaag ligt mogelijk los, tenminste voegwerk	m ¹	3	4	€			metselaar
9.1	Kromme Nieuwegracht 66, kelder 66 2 sectie 09;							
09.11	Vervangen voegwerk platvol	m ¹	1	4	€			metselaar
8	Kromme Nieuwegracht 66, kelder 66 3 sectie 09 en 08B;							
08.01	Rollaag op waterniveau inboeten of helemaal vervangen	m ¹	8	20	€			metselaar
08.02	Stucen gewelf voorportaal voor kelder;	post	1	10	€			hans baars
08.03	Vloer voorportaal verwijderen en bestraten met gebakken klinkers	m ¹	2	16	€			grondwerker/stratenmaker
08.04	Vervangen voegwerk platvol	m ²	3	8	€			metselaar

7 Balusters (23 stuks herstel)					5.1.1C	
07.01	breuk basis van baluster herstellen	st	4	12	€	nans baars
07.02	natuursteen vastzetten	st	1	4	€	nans baars
07.03	baluster vastzetten in natuursteen	st	17	4	€	nans baars
07.04	gebroken baluster vervangen / herstellen	st	1	8	€	nans baars
6 Brug B5						
06.01	herstel betonrot / blootliggende wapening	post	1	60	€	metselaar
06.02	inpoetsen grindnesten	post	1	30	€	metselaar
06.03	herstel oppervlakkige betonschades	post	1	30	€	metselaar
5 OVERIG						
05.01	gereedschap					
05.02	klein materiaal					
05.03	materieel, steiger, werkboot, midigraver, transport	post				
05.04	parkeerkosten	weekprijs		8	€	
4 ALGEMEEN						
04.01	projectleider	week	8	16	€	
04.02	uitvoerder	week	8	24	€	
04.03	winst	post				
TOTAAL AANNEMER						
3 Aanvullende technische zaken					5.1.1C	
03.01	Onderzoek Normec Reilux - Baluster testen (reeds uitgevoerd)				€	
03.02	post te gebruiken voor tegenslagen / onvoorziene technische zaken	post	10%		€	
2 Onvoorzien					€	
02.01	Post voor het opvangen van mogelijk overschrijding van hoeveelheden	post	10%		€	
1 Begeleidingskosten SI					€	
01.01	Normale VAT percentage is 25% hier is echter reeds toezicht aanwezig vandaar 10% hier zitten ook uren voor opname, afstemming en aanbesteding in.	post	10%		€	
0 TOTAAL SCOPE					€	91.304,51

Gebr. De Leeuw B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 138
4900 AC OOSTERHOUT

Behandeld door	5.1.2E	Datum	6 juli 2020
Doorkiesnummer	5.1.2E	Ons kenmerk	SBSI/4123544/2007061000-es
E-mail	5.1.2E@utrecht.nl	Onderwerp	Aanvullende opdracht voor 'Onderhoudswerk rak 21B'
Bijlage(n)	1	Projectnummer	141.2266.01.50.090.0105
Uw kenmerk	Werknummers 20033 en 19105	Verzonden	
Uw prijsopgaven	d.d. 27 mei (i.o.m. 5.1.2E)		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

5.1.2E heer 5.1.2E 5.1.2E

Hierbij dragen wij u de werkzaamheden op voor 'Onderhoudswerk rak 21B' aan de Kromme Nieuwegracht te Utrecht. Werkzaamheden betreffen een aanvullende opdracht op het eerder met u overeengekomen werk 'Herstel Kromme Nieuwegracht kelder 68' zoals vastgelegd in de Aannemingsovereenkomst d.d. 09 december 2019, contractnummer 2019-SB-069. Op deze aanvullende opdracht zijn de voorwaarden uit voornoemd contract 2019-SB-069 van toepassing.

Prijs

Zoals op 27 mei 2020 met u besproken door de heer 5.1.2E (directievoerder) is de richtprijs voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, waarvan de aard en hoeveelheden zo goed mogelijk bepaald en omschreven zijn in de bijlage 1, € 67.355,00 (zegge, zevenenzestigduizend driehonderdvijfenvijftig euro).

Verrekening van de gemaakte kosten vindt plaats op basis van regie, gelijk de werkwijze voor de hoofdprijs met contractnummer 2019-SB-069. Er zal u een opdrachtnummer verstrekt worden.

Uiterlijke opleverdatum

De uiterlijke opleverdatum van dit werk is 2 oktober 2020, net als het werk met contractnummer 2019-SB-069, inclusief scope uitbreiding 'sectie 6'.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

J. Bron
gedelegeerd opdrachtgever gemeente Utrecht.

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk AFW01
Uw brief van 26 maart 2021

Datum 8 april 2021
Ons kenmerk SBSI/2104080908-es
Onderwerp Opdracht voor uitvoeren deformatie-
metingen rak 6 west
Projectnummer 141.2393.06.40.001.9902
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij verlenen wij u opdracht voor het uitvoeren van deformatiemetingen op rak 6 west voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 15.928,56 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2393.06.40.001.9902
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Dit vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/2104080908-es

en deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Datum 8 april 2021

Ons kenmerk SBSI/2104080908-es

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl


Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 - 286 10 10 (optie 4).

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

**Heijnen,
AnneBeth**

Ing. A.E.M. Heijnen
Hoofd Projectmanagement Stadsingenieurs

 Digitaal ondertekend door
Heijnen, AnneBeth
Datum: 2021.04.08
11:45:12 +02'00'

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)

Uw kenmerk
Uw inschrijftaat van 9 april 2021

Datum 16 april 2021
Ons kenmerk SBSI/2104161051-es
Onderwerp Opdracht voor werkzaamheden
rak 6 west - noodmaatregel
Projectnummer 141.2393.06.50.003.0102
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw inschrijftaat d.d. 9 april 2021, de werkzaamheden op voor de Reconstructie lage walmuren Oudegracht Utrecht Rak 6 West – optionele werkzaamheden voor het project "Reconstructie wal- en kluismuren Oudegracht" te Utrecht. Het betreft specifiek de werkzaamheden betreffende de zogenaamde noodmaatregel, genaamd "Herstel lage walmuren Oudegracht, rak 6 westzijde, Bouwkuip".

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 194.413,78 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Uw werkzaamheden dienen aan te vangen op 15-04-2021 (uw voorbereidende werkzaamheden zijn, in overleg, reeds gestart per 05-04-2021) en de oplevering dient plaats te vinden op 21-05-2021, conform uw planning "Detail 6 West voor stremmingen.pdf", zoals door uw heer 5.1.2E per mail d.d. 08-04-2021 geleverd aan mevrouw 5.1.2E en de heer 5.1.2E van de gemeente Utrecht.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs.
- Projectnummer: 141.2393.06.50.003.0102
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- Kenmerk van deze brief: SBSI/2104161051-es

Datum 16 april 2021

Ons kenmerk SBSI/2104161051-es

En deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht – Financiën

Postbus 10080

3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in pdf-format, via factuur@utrecht.nl.

De overeenkomstig het bestek 142 SW 012 vereiste bankgarantie blijft van kracht zolang de werkzaamheden die in de optieregeling opgenomen zijn, in uitvoering zijn. U dient binnen 7 werkdagen na verstrekken van deze opdracht aan te tonen dat deze bankgarantie nog geldig is.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

5.1.2E

5.1.2E

Wervengebied

Beens Groep B.V.

De heer 5.1.2E

Postbus 6

8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)

Uw kenmerk

Uw brief van

Datum 7 oktober 2021
Ons kenmerk SBSI/2110071021-es
Onderwerp Start uitvoering reconstructie lage
walmuren Oudegracht Utrecht –
rak 2 oost
Projectnummer 141.2393.05.07.003.0102
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Zoals reeds met u besproken tijdens de bouwvergaderingen nummers 83 en 84, respectievelijk d.d. 31-08-2021 en 05-10-2021, en zoals vastgelegd per mail aan u d.d. 07-09-2021 door onze heer E.C. Horsten, kunt u starten met de werkzaamheden voor reconstructie lage walmuren Oudegracht Utrecht rak 2 Oost per 01-10-2021. De voorwaarden van het bestek 142 SW 12 zijn van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 2.645.671,80 exclusief 21% btw, conform uw inschrijvingsstaat "Definitief, Revisie 0, d.d. 05-07-2021", printdatum 23-08-2021. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

De werkzaamheden dienen, zoals hierboven reeds gesteld, aan te vangen per 01-10-2021. De werkzaamheden van fase 1 dienen gereed te zijn uiterlijk 26-04-2022 en de oplevering dient plaats te vinden per 29-07-2022. Eén en ander conform de door u geleverde planning d.d. 15-09-2021. Zoals tijdens bouwvergadering 84 besproken, zal deze planning worden gebruikt als sturingsmiddel.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- Projectnummer: 141.2393.05.07.003.0102
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze brief.
- Kenmerk van deze brief: SBSI/2110071021-es

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Datum 7 oktober 2021

Ons kenmerk SBSI/2110071021-es

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl.

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 - 286 10 10 (optie 4).

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Evert Peereboom
op 20-10-2021

E. Peereboom
Concerndirecteur Bedrijfsvoering

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E 5.1.2E 5.1.2E @utrecht.nl
Bijlage(n)

Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 24 december 2021
Ons kenmerk SBSI/2112240816-es
Onderwerp Start uitvoering reconstructie lage
walmuren Oudegracht Utrecht –
rak 4 west zuid restant
Projectnummer 141.2393.04.07.003.0004
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Zoals reeds met u besproken tijdens de bouwvergadering nummer 86 d.d. 30-11-2021 en zoals vastgelegd per mail aan u d.d. 21-12-2021 door onze heer 5.1.2E 5.1.2E kunt u starten met de werkzaamheden voor reconstructie lage walmuren Oudegracht Utrecht rak 4 West Zuid (restant; t.p.v. nummer 131) per 10-01-2022. De voorwaarden van het bestek 142 SW 12 zijn van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 299.993,78 exclusief 21% btw, conform uw inschrijvingsstaat "Definitief, d.d. 24-11-2021", printdatum 16-12-2021. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

De werkzaamheden dienen, zoals hierboven reeds gesteld, aan te vangen per 10-01-2022. De oplevering dient plaats te vinden per 25-03-2022.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- Projectnummer: 141.2393.04.07.003.0004
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze brief.
- Kenmerk van deze brief: SBSI/2112240816-es

en deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Datum 23 december 2021

Ons kenmerk SBSI/2112240816-es

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl.

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 - 286 10 10 (optie 4).

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

De heer 5.1.2E

5.1.2E

Wervengebied

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door	5.1.2E	Datum	23 augustus 2022
Doorkiesnummer	5.1.2E	Ons kenmerk	SBSI/2208230911-es
E-mail	5.1.2E@utrecht.nl	Onderwerp	WKM Oudegracht – indexeringskosten Beens
Bijlage(n)		Projectnummer	141.2393
Uw kenmerk		Verzonden	
Uw brief van			Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Gedurende de looptijd van het bestek WKM, Oudegracht, Utrecht is op verzoek van de Gemeente Utrecht door Antea een onderzoek ingesteld naar de samenhang van diverse knelpunten in de binnenstad van Utrecht. Te denken valt aan de relatie tussen de uit te voeren werkzaamheden conform ons bestek en de bouwkundige staat van kelders en werven, de aanwezigheid van bomen en het effect van zwaar verkeer op kelders. In dit rapport is geconcludeerd dat er e.e.a. onvoldoende in samenhang is beschouwd en is de aanbeveling gedaan dat er een nieuwe aanpak noodzakelijk is. Alhoewel het rapport veel meer besloeg dan 'ons' project aan de Oudegracht, was er ook voor dit deel verandering noodzakelijk. Om die verandering in goede banen te leiden is besloten om extern hiervoor ondersteuning te verkrijgen. In goede afstemming met elkaar is hiervoor begin 2020 Count & Cooper benaderd en die partij heeft hiervoor de opdracht ontvangen. Na een relatief snel verlopen onderzoek in de vorm van diverse interviews, is op 30 juni 2021 een definitief rapport met aanbevelingen opgesteld en gepresenteerd.

Daar één van de aanbevelingen uit het PvA, zoals door Count & Cooper is opgesteld, de zogenaamde 'onderhoudsslag van het huidige bestek' betrof, is hier dan ook nader onderzoek naar gedaan wat daar de mogelijkheden voor waren. Ook is daarvoor gekeken naar de mogelijke aanbesteding-rechtelijke gevolgen en is na het inwinnen van juridisch advies het dringende advies gegeven niet over te gaan tot herziening en/of mogelijke aanpassing van de eenheidsprijzen. Om toch recht te doen aan de gevolgen van prijsstijgingen gedurende de langer dan geplande loop van het bestek (duur van de overeenkomst), is toen voorgesteld om uit te zoeken wat er mogelijk zou zijn in een vorm van indexering van het deel (65%) wat in eerste instantie buiten de risicoregeling viel. Het bestek kende nl al 2 soorten van indexering te weten lonen (33%) en brandstoffen (2%). E.e.a. conform risicoregeling CROW.

De afgelopen maanden hebben hierover gesprekken plaatsgevonden tussen uw heren 5.1.2E en 5.1.2E en onze heren 5.1.2E en is een gezamenlijk memo opgesteld.

Datum 23 augustus 2022

Ons kenmerk SBSI/2208230911-es

Onder andere op basis van dit memo heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden en deze is als volgt:

De jaarlijkse indexering, ingaande met de indexering van de bedragen uit 2021, uit te voeren conform hetgeen onder voorstel B (zie memo "WKM, Indexeringskosten Beens, Oudegracht" d.d. 07-04-2022) is opgenomen, te weten "Complete index 2021 CROW".

N.B.

Dit betreft een procedurele afspraak, die zal gelden voor jaarlijkse toepassing bij het bepalen van de kosten betreffende indexering, met de dan voor betreffende jaar geldende vastgestelde indexcijfers.

Onze heer 5.1.2E heeft hierover, vooruitlopend op deze brief, op 14 juli 2022 al per mail met de heren 5.1.2E en 5.1.2E gecommuniceerd. Hieronder puntsgewijs de zaken die van toepassing zijn en ook in dit mailbericht al zijn verwoord:

- Toepassing 'scenario B Complete index CROW'.
- Met ingang van 1 januari 2021 (oftewel, 2021 is het eerste jaar waarover wij dit zullen gaan toepassen) tot einde werk.
- De indexeringskosten graag per rak inzichtelijk houden, dus per rak een factuur.
- Vanuit het programma komt de vraag of Beens voor het 1e halfjaar 2022 een factuur kan sturen voor de indexering over de in die periode gefactureerde omzet. Dit zal dan een factuur zijn o.b.v. voorlopige indexcijfers, die we op een later moment gaan verrekenen met de definitieve cijfers. Ook deze facturen dus graag per rak.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

5.1.2E

5.1.2E

5.1.2E

Wervengebied

Beens Groep B.V.

De heer 5.1.2E

Postbus 6

8280AA GENEMUIDEN

Behandeld door	5.1.2E	Datum	15 september 2022
Doorkiesnummer	5.1.2E	Ons kenmerk	SBSI/202209081057-va
E-mail	5.1.2E@utrecht.nl	Onderwerp	Start uitvoering reconstructie lage walmuren Oudegracht, Utrecht Rak 3 Oost
Bijlage(n)		Projectnummer	141.2393.07.07.030.0003
Bestek	142 SW 12, Rak 3 Oost	Verzonden	Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
Uw brief van	22 juli 2022		

Geachte heer 5.1.2E

Zoals al met u besproken tijdens de bouwvergaderingen nummers 94 en 95, respectievelijk d.d. 02-08-2022 en 29-08-2022, en zoals vastgelegd per mail aan u d.d. 07-09-2021 door de heer 5.1.2E 5.1.2E kunt u starten met de werkzaamheden voor de reconstructie van de lage walmuren op de Oudegracht op rak 3 Oost in Utrecht, per 01-10-2022. De voorwaarden van het bestek 142 SW 12 zijn van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 2.137.705,71 exclusief 21% BTW, conform uw inschrijvingsstaat "Definitief, d.d. 08-07-2022", printdatum 22-07-2022. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

De werkzaamheden dienen, zoals hierboven al gesteld, aan te vangen per 1 oktober 2022. Zoals al met u besproken, zullen de werkzaamheden in 2 fasen dienen te worden uitgevoerd. De werkzaamheden van fase 1 starten per 01-10-2022 en dienen gereed te zijn uiterlijk 01-04-2023. De werkzaamheden van fase 2 starten per 01-10-2023 en de oplevering (van het gehele rak 3 Oost) dient plaats te vinden per 01-02-2024.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- Projectnummer: 141.2393.07.07.030.0003
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze brief.
- Kenmerk van deze brief: SBSI/202209081057-va

Datum 15 september 2022
Ons kenmerk SBSI/202209081057-va

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht - Financiën

Postbus 10080

3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl.

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 - 286 10 10 (optie 4).

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Evert Peereboom
op 15-09-2022

E. Peereboom
Concerndirecteur Bedrijfsvoering

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n) Inschrijvingsstaat d.d. 20 april 2023
Uw kenmerk
Uw mail van 12 mei 2023

Datum 22 mei 2023
Ons kenmerk SBSI/2305221436-es
Onderwerp Aanbrengen restant damwand 2 west
(tijdelijke maatregel)
Projectnummer 147.0002.09.40.002.0001
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Naar aanleiding van uw inschrijvingsstaat met datum 20 april 2023, verzonden via mail d.d. 12 mei 2023 geef ik u hierbij opdracht tot het bestellen van de damwandplanken conform bestekpost 809410 "leveren stalen damplanken AZ18-700".
De voorwaarden van het bestek 142 SW 12 zijn van toepassing.

Onze contactpersoon is de heer 5.1.2E telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

Ik vertrouw erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Boogaard,
Eelko van den
Digitaal ondertekend door:
Boogaard, Eelko van den
DN: CN = Boogaard, Eelko van
den OU = Medewerkers
Datum: 2023.05.25 10:59:28 +
02'00'

Eelko van den Boogaard
Programmamanager Wervengebied

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n) AFW 15 B
Uw kenmerk
Uw mail van 11 mei 2023

Datum 22 mei 2023
Ons kenmerk SBSI/2305221420-es
Onderwerp Leverantie metselstenen

Projectnummer 147.0002.05.40.002.0001
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Naar aanleiding van uw mail d.d. 11 mei 2023, betreffende Afwijking 15-B (zie bijlage), geef ik u hierbij opdracht tot het leveren van de metselstenen, inclusief opslag, voor een bedrag van € 279.338,81 (excl. BTW).

De voorwaarden van het bestek 142 SW 12 zijn van toepassing.

Op deze opdracht is indexering niet van toepassing.

Verrekening van de metselstenen vindt plaats via formulier(en) B, na goedkeuring door directie UAV.
Verrekening van de opslagkosten vindt jaarlijks plaats.

Onze contactpersoon is de heer 5.1.2E 5.1.2E telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

Ik vertrouw erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud, dan verneem ik dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Boogaard,
Eelko van den
Eelko van den Boogaard
Programmamanager Wervengebied

Digitaal ondertekend door:
Boogaard, Eelko van den
DN: CN = Boogaard, Eelko van den
OU = Medewerkers
Datum: 2023.05.25 10:58:04 +02'00'

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)

Datum 31 juli 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/180731/1443/SLa
Onderwerp Opdracht reconstructie lage walmuren
Oudegracht Utrecht - rak 1 West
optionele werkzaamheden

Uw kenmerk
Uw brief van 5.1.2E 2018

Projectnummer 141.2142.01.50.090.0101
Verzonden 31 JULI 2018
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw Inschrijfstaat d.d. 11 juli 2018, de werkzaamheden op voor reconstructie lage walmuren aan de Oudegracht Utrecht, rak 1 West - optionele werkzaamheden voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren Oudegracht, te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 1.312.737,75 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.01.50.090.0101
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/180731/1443/SLa

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Datum 31 juli 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/180731/1443/SLa



Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer
5.1.2E van de afdeling Financiële Dienstverlening.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

F.P. Westers
Plaatsvervangend directeur Stadsbedrijven



Gemeente Utrecht

Stadswerken
Stedelijk Beheer Projecten

Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres: Koploperstraat 53, Utrecht

Telefoon: 030 - 286 00 00

Internet: www.utrecht.nl

Beens Groep B.V.
T.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 6
8280AA Genemuiden

5.1.2E
Behandeld door: 5.1.2E
Doorkiesnummer: 5.1.2E
e-mail: 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n): geen

Datum: 21 oktober 2013
Ons kenmerk: SW13.063 352
Onderwerp: Reconstructie Lage Walmuren
Oudergracht Rak 12 t/m 15 te Utrecht

Uw kenmerk:
Uw brief van: 22 mei 2013

Projectnummer: 141.2002
Verzonden: 24 OKT, 2013
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij draag ik u, conform uw prijsaanbieding d.d. 22 mei 2013, behorend bij bestek 142SW12, de werkzaamheden op voor het project "Reconstructie lage walmuren Oudegracht, Rak 12 t/m 15 te Utrecht", inclusief 1^e en 3^e nota van inlichtingen.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een maximaal bedrag van EUR 5.844.000,00 exclusief 21% BTW.

Eventuele meerwerkzaamheden dienen schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd alvorens deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie moet binnen 7 werkdagen na datum van de opdracht, met begeleidend schrijven, door ons zijn ontvangen.

Als directie is aangewezen de heer 5.1.2E van Stadswerken, telefonisch bereikbaar onder nummer 030 - 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in enkelvoud in te dienen onder vermelding van:

- De 5.1.2E van Stadswerken.
- projectnummer: 141.2002.01.50.090.0101
- opdrachtnummer: 57 0001 4291
- kenmerk: SW13.063 352

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiële Dienstverlening
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Met vriendelijke groet,

5.1.2E

G. de Wit
Hoofd Stadswerken

Aan Beensgroep
T.a.v. de Directie
Postbus 6
8280 AA Genemuiden

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 030 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@urecht.nl
Bijlage(n) geen
Uw kenmerk n.v.t.
Uw brief van

Datum 18 augustus 2014
Ons kenmerk SW14.058709
Onderwerp Opdracht optieregeling
bestek 142 SW 12
Projectnummer 141.2002
Verzonden 18 augustus 2014
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte directie,

Hierbij deel ik u mede dat de Gemeente Utrecht graag gebruik maakt van de optieregeling opgenomen in het bestek 142.SW12 "Reconstructie wal en kluismuren Oude Gracht Rak 12 t/m 15" onder paragraaf 1.07 van het bestek.

Het betreft de optie op de reconstructie lage walmuren Oude Gracht Rak 1 t/m 2 en rak 3 t/m 6.

Momenteel wordt door het Ingenieursbureau van de Gemeente Utrecht een hoeveelhedenstaat gemaakt van deze rakkdelen.

Als dit beschikbaar is, is ons verzoek om op basis van de ingediende eenheidsprijzen van het bestek 142 SW 12 en de voorwaarden genoemd onder punt 5 van paragraaf 1.07 deze hoeveelheden af te prijzen tot een aanneemsom van de bovengenoemde rakkdelen.

Conform overleg dat heeft plaatsgevonden op donderdag 14 augustus jl. is het de wens van de Gemeente om deze rakkdelen versneld uit te voeren. Dit in afwijking van de perioden die beschreven zijn in paragraaf 1.07 van de optieregeling in het bestek.

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,

5.1.2E

W. van Caspel
Hoofd groep Projecten Stedelijk Beheer

Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres: Koploperstraat 53, Utrecht
Telefoon: 030 - 286 00 00
Internet: www.utrecht.nl

Beens Groep B.V.
T.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 6
8280AA Genemuiden

5.1.2E
Behandeld door: 5.1.2E
Doorkiesnummer: 5.1.2E
e-mail: 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n): geen

Datum: 10 oktober 2014
Ons kenmerk: SW14.501 065
Onderwerp: Opdracht leverantie damplanken Lage
Walmuren Oudergracht Rak 1-11 te
Utrecht

Uw kenmerk:
Uw brief van:

Projectnummer: 141.2002
Verzonden:
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij draag ik u, conform uw prijsaanbieding d.d. 30 juni 2014, de leverantie op voor de damplanken van de rakken 1 t/m 11 van de optieregeling in het bestek 142SW12.

De leverantie kan gedaan worden voor het door u geoffreerde bedrag van € 2.541.400,00 exclusief 21% BTW.

Het bovengenoemde bedrag is inclusief de opslagkosten zoals opgenomen in uw prijsaanbieding.

Na opdracht kan de verdere afhandeling van de levering en het in opslag nemen opgenomen worden met de Directievoerder/Projectleider op het werk, de heer 5.1.2E van Stadswerken, telefonisch bereikbaar onder nummer 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in enkelvoud in te dienen onder vermelding van:

- De heer 5.1.2E van Stadswerken.
- projectnummer: 141.2002.99.50.090.0102 onder vermelding van leverantie damplanken
- opdrachtnummer: 5700019043
- kenmerk: SW14.501 065

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiële Dienstverlening
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Wij hebben u in een tweetal brieven aangegeven om van de optieregeling gebruik te maken van de in deel 1 genoemde rakken 1, 2, 3 t/m 6 en 9 t/m 11 van bestek 142SW12. Wij wijzen u er met nadruk op dat aan deze opdracht voor de leverantie damplanken geen rechten ontleend kunnen worden inzake de definitieve opdracht voor deze rakken in de opties. Mocht uit de prijsonderhandelingen blijken dat er geen consensus is inzake deze opties dan behoudt de Gemeente zich het recht voor om de overeenkomst nietig te verklaren.

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

5.1.2E
Met vriendelijke groet,

5.1.2E
G. de Wit
Hoofd Stadswerken

Bestek 142SW11

Financieel overzicht t.b.v.

Damwandleveringen rak 11 t/m 1 tbv kade Oudegracht.

Totaal gewenste levering (cfm overzicht mail 30-7-14)

jaar	massa	eh	type	oppervlak	eh	lengten	massa	eh	ehp	totaalwaarde
2014	1002,50 ton		AZ18-700	9172 m2		9-14 m	109,3 kg/m2		€ 5.11C	
2015	702,91 ton		AZ18-700	6431 m2		8-10 m	109,3 kg/m2		€	
										€ 2.541.399,45 totaal

Berekening prijs levering AZ18-700 :

Basis : EUR 123,96 x 109,3 (kg/m2) / 105,7 (kg/m2) =

Prijsstijging ivm verhoogde netto inkoopprijs periode Mei 2013 - Aug 2014 (EUR 55,=/ton):

Opslagkosten a EUR 1,75/ton/mnd

1705,41 ton naar 0 ton (lineair) : periode 2015 t/m 2017 :

36 mnd 852,71 ton gemiddeld

Waarde : € 5.11C ehp per m2 :

Subtotaal eenheidsprijs AZ18-700 incl. 36 mnd opslag te lelystad

Totaal incl. 18,34% aannemersvergoeding

Bron: originele inschrijfbegroting (geldt als uitgangspunt)

leverprijs AZ13-700 € 5.11C per m2

installatieprijs varieert van € 33,68 tot

€ 220,42 per m2

(massa 105,7 kg/m2)

(waarbij opgemerkt dat het gros aan m2 tegen een ehp van ca.

€ 38,00 per m2 verwerkt wordt)

Bron: extra werk 96 m aanvullend Rak 15 Twijnstraat

leverprijs AZ/PZC18 € 5.11C per m2

(massa 118,1 kg/m2)

installatieprijs € 5.11C per m2

Bron: bepaling aannemersvergoeding cfm par 1.07 lid 5d

Eenmalige kosten € 5.11C

Subtotaal € 5.11C

Percentage EK/Sub 18,34%

Routinglijst Opdrachten boven EUR 500.000,00

Optieregeling bestek 142SW12, Project 141.2002		Datum: 28 oktober 2014	
	Paraaf	30/10	Correcties
Projectleider: 5.1.2E			
Account Bedrijfsbureau:			
Hoofd groep: 5.1.2E			
Hoofd afdeling: 5.1.2E			
Directeur 5.1.2E			

Opmerkingen

Opdracht optieregeling bestek 142Sw12, project 141.2002
Leverantie damplanken rakken 1 t/m 11, EUR 2.541.400,00
Aannemer: Beens Groep BV te Genemuiden

Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Bezoekadres: Koploperstraat 53, Utrecht

Telefoon: 030 - 286 00 00

Internet: www.utrecht.nl

Beens Groep B.V.
T.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 6
8280AA Genemuiden

Behandeld door: 5.1.2E
Doorkiesnummer: 5.1.2E
e-mail: 5.1.2E @utrecht.nl
Bijlage(n): geen

Datum: 22 april 2015
Ons kenmerk: SW 15.504475
Onderwerp: Reconstructie Lage Walmuren
optieregeling bestek 142 SW 12.

Uw kenmerk:
Uw brief van:

Projectnummer: 141.2002
Verzonden: 22 april 2015
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte 5.1.2E 5.1.2E

Op 21 oktober 2013 heeft u, conform uw prijsaanbieding d.d. 22 mei 2013, behorend bij bestek 142 SW 12, opdracht gekregen voor realisatie van het project "Reconstructie lage walmuren Oudegracht, Rak 12 t/m 15 te Utrecht".

Aanvullend heeft u op 10 oktober 2014, brief kenmerk SW.14.501.065 opdracht gekregen voor de levering van damplanken voor de rakken 1 t/m 11.

Het bestek 142 SW 12 biedt in paragraaf 1.07 een optieregeling voor uitvoering van meerdere rakken bij goed functioneren van de aannemer.

Over deze optieregeling heeft op 7 april jl. een overleg met u plaatsgevonden. In dit gesprek is u aangegeven dat gezien de huidige positieve inzet van uw bedrijf in het project de Gemeente Utrecht gebruik zal gaan maken van deze optieregeling.

Omdat de noodzakelijke hoeveelhedenstaat nog niet voorhanden was is afgesproken dat de opdrachten worden verstrekt zodra de aannemer voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.07 lid 5 sub a t/m e.

Met deze brief bevestigen wij u dat de Gemeente Utrecht gebruik maakt van de optieregeling en kan in deze gezien worden als een voorlopige opdracht.

Mocht de inschrijving afwijken van de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.07 dan behoudt de Gemeente Utrecht zich het recht om af te zien van definitieve opdracht.

De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie blijft van kracht zolang de werkzaamheden die in de optieregeling opgenomen zijn in uitvoering zijn.

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze voorlopige opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Met vriendelijke groet,

5.1.2E

W. van Caspel
Groepshoofd Projecten van Stedelijk Beheer.

Stadswerken
Stedelijk Beheer Projecten

Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Bezoekadres: Koploperstraat 53, Utrecht
Telefoon: 030 - 286 00 00
Internet: www.utrecht.nl

Beens Groep B.V.
T.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 6
8280AA Genemuiden

Behandeld door: 5.1.2E
Doorkiesnummer: 5.1.2E
e-mail: 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n): geen

Datum: 28 juli 2015
Ons kenmerk: SW15.508 319
Onderwerp: Reconstructie Lage Walmuren
optieregeling bestek 142 SW 12.

Uw kenmerk:
Uw brief van:

Projectnummer: 141.2002.08
Verzonden:
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Op 21 oktober 2013 heeft u, conform uw prijsaanbieding in de openbare aanbesteding d.d. 22 mei 2013, behorend bij bestek 142.SW.12 opdracht gekregen voor realisatie van het project "Reconstructie lage walmuren Oudegracht, Rak 12 t/m 15 te Utrecht".

Het bestek 142.SW.12 biedt in paragraaf 1.07 een optieregeling voor uitvoering van meerdere rakken bij goed functioneren van de aannemer.

Over deze optieregeling heeft op 7 april jl. een overleg met u plaatsgevonden. In dit gesprek is u aangegeven dat gezien de huidige positieve inzet van uw bedrijf in het project de Gemeente Utrecht gebruik zal gaan maken van deze optieregeling en is u gevraagd op basis van een hoeveelhedenstaat een prijsaanbieding te doen voor de rakken 1-oost, 3-west en 4-west conform de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.07 lid 5 sub a t/m e in bestek 142.SW.12.

Hierbij draag ik u, conform uw prijsaanbieding van 7 juli j.l. behorend bij de optieregeling van bestek 142.SW.12, de werkzaamheden op voor het project "Reconstructie lage walmuren Oudegracht, Rak 1-oost, 3-west en 4-west te Utrecht"

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een maximaal bedrag van EUR 3.461.000,00 exclusief 21% BTW.

Eventuele meerwerkzaamheden dienen schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd alvorens deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie blijft van kracht zolang de werkzaamheden die in de optieregeling opgenomen zijn in uitvoering zijn.

Als directie is aangewezen de heer 5.1.2E van Stadsingenieurs.

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in enkelvoud in te dienen onder vermelding van:

- De heer 5.1.2E van Stedelijk Beheer.
- projectnummer: 141.2002.08.50.090.0101
- opdrachtnummer: 57 0002 1003
- kenmerk: SW15.508 319

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht
Servicecentrum Financiële Dienstverlening
Postbus 10080
3505 AB Utrecht.



Gemeente Utrecht

Pagina 2/2
Datum 28 juli 2015
Kenmerk SW15.508 319

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze voorlopige opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Met vriendelijke groet,

5.1.2E

G. de Wit
Directeur van Stedelijk Beheer.

Stadsbedrijven
Afdeling BORG
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 - 286 40 23
www.utrecht.nl



Beens Groep B.V.
t.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 28 april 2017
Ons kenmerk SBSI/41 23544/1704280855-es
Onderwerp Opdracht "Reconstructie lage walmuren"
optieregeling bestek 142 SW 12.
Projectnummer 141.2142.
Verzonden **04 MEI 2017**
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Op 21 oktober 2013 heeft u, conform uw prijsaanbieding d.d. 22 mei 2013, behorend bij bestek 142 SW 12, opdracht gekregen voor realisatie van het project "Reconstructie lage walmuren Oudegracht, Rak 12 t/m 15 te Utrecht".

Aanvullend heeft u op 10 oktober 2014, brief kenmerk SW.14.501.065 opdracht gekregen voor de levering van damplanken voor de rakken 1 t/m 11.

Het bestek 142 SW 12 biedt in paragraaf 1.07 een optieregeling voor uitvoering van meerdere rakken bij goed functioneren van de aannemer.

Over deze optieregeling heeft op 7 april 2015 een overleg met u plaatsgevonden. In dit gesprek is aangegeven dat gezien de huidige positieve inzet van uw bedrijf in het project, de Gemeente Utrecht gebruik zal gaan maken van deze optieregeling.

Omdat de noodzakelijke hoeveelhedenstaat nog niet voor handen was, is afgesproken dat de opdrachten worden verstrekt zodra de aannemer voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.07 lid 5 sub a t/m e.

Met deze brief bevestigen wij u dat de Gemeente Utrecht gebruik maakt van de optieregeling voor de rakken:

1 west - 2 west - 3 oost - 9 oost - 10 oost - 11 oost - 12 oost (frame)

en kan in deze gezien worden als een voorlopige opdracht.

Mocht de inschrijving afwijken van de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 1.07, dan behoudt de Gemeente Utrecht zich het recht voor om af te zien van definitieve opdracht.

De overeenkomstig het bestek vereiste bankgarantie blijft van kracht zolang de werkzaamheden die in de optieregeling opgenomen zijn in uitvoering zijn.

Ik verzoek u mij de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze voorlopige opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, eveneens onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

F.P. Westers
Hoofd Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen

Beens Groep B.V.
t.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw email van 29 augustus 2017

Datum 14 september 2017
Ons kenmerk SBSI/4123544/1709141125-es
Onderwerp Opdracht voor cameratoezicht
depot damwanden Lelystad
Projectnummer 141.2142.90.50.080.107
Verzonden **18 SEP. 2017**
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw prijsaanbieding d.d. 29 augustus 2017, de voortzetting van het cameratoezicht op het depot in Lelystad op, voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren Oudegracht' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 10.582,00 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.90.50.080.107
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/1709141125-es

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht – Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 – 286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

Wij verzoeken u ons de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

Ing. A.E.M. Heijnen
Hoofd Projectmanagement Stadsingenieurs

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 – 286 43 23
www.utrecht.nl



Beens Groep B.V.
t.a.v. de heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail p.van.oostrum@utrecht.
Bijlage(n)

Uw kenmerk
Inschrijvingsstaat 16 februari 2018

Datum 22 februari 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/1802221121-es
Onderwerp Opdracht voor reconstructie lage
walmuren Oudegracht – rak 9 oost
(noord) – definitieve kade
Projectnummer 141.2142.02.50.090.0101
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw inschrijfstaat d.d. 16 februari 2018, de werkzaamheden op voor reconstructie van de lage walmuren aan de Oudegracht Utrecht, rak 9 oost (noord) – definitieve kade, voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren Oudegracht' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 515.285,77 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.02.50.090.0101
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: 141.2142.02.50.090.0101

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht – Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 – 286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Datum 22 februari 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/1802221121-es



Wij verzoeken u ons de ontvangst van en uw akkoordbevinding met deze opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen, onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

Y.A.J. Kokx
Directeur Stadsbedrijven

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 – 286 40 23
www.utrecht.nl



Beens Groep B.V.
t.a.v. de heer J. 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)

Uw kenmerk
Inschrijvingsstaat 23 maart 2018

Datum 24 april 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/1804241457-es
Onderwerp Opdracht voor reconstructie lage
walmuren Oudegracht – rak 9 oost
zuidzijde.

Projectnummer 141.2142.02.50.090.0101
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw inschrijfstaat d.d. 23 maart 2018, de werkzaamheden op voor reconstructie van de lage walmuren aan de Oudegracht Utrecht, rak 9 oost zuidzijde, voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren Oudegracht' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 955.050,54 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.02.50.090.0101
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/1804241457-es

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht – Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 –286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

Y.A.J. Kokx
Directeur Stadsbedrijven

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Beens Groep B.V.
De heer J. [redacted]
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door [redacted]
Doorklesnummer [redacted]
E-mail [redacted]@utrecht.nl
Bijlage(n)

Datum 31 Juli 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/180731/1447/SLa
Onderwerp Opdracht reconstructie lage walmuren
Oudegracht - rak 11 Oost
optionele werkzaamheden

Uw kenmerk
Uw brief van 23 maart 2018

Projectnummer 141.2142.02.50.090.0101
Verzonden **31 JULI 2018**
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer [redacted]

Hierbij dragen wij u, conform uw Inschrijfstaat d.d. 23 maart 2018, de werkzaamheden op voor reconstructie lage walmuren aan de Oudegracht Utrecht, rak 11 Oost - optionele werkzaamheden voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren Oudegracht, te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 1.708.688,35 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon is aangewezen de heer [redacted] werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op [redacted]

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- [redacted] Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.02.50.090.0101
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/180731/1447/SLa

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Datum 31 juli 2018
Ons kenmerk SBSI/4123544/180731/1447/SLa



Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 -286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

F.P. Westers
Plaatsvervangend directeur Stadsbedrijven

Beens Groep B.V.
De heer J. [5.1.2E]
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door [5.1.2E]
Doorkiesnummer [5.1.2E]
E-mail [5.1.2E]@utrecht.nl
Bijlage(n)

Datum 5 september 2019
Ons kenmerk SBSI/4123544/1909051014-es
Onderwerp Opdracht reconstructie lage walmuren
Oudegracht Utrecht – rak 10 Oost
optionele werkzaamheden

Uw kenmerk
Uw brief van 26 maart 2019

Projectnummer 141.2142.02.50.090.0101
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer [5.1.2E]

Hierbij dragen wij u, conform uw Inschrijfstaat d.d. 26 maart 2019, de werkzaamheden op voor de reconstructie van de lage walmuren aan de Oudegracht Utrecht, rak 10 Oost – optionele werkzaamheden voor het project 'Reconstructie wal- en kluisuren Oudegracht' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 1.326.547,42 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Uw werkzaamheden dienen aan te vangen op 01-10-2019 en de oplevering dient plaats te vinden op 29-05-2020, conform uw planning "detail planning rak 4 west en 10 Oost winter '19-'20.pdf", zoals door uw heer [5.1.2E] per mail d.d. 05-09-2019 geleverd.

Als contactpersoon is aangewezen de heer [5.1.2E] werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op [5.1.2E] [5.1.2E]

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- [5.1.2E] [5.1.2E] Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.02.50.090.0101
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/1909051014-es

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht – Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 -286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

De overeenkomstig het bestek 142.SW.012 vereiste bankgarantie blijft van kracht zolang de werkzaamheden die in de optieregeling opgenomen zijn in uitvoering zijn. U dient binnen 7 werkdagen na verstrekken van deze opdracht aan te tonen dat deze bankgarantie nog geldig is.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Mevrouw A.M. Krop
Directeur Stadsbedrijven

Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 14030
www.utrecht.nl



Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

5.1.2E

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)

Datum 5 september 2019
Ons kenmerk SBSI/4123544/1909051014-es
Onderwerp Opdracht reconstructie lage walmuren
Oudegracht Utrecht - rak 10 Oost
optionele werkzaamheden

Uw kenmerk
Uw brief van 26 maart 2019

Projectnummer 141.2142.02.50.090.0101
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij dragen wij u, conform uw Inschrijfstaat d.d. 26 maart 2019, de werkzaamheden op voor de reconstructie van de lage walmuren aan de Oudegracht Utrecht, rak 10 Oost - optionele werkzaamheden voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren Oudegracht' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 1.326.547,42 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Uw werkzaamheden dienen aan te vangen op 01-10-2019 en de oplevering dient plaats te vinden op 29-05-2020, conform uw planning "detail planning rak 4 west en 10 Oost winter '19-'20.pdf", zoals door uw heer 5.1.2E per mail d.d. 05-09-2019 geleverd.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.02.50.090.0101
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Deze vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/1909051014-es

En deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 -286 07 00 van de afdeling Financiële Dienstverlening.

De overeenkomstig het bestek 142.SW.012 vereiste bankgarantie blijft van kracht zolang de werkzaamheden die in de optieregeling opgenomen zijn in uitvoering zijn. U dient binnen 7 werkdagen na verstrekken van deze opdracht aan te tonen dat deze bankgarantie nog geldig is.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

5.1.2E

Mevrouw A.M. Krop
Directeur Stadsbedrijven

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 23 april 2020
Ons kenmerk SBSI/4123544/2004231034-es
Onderwerp Opdracht voor opslag damwandplanken
en cameratoezicht Lelystad voor 2020
Projectnummer 141.2142.90.50.080.0107
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij verlenen wij u opdracht voor de opslag van damwandplanken en het houden van camera-toezicht voor 2020 op het depot in Lelystad voor het project 'Reconstructie wal- en kluiswanden' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

Als contactpersoon is aangewezen de heer S. Hokke, werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2142.90.50.080.0107
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Dit vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/4123544/2004231034-es

en deze als volgt te adresseren:

Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Datum 23 april 2020
Ons kenmerk SBSI/4123544/2004231034-es

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 - 286 10 10 (optie 4).

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,



Mevrouw A.M. Krop
Directeur Stadsbedrijven

Beens Groep B.V.
De heer 5.1.2E
Postbus 6
8280 AA GENEMUIDEN

Behandeld door 5.1.2E
Doorkiesnummer 5.1.2E
E-mail 5.1.2E 5.1.2E@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 30 maart 2021
Ons kenmerk SBSI/2103300835-es
Onderwerp Opdracht voor cameratoezicht
Lelystad voor 2021
Projectnummer 141.2393.01.06.030.0103
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer 5.1.2E

Hierbij verlenen wij u opdracht voor het houden van cameratoezicht voor 2021 op het depot in Lelystad voor het project 'Reconstructie wal- en kluismuren' te Utrecht.

Op deze opdracht zijn de voorwaarden van het bestek 142 SW 12 van toepassing.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een bedrag van € 8.140,00 exclusief 21% btw. Eventuele meerwerkzaamheden dienen vooraf en schriftelijk door ons te zijn goedgekeurd, voordat deze uitgevoerd en in rekening gebracht kunnen worden.

Als contactpersoon is aangewezen de heer 5.1.2E 5.1.2E werkzaam bij Stadsingenieurs, telefonisch bereikbaar op 5.1.2E 5.1.2E

U wordt verzocht gespecificeerde rekeningen in te dienen onder vermelding van:

- 5.1.2E 5.1.2E Stadsbedrijven, Stadsingenieurs
- projectnummer: 141.2393.01.06.030.0103
- Het bij deze opdracht behorende bestelnummer. Dit vindt u in de bijlage bij deze opdrachtverstrekking.
- kenmerk van deze brief: SBSI/2103300835-es

en deze als volgt te adresseren:
Gemeente Utrecht - Financiën
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Datum 30 maart 2021

Ons kenmerk SBSI/2103300835-es

De gemeente Utrecht ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal in PDF-format, via factuur@utrecht.nl

Bij eventuele problemen met de afhandeling van uw factuur kunt u bellen met telefoonnummer 030 - 286 10 10 (optie 4).

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze brief, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na verzending van deze brief. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van deze opdracht.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Ing. A.E.M. Heijnen
Hoofd Projectmanagement Stadsingenieurs

**Heijnen,
AnneBeth**

 Digitaal ondertekend door
Heijnen, AnneBeth
Datum: 2021.03.30 10:22:19
+02'00'
